

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

*Servizio 5 - Espletamento di servizi di ingegneria di competenza
regionale e/o per conto di enti locali*

(per le Province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani)

**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NELLA S.P. N°6 (DALLA S.S.N°121 AL COMUNE DI
TRABIA) PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' IN SICUREZZA.**

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €. **4.300.000,00**- CUP D27H21000410002

RIFERIMENTO ELABORATO

N.24 - Rev.01

DATA: 25 maggio 2021

SCALA:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I PROGETTISTI
p.p.v.

F.to Geom. Paolo Franzone

F.to Geom. Francesco Carollo

F.to Arch. Giuseppe Pedone

COORDINATORE SICUREZZA

F.to Geom. Francesco Carollo

COLLABORATORI TECNICI

Arch. Fabiola Fucile

Ing. Piero Fabio

Visto: Il Dirigente
Servizio 5 -D.R.T
Ing. Giuseppe Pirrello

IL SUPPORTO AL R.U.P.
F.to Geom. Fabrizio Pirrone

IL R.U.P.
F.to Ing. Giuseppe Pirrello

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: S.P. n. 6 Baucina - Ventimiglia di Sicilia (PA)
Interventi di sistemazione della strada nel tratto dalla S.S. n. 121 al
comune di Trabia, per il ripristino della viabilità in sicurezza.


Rev. 1 del 25/05/2021


COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità


Palermo, 25/05/2021


Il Tecnico
()


| | |
|--|--|
| | S.P. n. 6 - Baucina - Ventimiglia di Sicilia Interventi per il ripristino della viabilità |
|--|--|

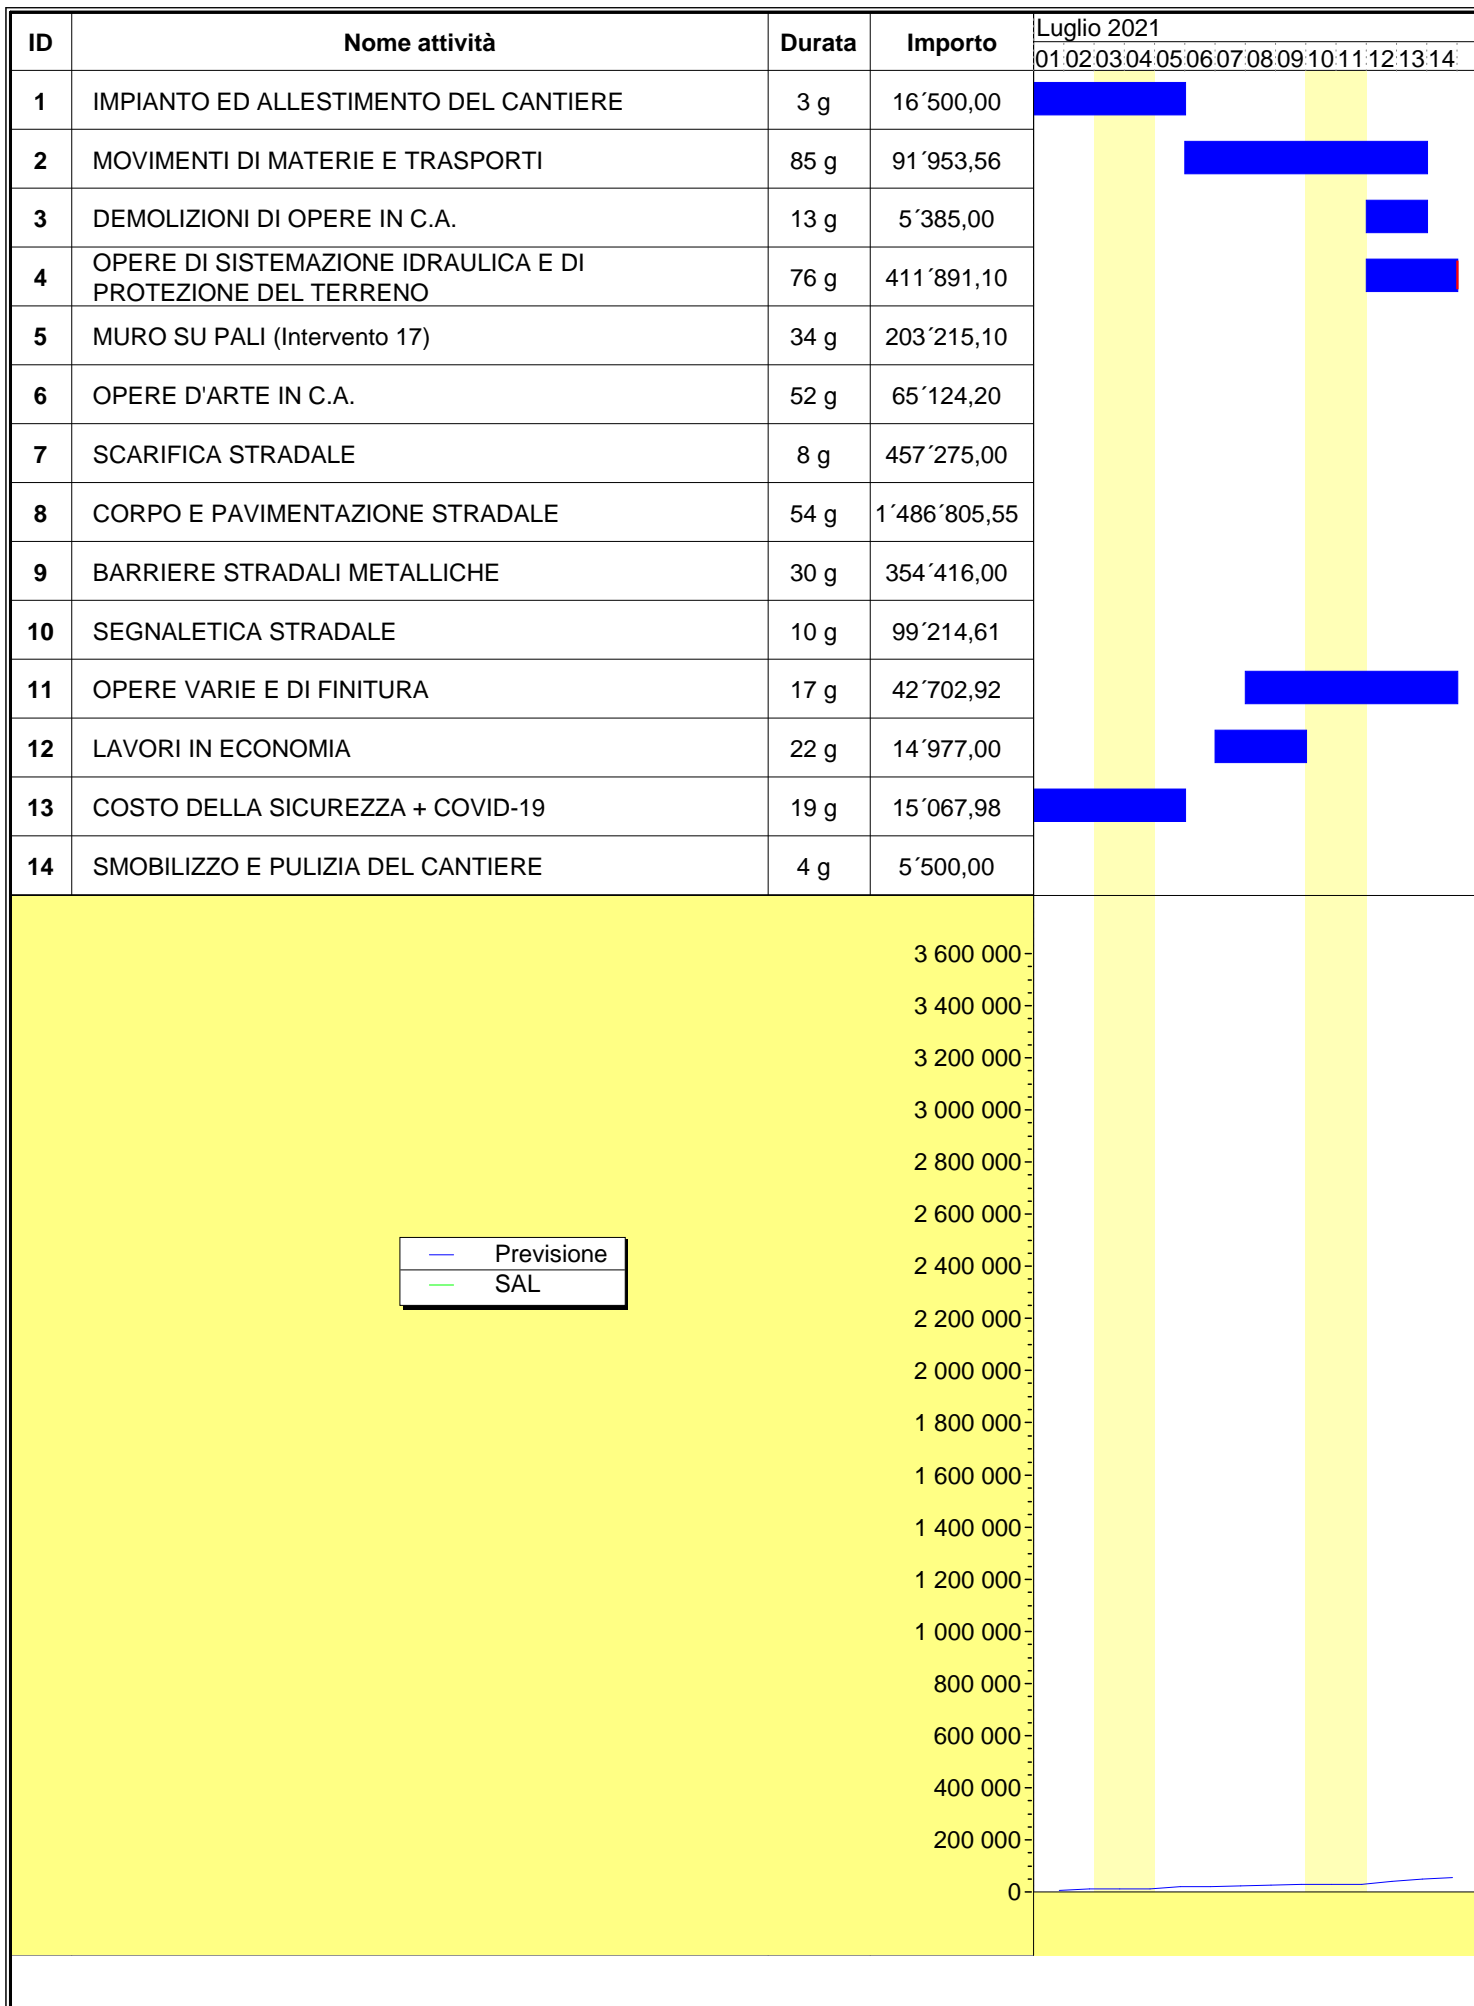


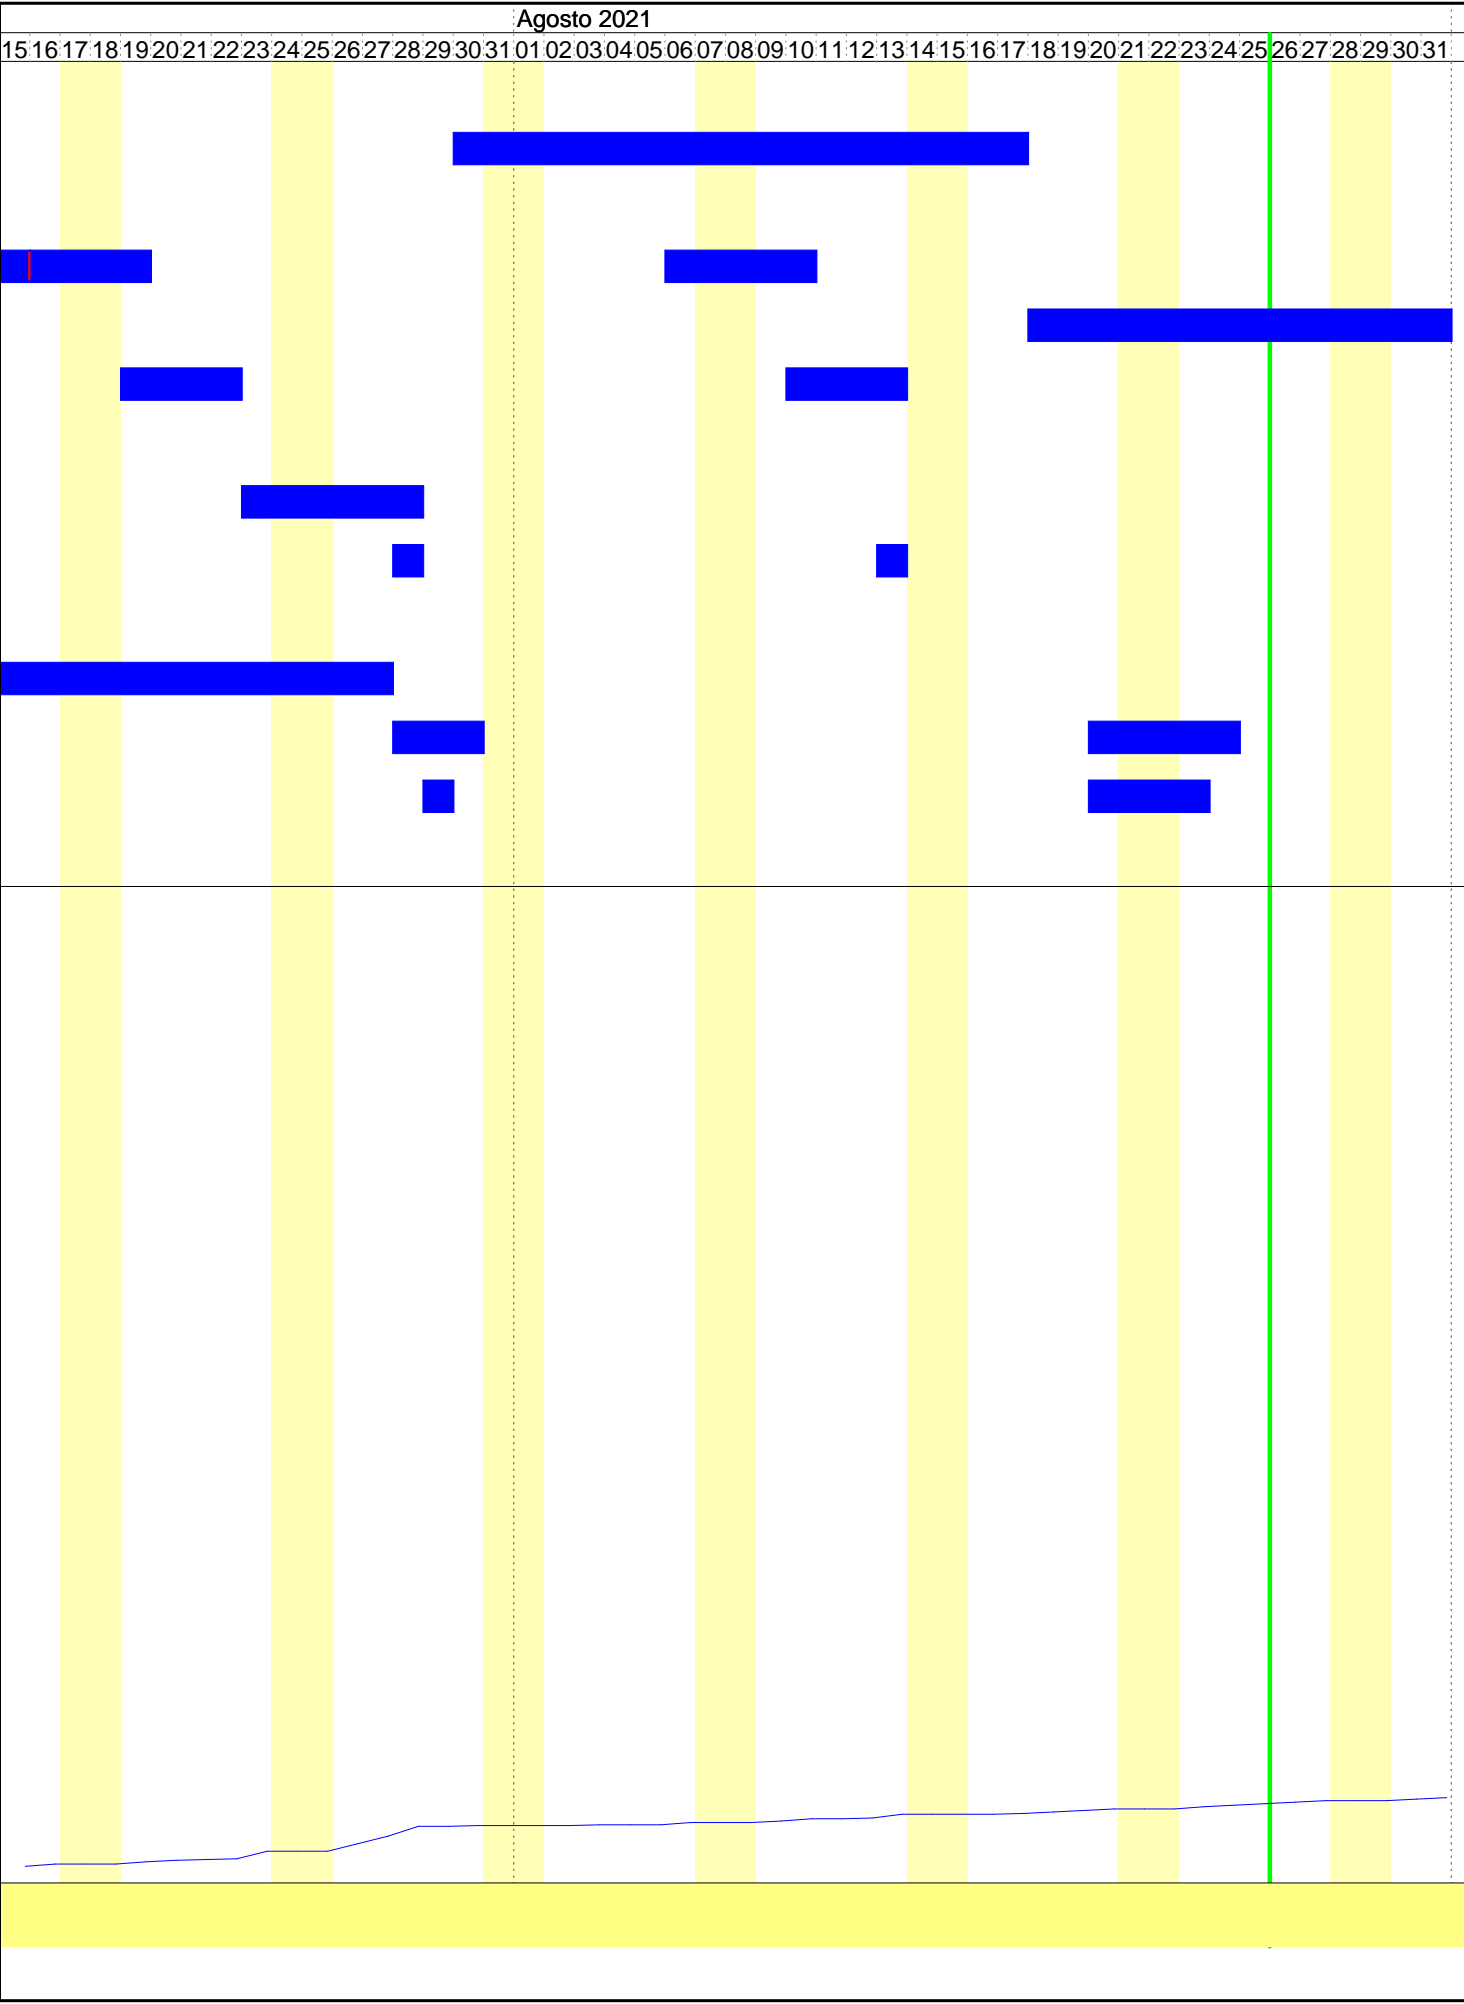


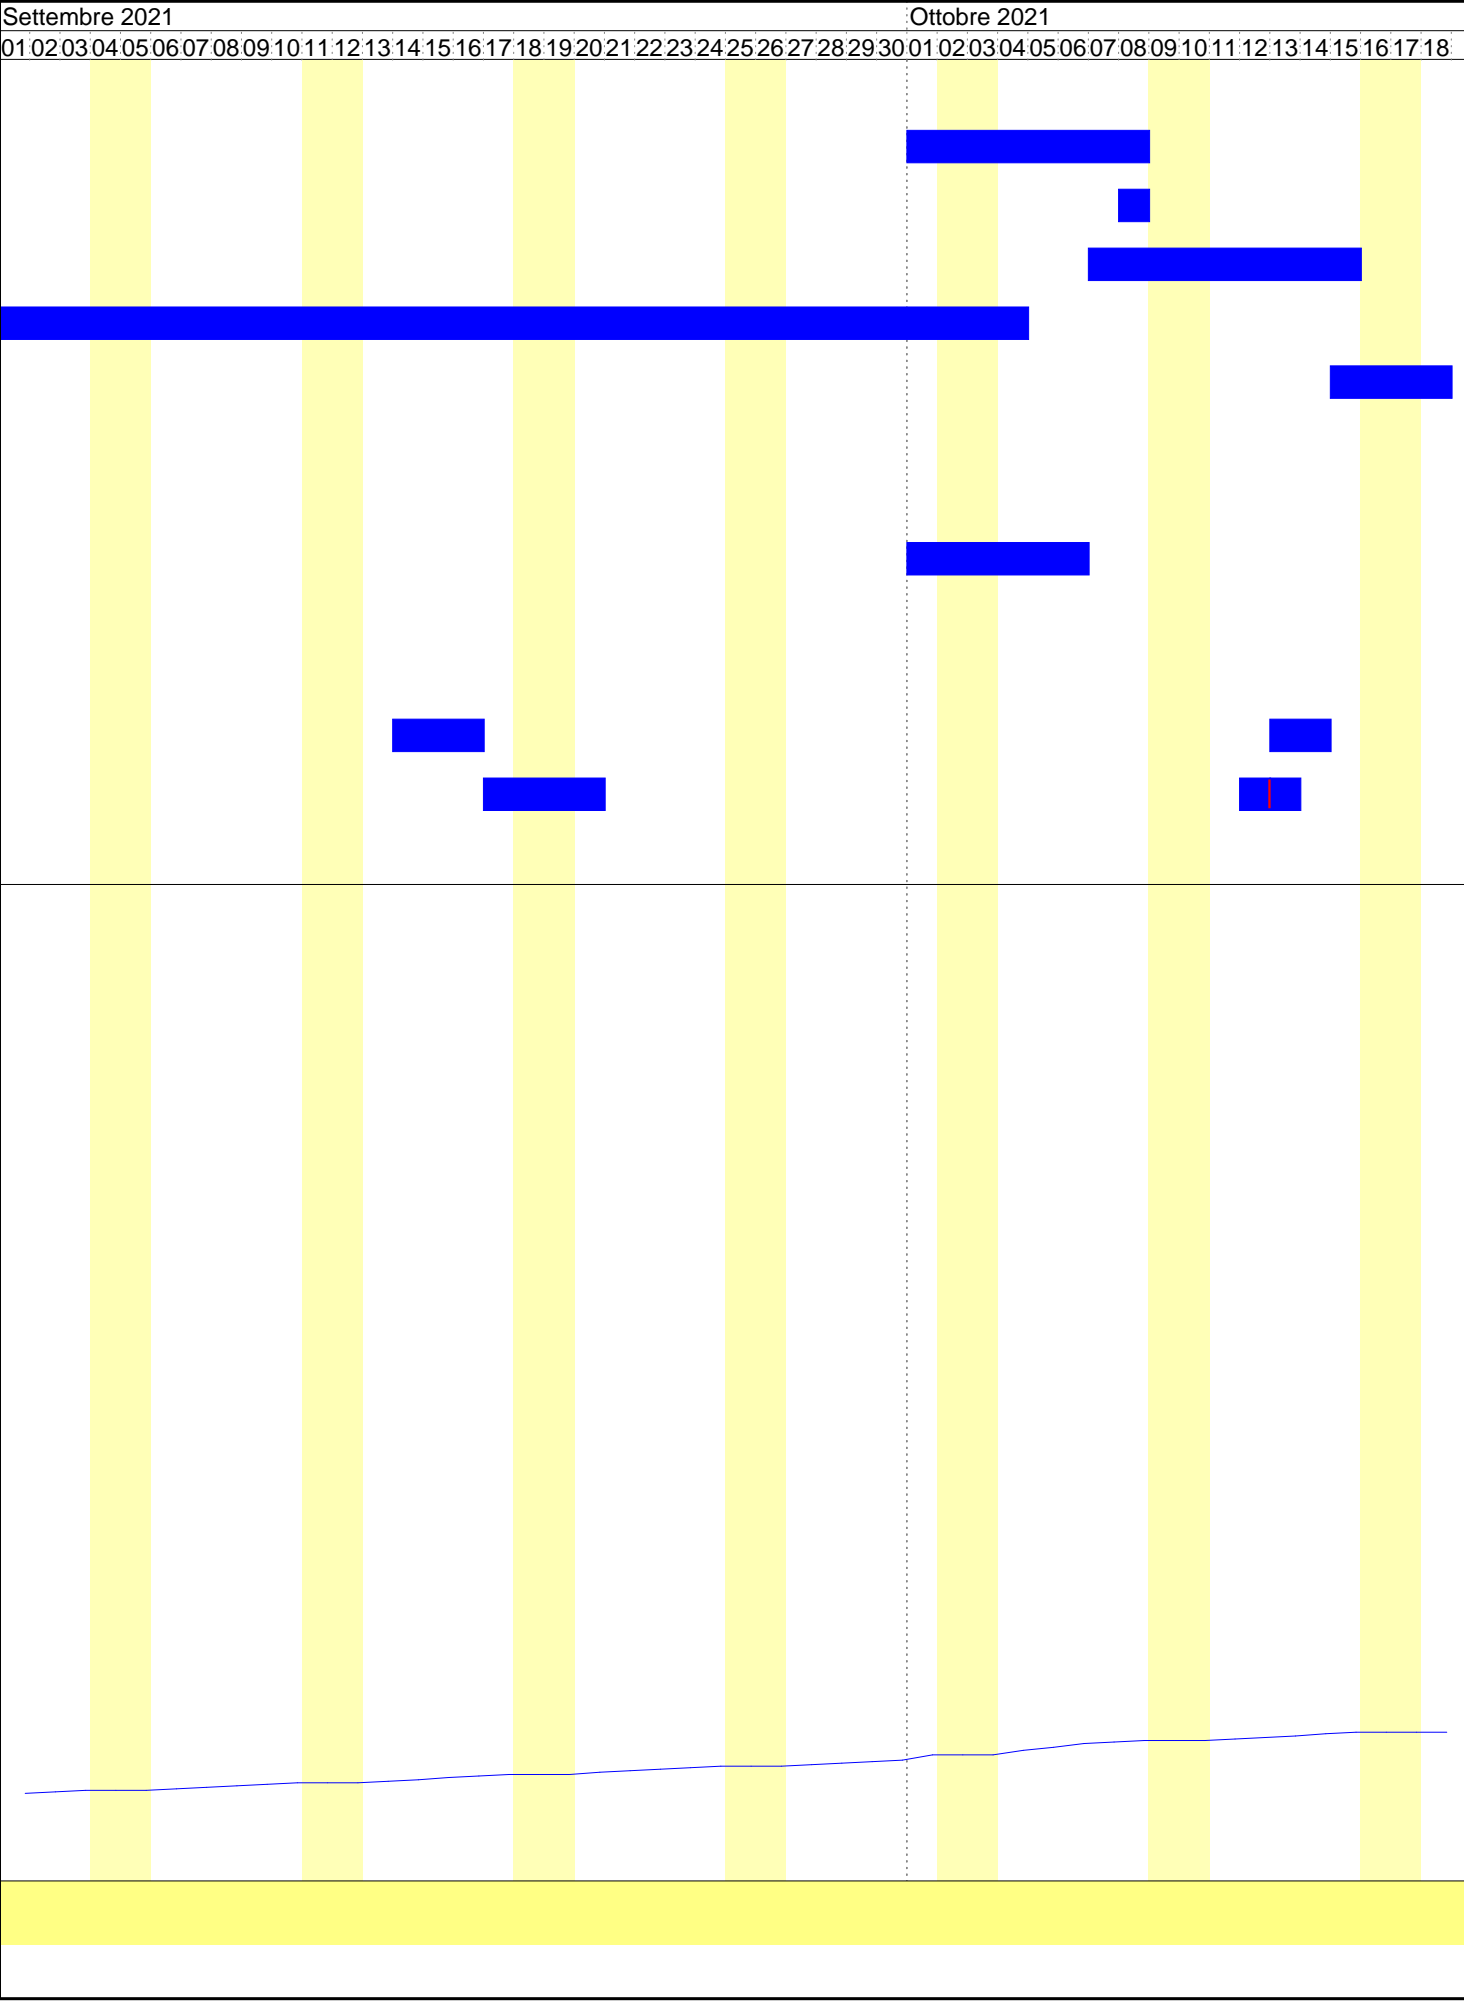


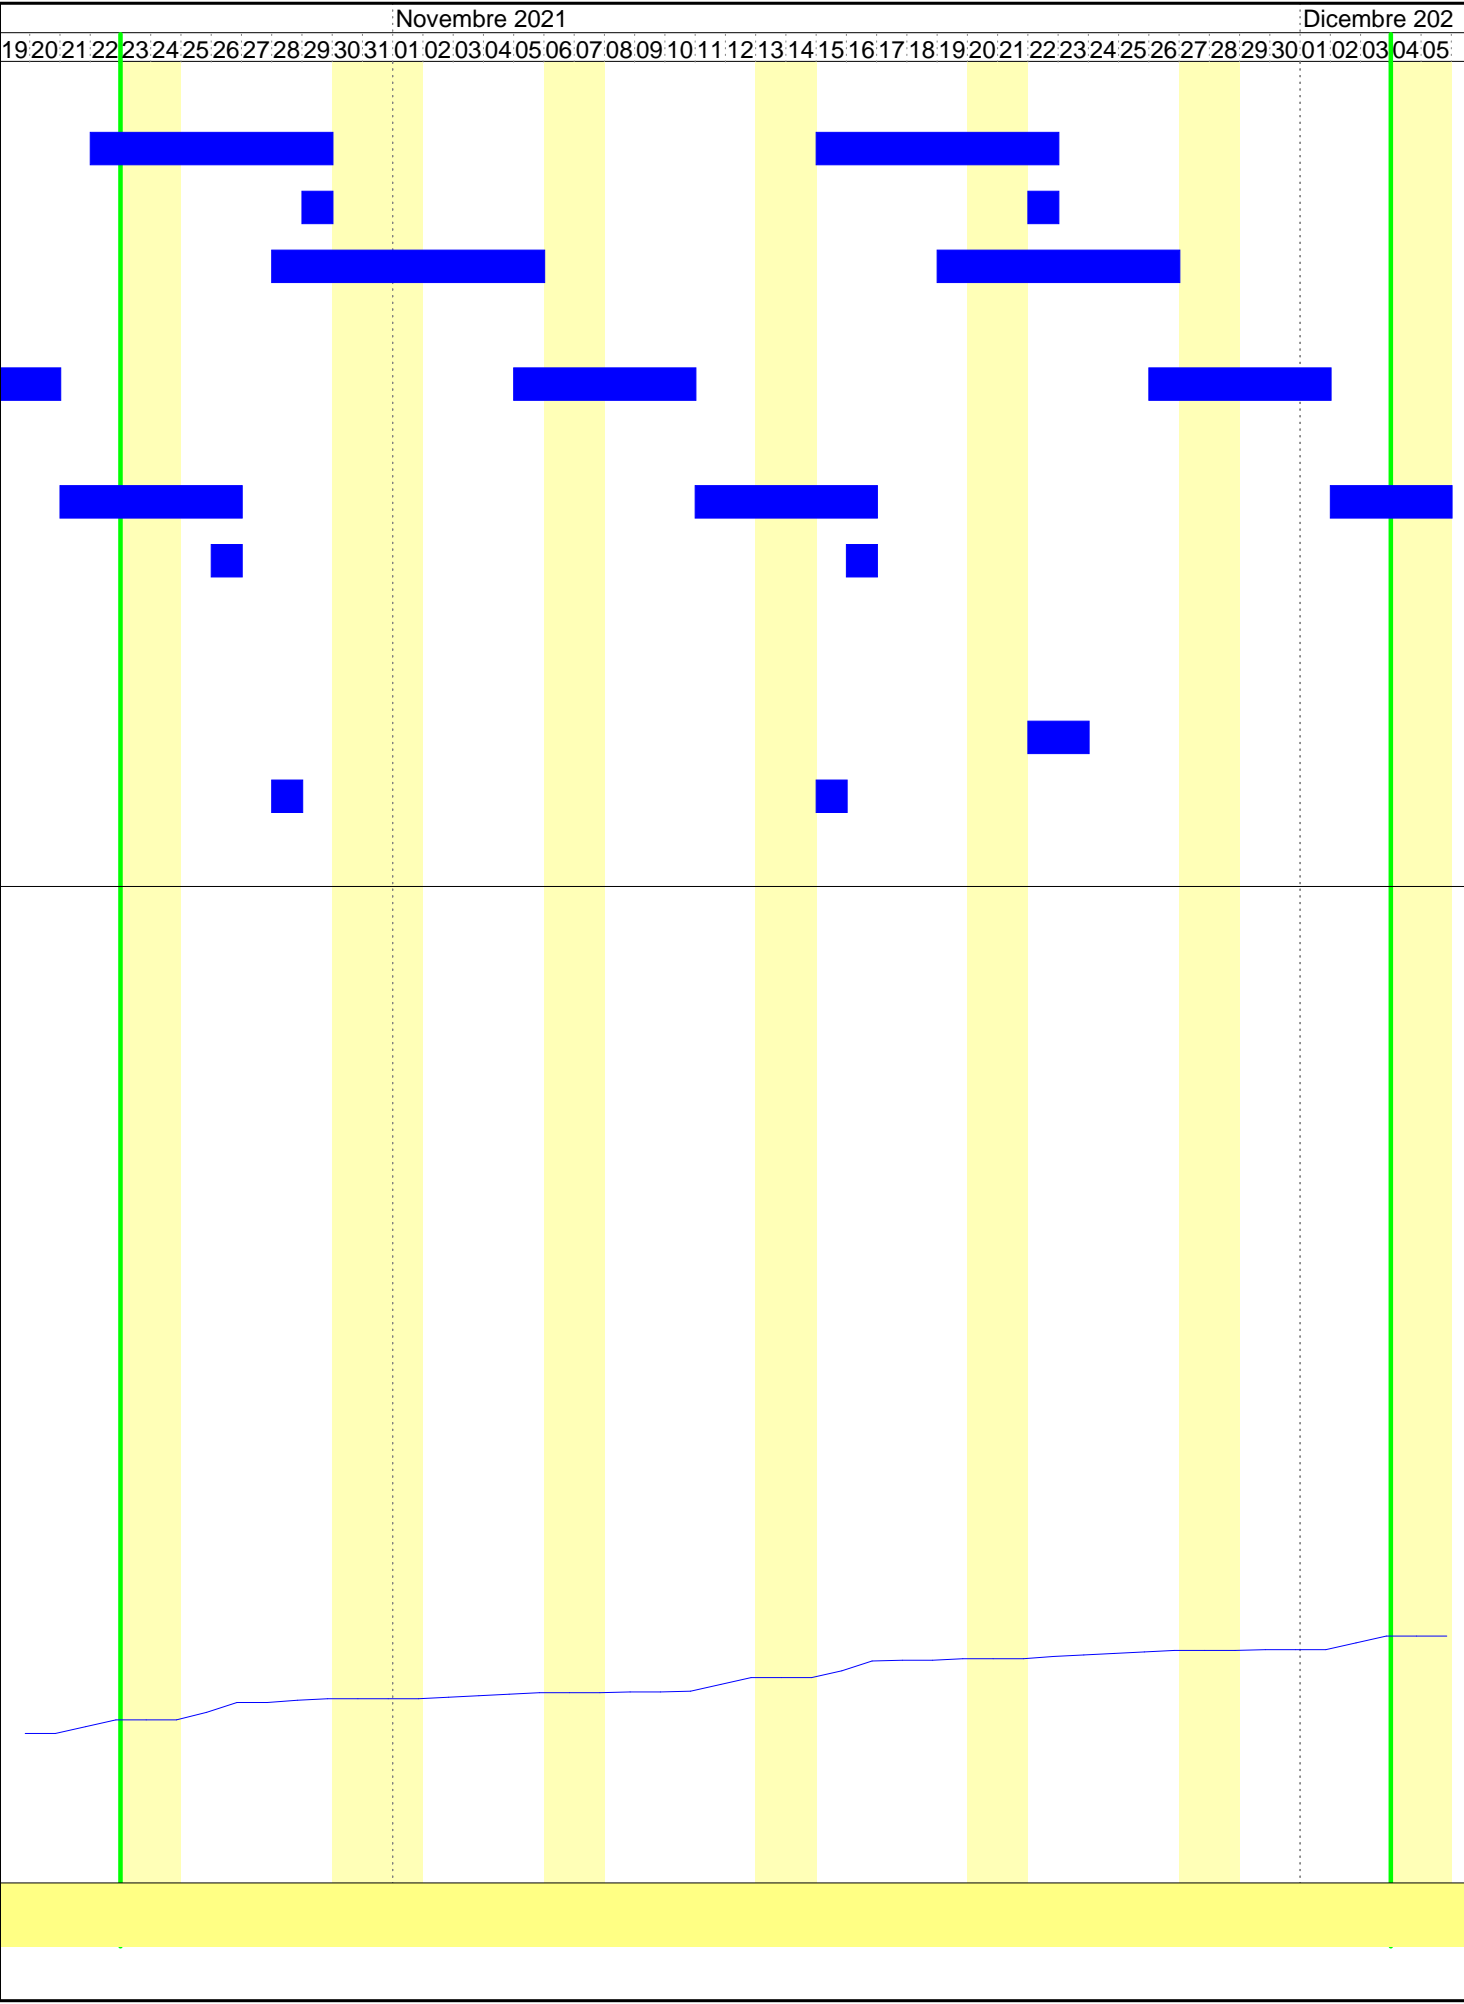


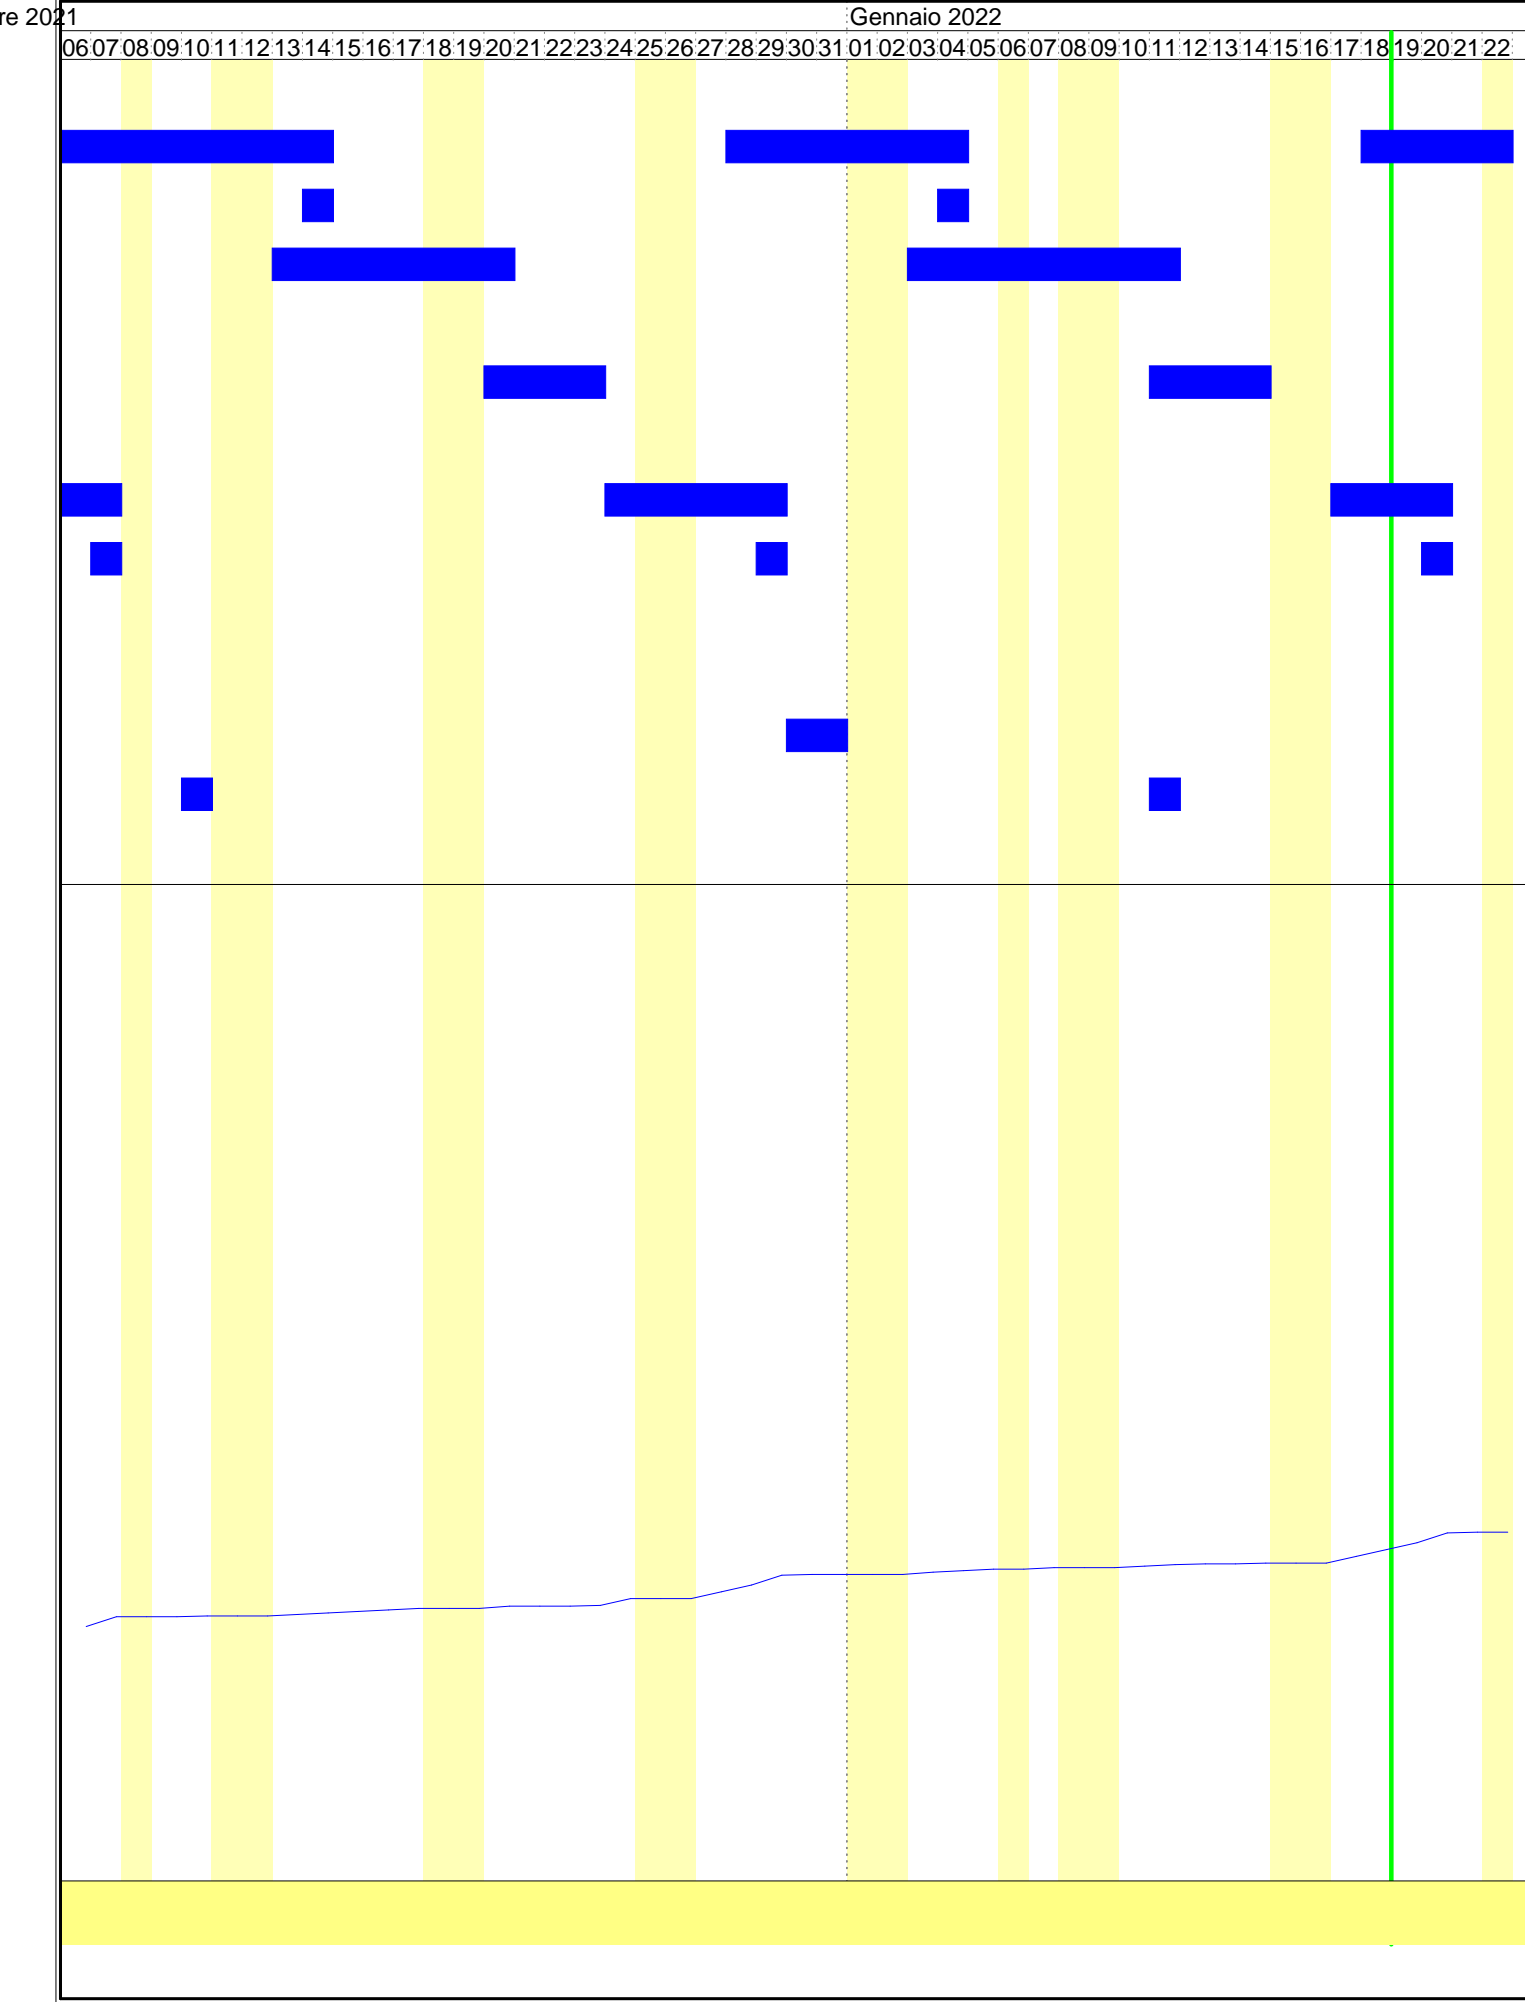

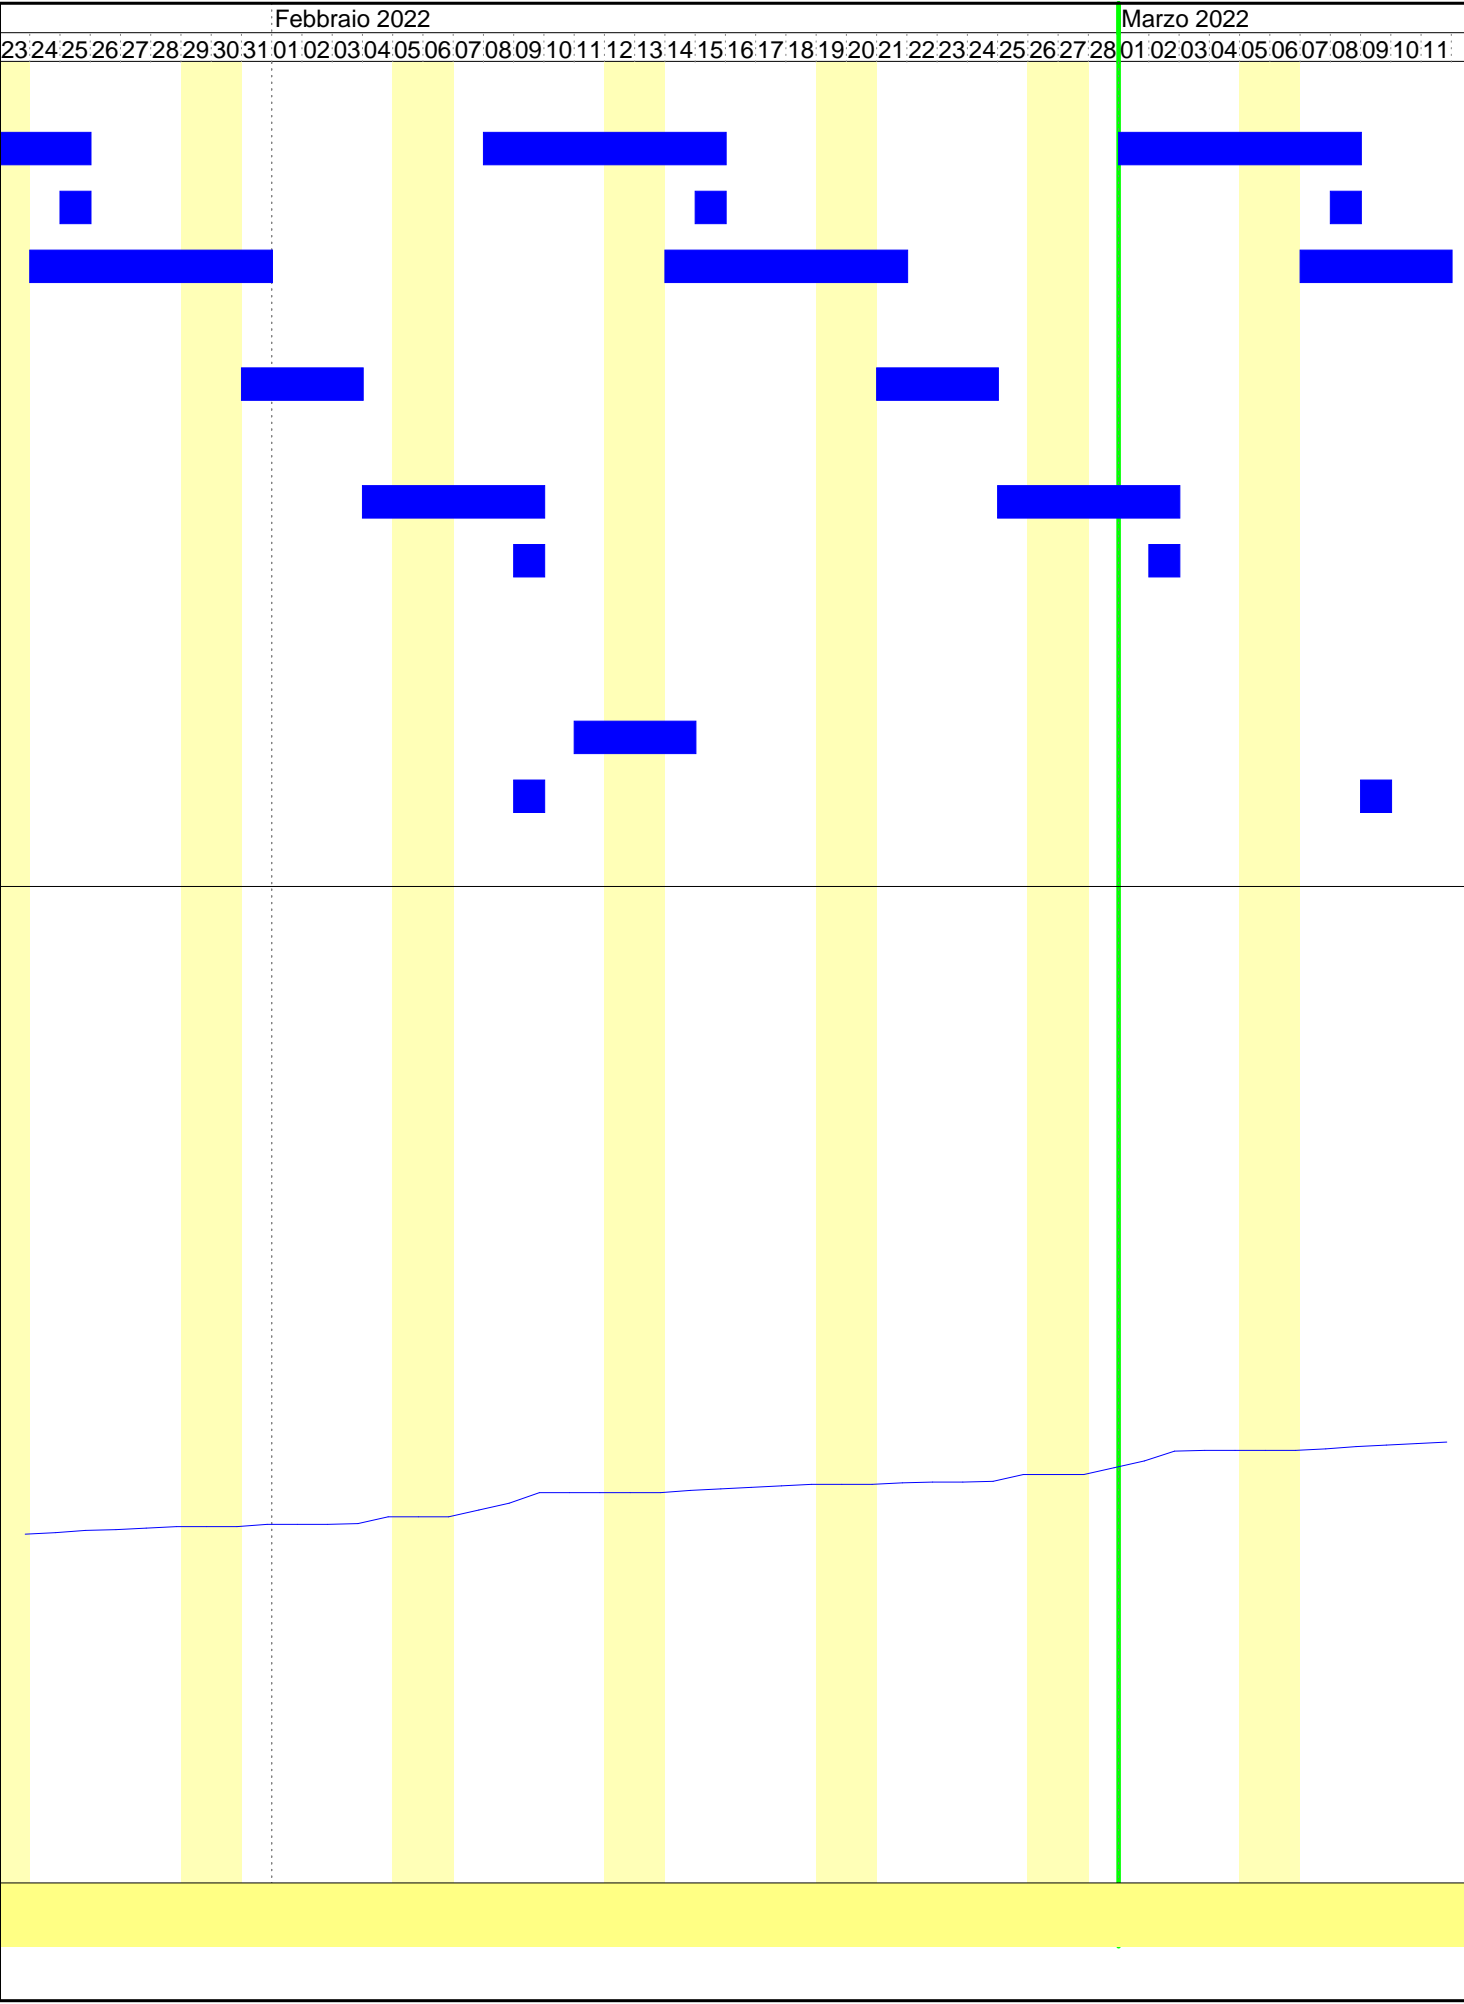

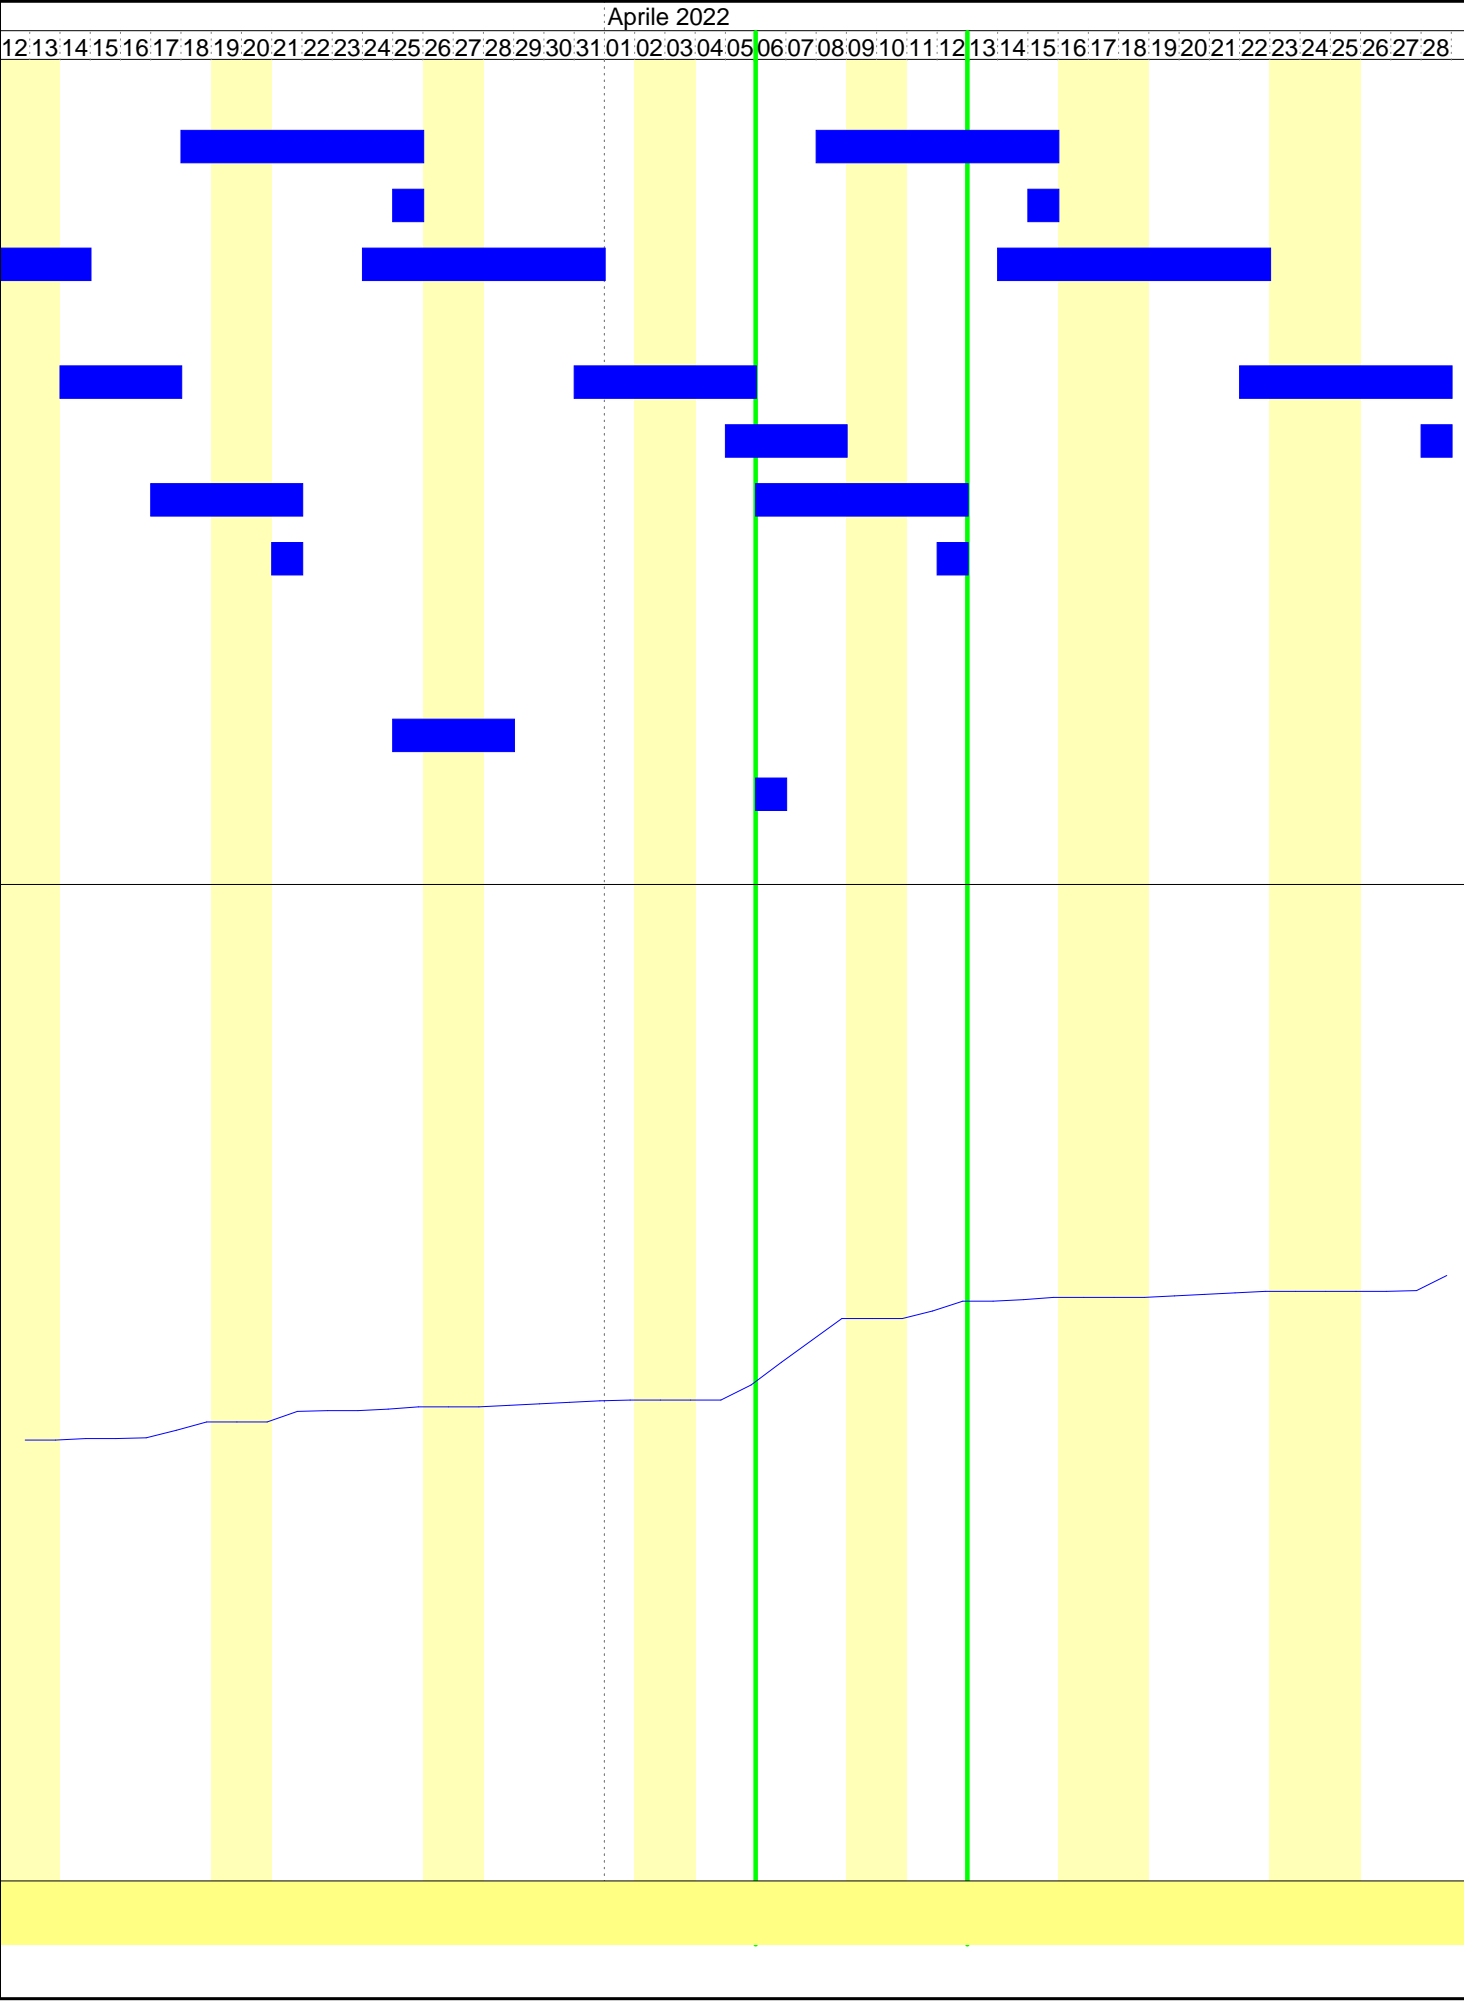

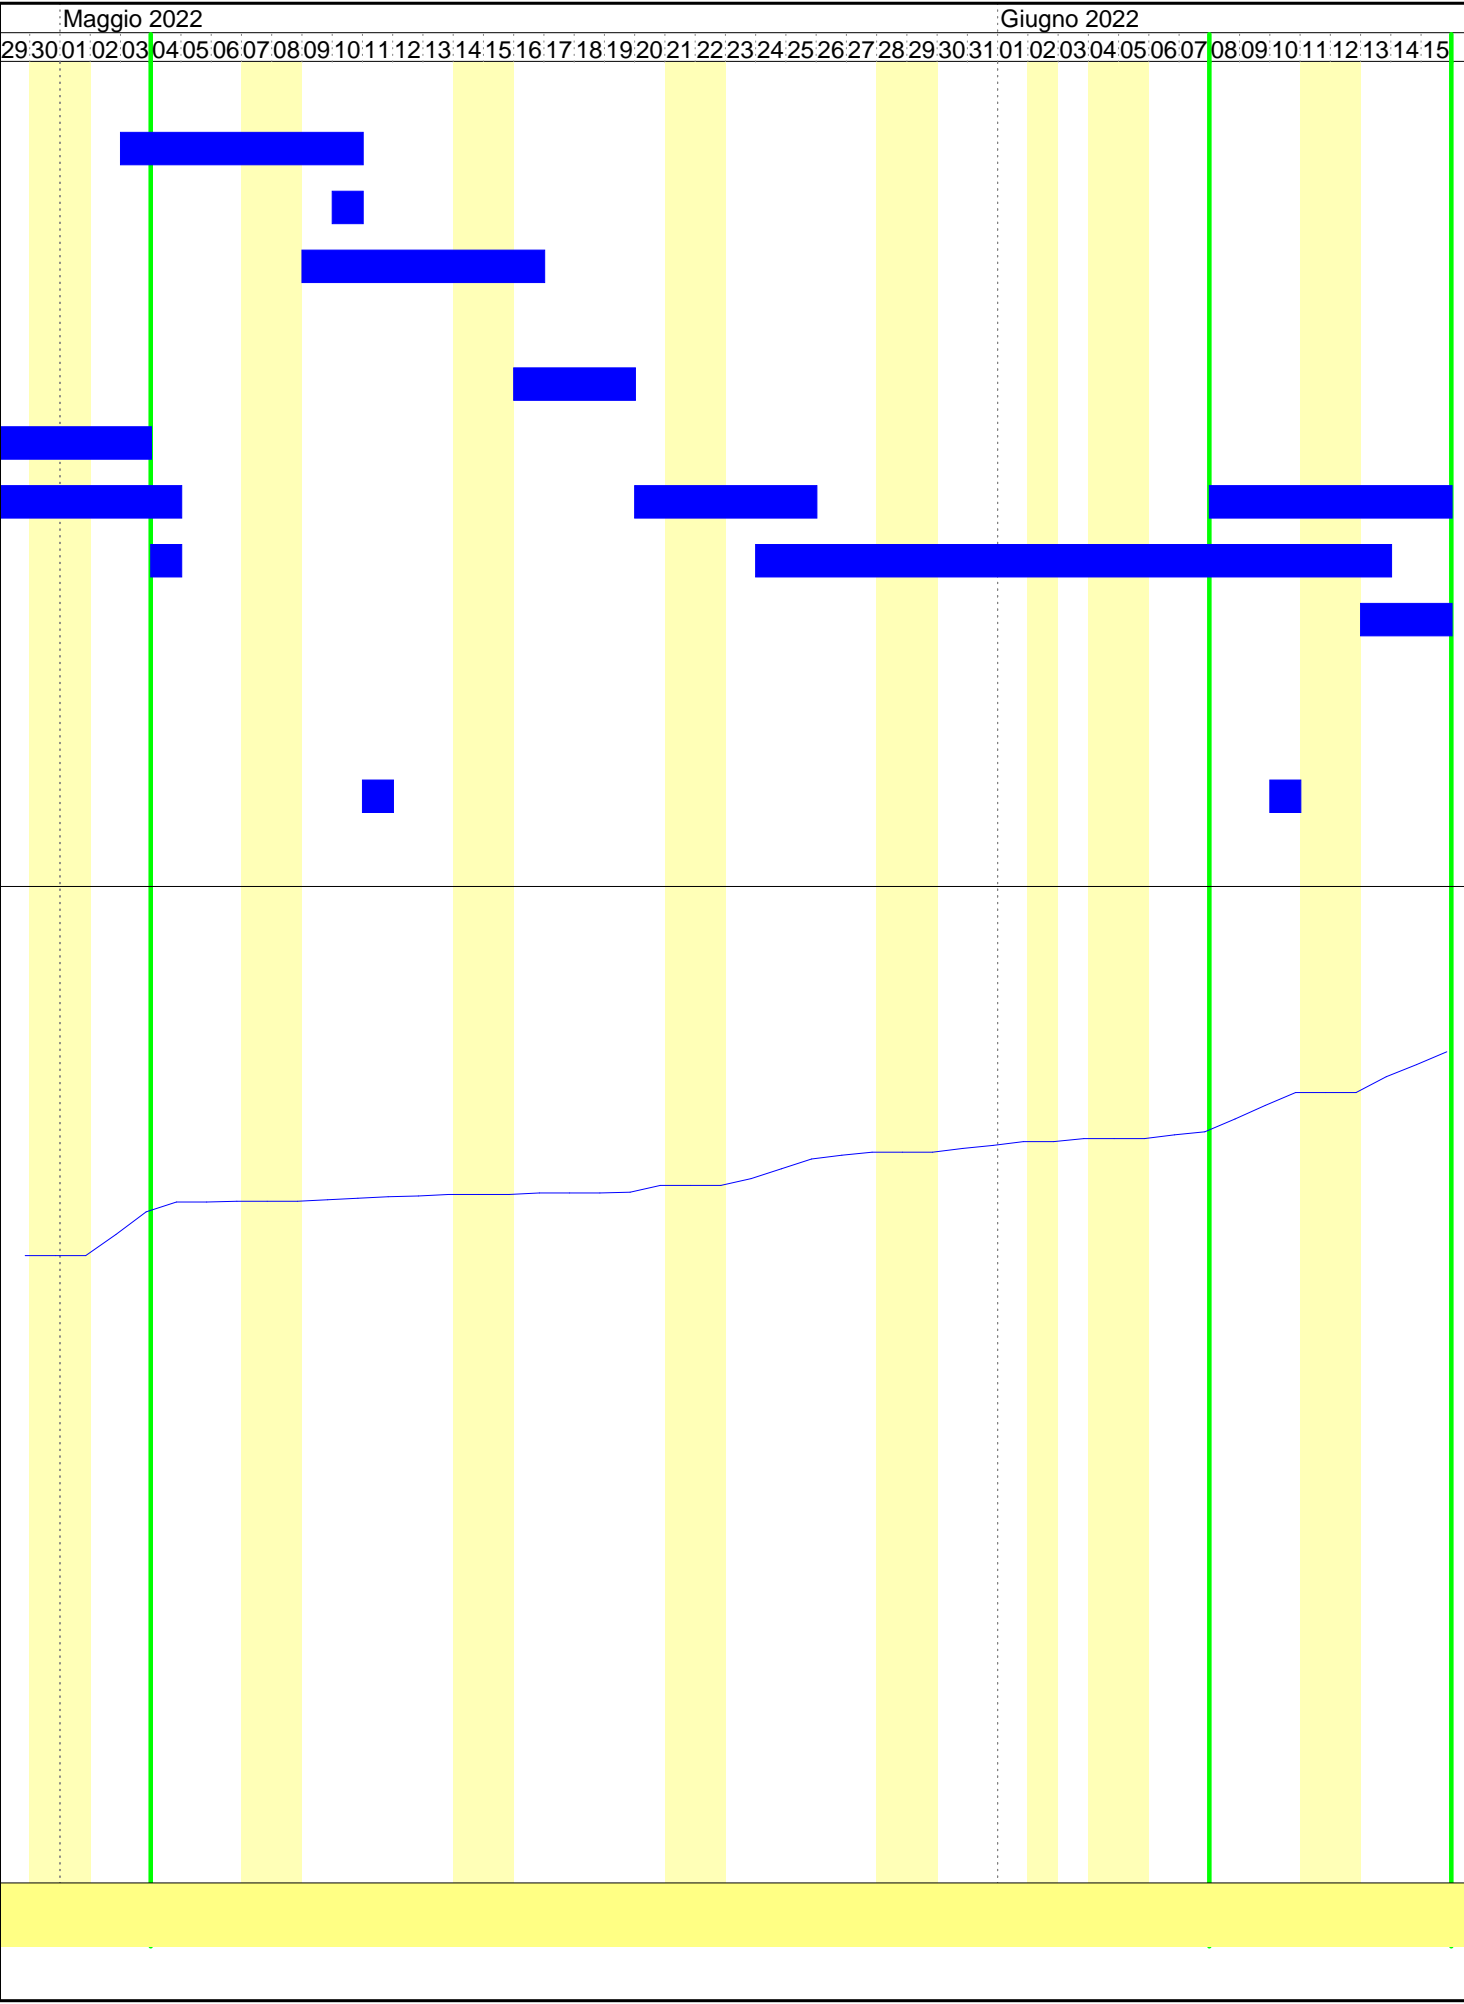

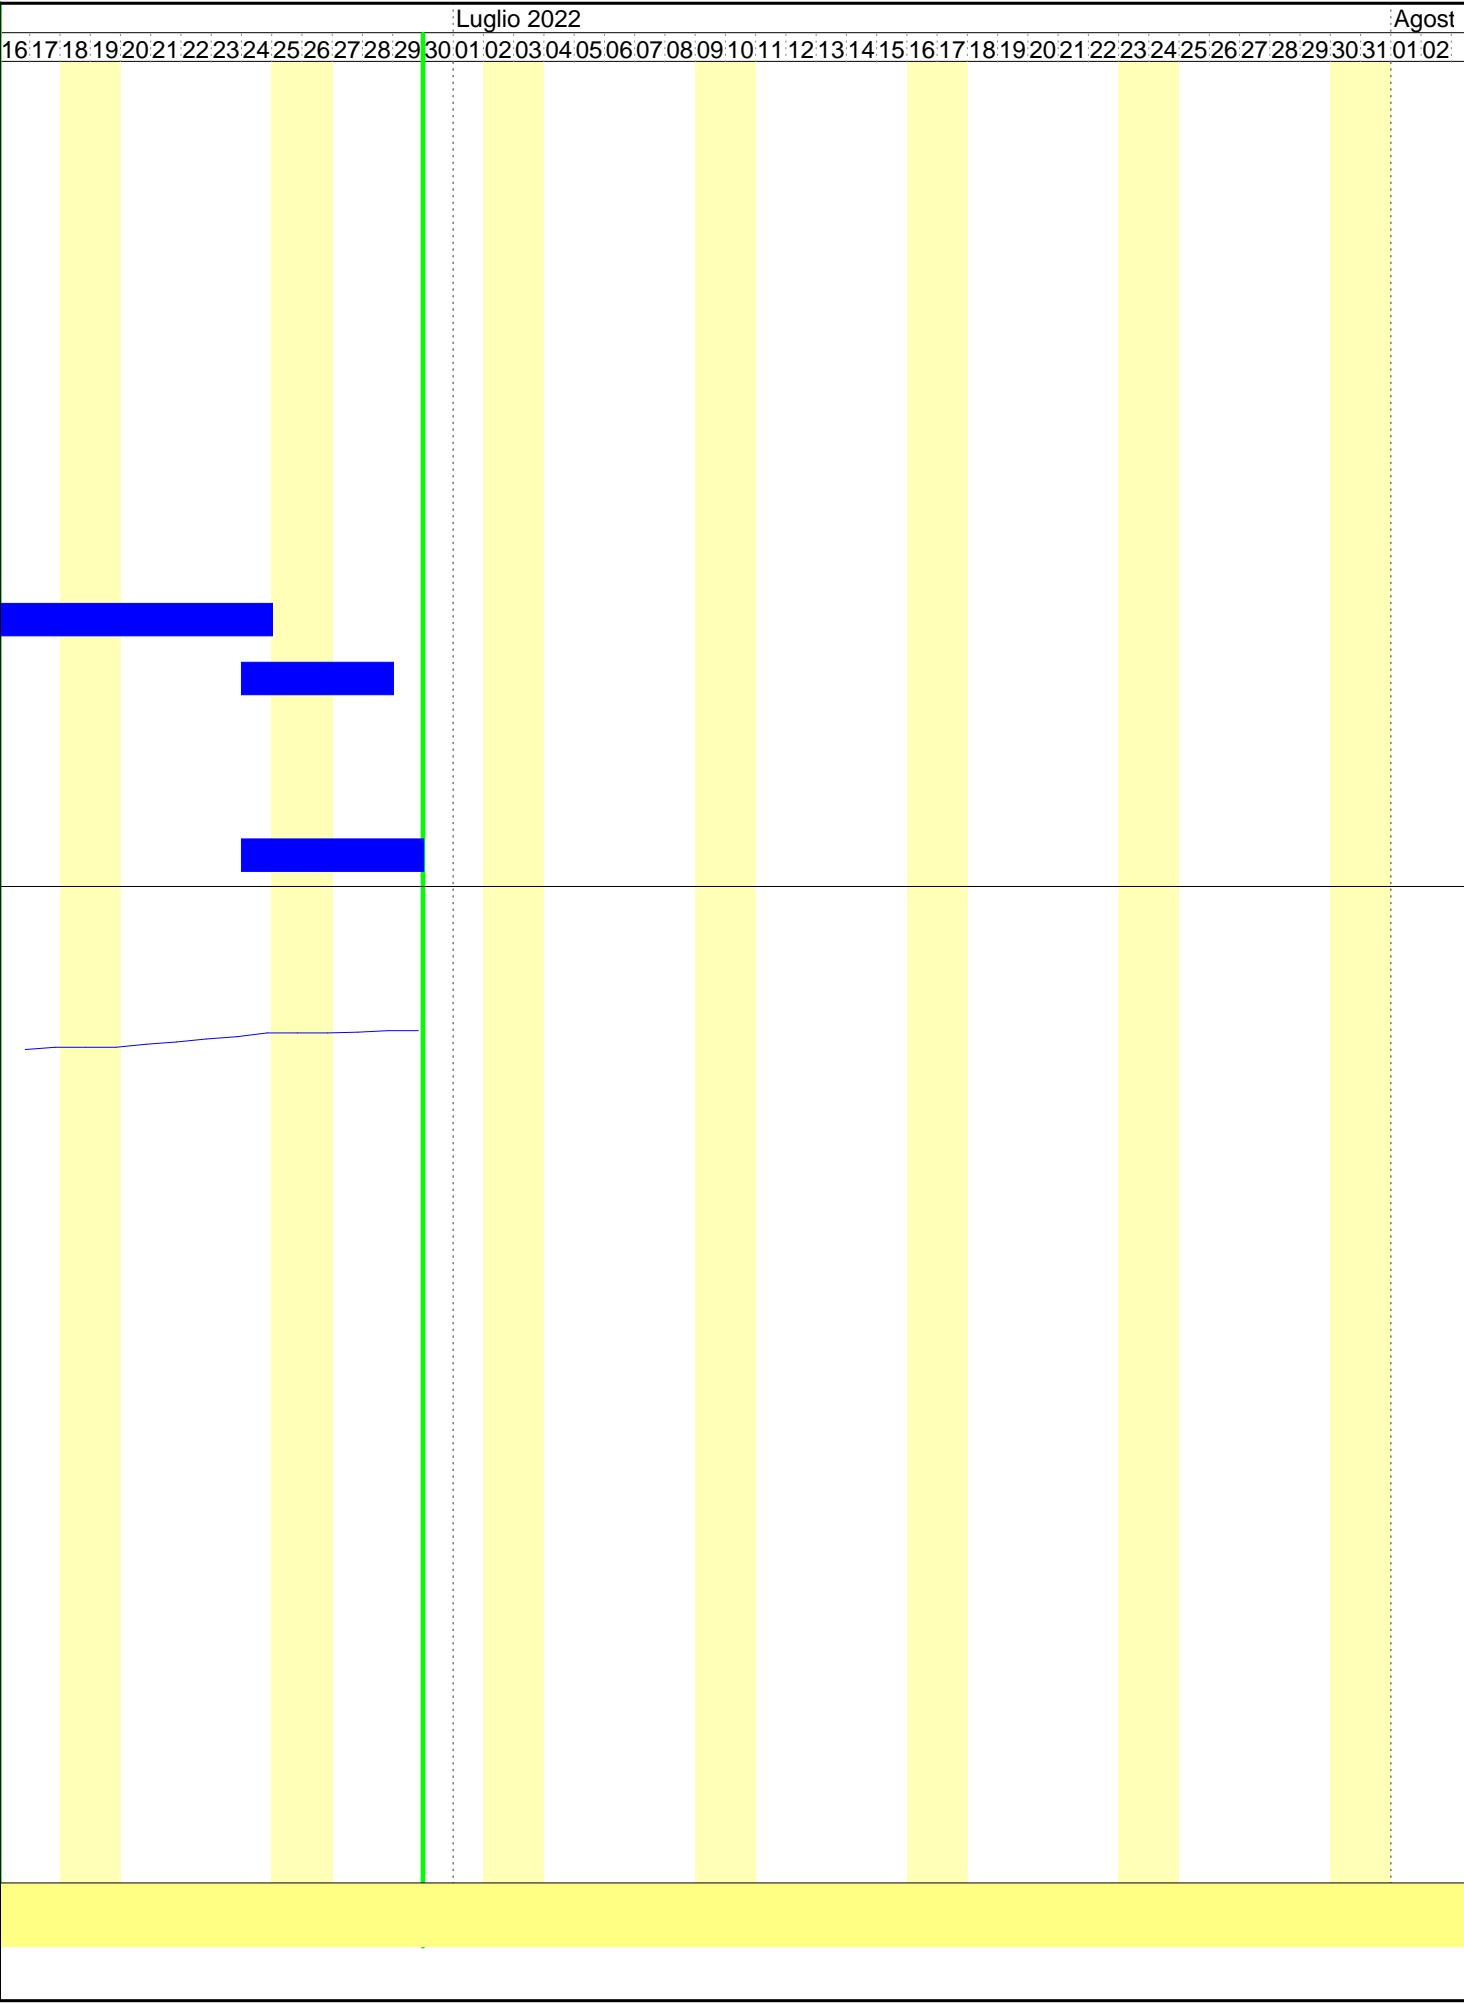

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Tabella Attività

OGGETTO: S.P. n. 6 Baucina - Ventimiglia di Sicilia (PA)
Interventi di sistemazione della strada nel tratto dalla S.S. n. 121 al
comune di Trabia, per il ripristino della viabilità in sicurezza.

Rev. 1 del 25/05/2021

COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Palermo, 25/05/2021

Il Tecnico
()

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|---|------------|-------|------------|------------|--------|------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE | 16'500,00 | 0,50 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | 3 | 5 |
| MOVIMENTI DI MATERIE E TRASPORTI | 91'953,56 | 2,81 | 06/07/2021 | 10/05/2022 | 85 | 116 |
| <i>periodo 01</i> | 6'436,75 | 0,20 | 06/07/2021 | 13/07/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 02</i> | 13'793,03 | 0,42 | 30/07/2021 | 17/08/2021 | 13 | 19 |
| <i>periodo 03</i> | 6'436,75 | 0,20 | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 04</i> | 6'436,75 | 0,20 | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 05</i> | 6'436,75 | 0,20 | 15/11/2021 | 22/11/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 06</i> | 6'436,75 | 0,20 | 06/12/2021 | 14/12/2021 | 6 | 9 |
| <i>periodo 07</i> | 6'436,75 | 0,20 | 28/12/2021 | 04/01/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 08</i> | 6'436,75 | 0,20 | 18/01/2022 | 25/01/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 09</i> | 6'436,75 | 0,20 | 08/02/2022 | 15/02/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 10</i> | 6'436,75 | 0,20 | 01/03/2022 | 08/03/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 11</i> | 6'436,75 | 0,20 | 18/03/2022 | 25/03/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 12</i> | 6'436,75 | 0,20 | 08/04/2022 | 15/04/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 13</i> | 7'356,28 | 0,22 | 03/05/2022 | 10/05/2022 | 6 | 8 |
| DEMOLIZIONI DI OPERE IN C.A. | 5'385,00 | 0,16 | 12/07/2021 | 10/05/2022 | 13 | 13 |
| <i>periodo 01</i> | 807,75 | 0,02 | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 2 | 2 |
| <i>periodo 02</i> | 430,80 | 0,01 | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 1 | 1 |
| <i>periodo 03</i> | 430,80 | 0,01 | 29/10/2021 | 29/10/2021 | 1 | 1 |
| <i>periodo 04</i> | 430,80 | 0,01 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 1 | 1 |
| <i>periodo 05</i> | 430,80 | 0,01 | 14/12/2021 | 14/12/2021 | 1 | 1 |
| <i>periodo 06</i> | 430,80 | 0,01 | 04/01/2022 | 04/01/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 07</i> | 430,80 | 0,01 | 25/01/2022 | 25/01/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 08</i> | 430,80 | 0,01 | 15/02/2022 | 15/02/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 09</i> | 430,80 | 0,01 | 08/03/2022 | 08/03/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 10</i> | 430,80 | 0,01 | 25/03/2022 | 25/03/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 11</i> | 430,80 | 0,01 | 15/04/2022 | 15/04/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 12</i> | 269,25 | 0,01 | 10/05/2022 | 10/05/2022 | 1 | 1 |
| OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI PROTEZIONE DEL TERRENO | 411'891,10 | 12,60 | 12/07/2021 | 16/05/2022 | 76 | 105 |
| <i>periodo 01</i> | 20'594,56 | 0,63 | 12/07/2021 | 15/07/2021 | 4 | 4 |
| <i>periodo 02</i> | 12'356,73 | 0,38 | 16/07/2021 | 19/07/2021 | 2 | 4 |
| <i>periodo 03</i> | 16'475,64 | 0,50 | 06/08/2021 | 10/08/2021 | 3 | 5 |
| <i>periodo 04</i> | 37'070,20 | 1,13 | 07/10/2021 | 15/10/2021 | 7 | 9 |
| <i>periodo 05</i> | 32'951,29 | 1,01 | 28/10/2021 | 05/11/2021 | 6 | 9 |
| <i>periodo 06</i> | 32'951,29 | 1,01 | 19/11/2021 | 26/11/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 07</i> | 32'951,29 | 1,01 | 13/12/2021 | 20/12/2021 | 6 | 8 |
| <i>periodo 08</i> | 32'951,29 | 1,01 | 03/01/2022 | 11/01/2022 | 6 | 9 |
| <i>periodo 09</i> | 32'951,29 | 1,01 | 24/01/2022 | 31/01/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 10</i> | 32'951,29 | 1,01 | 14/02/2022 | 21/02/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 11</i> | 32'951,29 | 1,01 | 07/03/2022 | 14/03/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 12</i> | 32'951,29 | 1,01 | 24/03/2022 | 31/03/2022 | 6 | 8 |
| <i>periodo 13</i> | 32'951,29 | 1,01 | 14/04/2022 | 22/04/2022 | 6 | 9 |
| <i>periodo 14</i> | 28'832,38 | 0,88 | 09/05/2022 | 16/05/2022 | 6 | 8 |
| MURO SU PALI (Intervento 17) | 203'215,10 | 6,21 | 18/08/2021 | 04/10/2021 | 34 | 48 |
| OPERE D'ARTE IN C.A. | 65'124,20 | 1,99 | 19/07/2021 | 19/05/2022 | 52 | 63 |
| <i>periodo 01</i> | 5'209,94 | 0,16 | 19/07/2021 | 22/07/2021 | 4 | 4 |
| <i>periodo 02</i> | 5'209,94 | 0,16 | 10/08/2021 | 13/08/2021 | 4 | 4 |
| <i>periodo 03</i> | 5'209,94 | 0,16 | 15/10/2021 | 20/10/2021 | 4 | 6 |
| <i>periodo 04</i> | 5'209,94 | 0,16 | 05/11/2021 | 10/11/2021 | 4 | 6 |
| <i>periodo 05</i> | 5'209,94 | 0,16 | 26/11/2021 | 01/12/2021 | 4 | 6 |
| <i>periodo 06</i> | 5'209,94 | 0,16 | 20/12/2021 | 23/12/2021 | 4 | 4 |
| <i>periodo 07</i> | 5'209,94 | 0,16 | 11/01/2022 | 14/01/2022 | 4 | 4 |
| <i>periodo 08</i> | 5'209,94 | 0,16 | 31/01/2022 | 03/02/2022 | 4 | 4 |
| <i>periodo 09</i> | 5'209,94 | 0,16 | 21/02/2022 | 24/02/2022 | 4 | 4 |
| <i>periodo 10</i> | 5'209,94 | 0,16 | 14/03/2022 | 17/03/2022 | 4 | 4 |
| <i>periodo 11</i> | 5'209,94 | 0,16 | 31/03/2022 | 05/04/2022 | 4 | 6 |
| <i>periodo 12</i> | 5'209,94 | 0,16 | 22/04/2022 | 28/04/2022 | 4 | 7 |
| <i>periodo 13</i> | 2'604,97 | 0,08 | 16/05/2022 | 19/05/2022 | 4 | 4 |

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|----------------------------------|--------------|-------|------------|------------|--------|------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| SCARIFICA STRADALE | 457'275,00 | 13,98 | 05/04/2022 | 03/05/2022 | 8 | 10 |
| periodo 01 | 228'637,50 | 6,99 | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 4 | 4 |
| periodo 02 | 228'637,50 | 6,99 | 28/04/2022 | 03/05/2022 | 4 | 6 |
| CORPO E PAVIMENTAZIONE STRADALE | 1'486'805,55 | 45,47 | 23/07/2021 | 15/06/2022 | 54 | 78 |
| periodo 01 | 104'076,39 | 3,18 | 23/07/2021 | 28/07/2021 | 4 | 6 |
| periodo 02 | 104'076,39 | 3,18 | 21/10/2021 | 26/10/2021 | 4 | 6 |
| periodo 03 | 104'076,39 | 3,18 | 11/11/2021 | 16/11/2021 | 4 | 6 |
| periodo 04 | 104'076,39 | 3,18 | 02/12/2021 | 07/12/2021 | 4 | 6 |
| periodo 05 | 104'076,39 | 3,18 | 24/12/2021 | 29/12/2021 | 4 | 6 |
| periodo 06 | 104'076,39 | 3,18 | 17/01/2022 | 20/01/2022 | 4 | 4 |
| periodo 07 | 104'076,39 | 3,18 | 04/02/2022 | 09/02/2022 | 4 | 6 |
| periodo 08 | 104'076,39 | 3,18 | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 4 | 6 |
| periodo 09 | 89'208,33 | 2,73 | 17/03/2022 | 21/03/2022 | 3 | 5 |
| periodo 10 | 133'812,50 | 4,09 | 06/04/2022 | 12/04/2022 | 5 | 7 |
| periodo 11 | 104'076,39 | 3,18 | 29/04/2022 | 04/05/2022 | 4 | 6 |
| periodo 12 | 104'076,39 | 3,18 | 20/05/2022 | 25/05/2022 | 4 | 6 |
| periodo 13 | 223'020,83 | 6,82 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 6 | 8 |
| BARRIERE STRADALI METALLICHE | 354'416,00 | 10,84 | 28/07/2021 | 13/06/2022 | 30 | 39 |
| periodo 01 | 10'632,48 | 0,33 | 28/07/2021 | 28/07/2021 | 1 | 1 |
| periodo 02 | 10'632,48 | 0,33 | 13/08/2021 | 13/08/2021 | 1 | 1 |
| periodo 03 | 46'074,08 | 1,41 | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 4 | 6 |
| periodo 04 | 10'632,48 | 0,33 | 26/10/2021 | 26/10/2021 | 1 | 1 |
| periodo 05 | 10'632,48 | 0,33 | 16/11/2021 | 16/11/2021 | 1 | 1 |
| periodo 06 | 10'632,48 | 0,33 | 07/12/2021 | 07/12/2021 | 1 | 1 |
| periodo 07 | 10'632,48 | 0,33 | 29/12/2021 | 29/12/2021 | 1 | 1 |
| periodo 08 | 10'632,48 | 0,33 | 20/01/2022 | 20/01/2022 | 1 | 1 |
| periodo 09 | 10'632,48 | 0,33 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 1 | 1 |
| periodo 10 | 10'632,48 | 0,33 | 02/03/2022 | 02/03/2022 | 1 | 1 |
| periodo 11 | 10'632,48 | 0,33 | 21/03/2022 | 21/03/2022 | 1 | 1 |
| periodo 12 | 10'632,48 | 0,33 | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 1 | 1 |
| periodo 13 | 10'632,48 | 0,33 | 04/05/2022 | 04/05/2022 | 1 | 1 |
| periodo 14 | 180'752,16 | 5,53 | 24/05/2022 | 13/06/2022 | 14 | 21 |
| SEGNALETICA STRADALE | 99'214,61 | 3,03 | 13/06/2022 | 24/06/2022 | 10 | 12 |
| OPERE VARIE E DI FINITURA | 42'702,92 | 1,31 | 08/07/2021 | 28/06/2022 | 17 | 25 |
| periodo 01 | 35'016,39 | 1,07 | 08/07/2021 | 27/07/2021 | 14 | 20 |
| periodo 02 | 7'686,53 | 0,24 | 24/06/2022 | 28/06/2022 | 3 | 5 |
| LAVORI IN ECONOMIA | 14'977,00 | 0,46 | 07/07/2021 | 28/03/2022 | 22 | 28 |
| periodo 01 | 2'096,78 | 0,06 | 07/07/2021 | 09/07/2021 | 3 | 3 |
| periodo 02 | 2'096,78 | 0,06 | 28/07/2021 | 30/07/2021 | 3 | 3 |
| periodo 03 | 2'096,78 | 0,06 | 20/08/2021 | 24/08/2021 | 3 | 5 |
| periodo 04 | 2'096,78 | 0,06 | 14/09/2021 | 16/09/2021 | 3 | 3 |
| periodo 05 | 1'347,93 | 0,04 | 13/10/2021 | 14/10/2021 | 2 | 2 |
| periodo 06 | 1'347,93 | 0,04 | 22/11/2021 | 23/11/2021 | 2 | 2 |
| periodo 07 | 1'347,93 | 0,04 | 30/12/2021 | 31/12/2021 | 2 | 2 |
| periodo 08 | 1'347,93 | 0,04 | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 2 | 4 |
| periodo 09 | 1'198,16 | 0,04 | 25/03/2022 | 28/03/2022 | 2 | 4 |
| COSTO DELLA SICUREZZA + COVID-19 | 15'067,98 | 0,46 | 01/07/2021 | 10/06/2022 | 19 | 25 |
| periodo 01 | 2'410,88 | 0,07 | 01/07/2021 | 05/07/2021 | 3 | 5 |
| periodo 02 | 753,40 | 0,02 | 29/07/2021 | 29/07/2021 | 1 | 1 |
| periodo 03 | 1'657,48 | 0,05 | 20/08/2021 | 23/08/2021 | 2 | 4 |
| periodo 04 | 1'657,48 | 0,05 | 17/09/2021 | 20/09/2021 | 2 | 4 |
| periodo 05 | 753,40 | 0,02 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 1 | 1 |
| periodo 06 | 753,40 | 0,02 | 13/10/2021 | 13/10/2021 | 1 | 1 |
| periodo 07 | 753,40 | 0,02 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | 1 | 1 |
| periodo 08 | 753,40 | 0,02 | 15/11/2021 | 15/11/2021 | 1 | 1 |
| periodo 09 | 753,40 | 0,02 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | 1 | 1 |
| periodo 10 | 753,40 | 0,02 | 11/01/2022 | 11/01/2022 | 1 | 1 |

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|-----------------------------------|----------|------|------------|------------|--------|------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| <i>periodo 11</i> | 753,40 | 0,02 | 09/02/2022 | 09/02/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 12</i> | 753,40 | 0,02 | 09/03/2022 | 09/03/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 13</i> | 753,40 | 0,02 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 14</i> | 753,40 | 0,02 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 1 | 1 |
| <i>periodo 15</i> | 1'054,76 | 0,03 | 10/06/2022 | 10/06/2022 | 1 | 1 |
| SMOBILIZZO E PULIZIA DEL CANTIERE | 5'500,00 | 0,17 | 24/06/2022 | 29/06/2022 | 4 | 6 |
| Palermo, 25/05/2021 | | | | | | |
| Tecnico | | | | | | |

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Tabella Date e Importi

OGGETTO: S.P. n. 6 Baucina - Ventimiglia di Sicilia (PA)
Interventi di sistemazione della strada nel tratto dalla S.S. n. 121 al
comune di Trabia, per il ripristino della viabilità in sicurezza.

Rev. 1 del 25/05/2021

COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Palermo, 25/05/2021

Il Tecnico
()

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 01/07/2021 | 6'303,63 | 6'303,63 | 0,19 |
| 02/07/2021 | 6'303,63 | 12'607,25 | 0,39 |
| 05/07/2021 | 6'303,63 | 18'910,88 | 0,58 |
| 06/07/2021 | 1'072,79 | 19'983,67 | 0,61 |
| 07/07/2021 | 1'771,72 | 21'755,39 | 0,67 |
| 08/07/2021 | 4'272,89 | 26'028,28 | 0,80 |
| 09/07/2021 | 4'272,89 | 30'301,16 | 0,93 |
| 12/07/2021 | 9'126,48 | 39'427,64 | 1,21 |
| 13/07/2021 | 9'126,48 | 48'554,12 | 1,48 |
| 14/07/2021 | 7'649,81 | 56'203,93 | 1,72 |
| 15/07/2021 | 7'649,81 | 63'853,74 | 1,95 |
| 16/07/2021 | 8'679,54 | 72'533,27 | 2,22 |
| 19/07/2021 | 9'982,02 | 82'515,30 | 2,52 |
| 20/07/2021 | 3'803,66 | 86'318,95 | 2,64 |
| 21/07/2021 | 3'803,66 | 90'122,61 | 2,76 |
| 22/07/2021 | 3'803,66 | 93'926,26 | 2,87 |
| 23/07/2021 | 28'520,27 | 122'446,53 | 3,74 |
| 26/07/2021 | 28'520,27 | 150'966,80 | 4,62 |
| 27/07/2021 | 28'520,27 | 179'487,07 | 5,49 |
| 28/07/2021 | 37'350,50 | 216'837,57 | 6,63 |
| 29/07/2021 | 1'452,33 | 218'289,90 | 6,68 |
| 30/07/2021 | 1'759,93 | 220'049,82 | 6,73 |
| 02/08/2021 | 1'061,00 | 221'110,83 | 6,76 |
| 03/08/2021 | 1'061,00 | 222'171,83 | 6,79 |
| 04/08/2021 | 1'061,00 | 223'232,83 | 6,83 |
| 05/08/2021 | 1'061,00 | 224'293,83 | 6,86 |
| 06/08/2021 | 6'552,88 | 230'846,72 | 7,06 |
| 09/08/2021 | 6'552,88 | 237'399,60 | 7,26 |
| 10/08/2021 | 7'855,37 | 245'254,97 | 7,50 |
| 11/08/2021 | 2'363,49 | 247'618,46 | 7,57 |
| 12/08/2021 | 2'363,49 | 249'981,94 | 7,64 |
| 13/08/2021 | 12'995,97 | 262'977,91 | 8,04 |
| 16/08/2021 | 1'061,00 | 264'038,91 | 8,07 |
| 17/08/2021 | 1'061,00 | 265'099,92 | 8,11 |
| 18/08/2021 | 5'976,91 | 271'076,83 | 8,29 |
| 19/08/2021 | 5'976,91 | 277'053,75 | 8,47 |
| 20/08/2021 | 7'504,58 | 284'558,33 | 8,70 |
| 23/08/2021 | 7'504,58 | 292'062,91 | 8,93 |
| 24/08/2021 | 6'675,84 | 298'738,75 | 9,14 |
| 25/08/2021 | 5'976,91 | 304'715,66 | 9,32 |
| 26/08/2021 | 5'976,91 | 310'692,58 | 9,50 |
| 27/08/2021 | 5'976,91 | 316'669,49 | 9,68 |
| 30/08/2021 | 5'976,91 | 322'646,41 | 9,87 |
| 31/08/2021 | 5'976,91 | 328'623,32 | 10,05 |
| 01/09/2021 | 5'976,91 | 334'600,24 | 10,23 |
| 02/09/2021 | 5'976,91 | 340'577,15 | 10,42 |
| 03/09/2021 | 5'976,91 | 346'554,06 | 10,60 |
| 06/09/2021 | 5'976,91 | 352'530,98 | 10,78 |
| 07/09/2021 | 5'976,91 | 358'507,89 | 10,96 |
| 08/09/2021 | 5'976,91 | 364'484,81 | 11,15 |
| 09/09/2021 | 5'976,91 | 370'461,72 | 11,33 |
| 10/09/2021 | 5'976,91 | 376'438,64 | 11,51 |
| 13/09/2021 | 5'976,91 | 382'415,55 | 11,69 |
| 14/09/2021 | 6'675,84 | 389'091,39 | 11,90 |
| 15/09/2021 | 6'675,84 | 395'767,24 | 12,10 |
| 16/09/2021 | 6'675,84 | 402'443,08 | 12,31 |
| 17/09/2021 | 6'805,65 | 409'248,73 | 12,52 |
| 20/09/2021 | 6'805,65 | 416'054,38 | 12,72 |
| 21/09/2021 | 5'976,91 | 422'031,30 | 12,91 |
| 22/09/2021 | 5'976,91 | 428'008,21 | 13,09 |
| 23/09/2021 | 5'976,91 | 433'985,13 | 13,27 |
| 24/09/2021 | 5'976,91 | 439'962,04 | 13,45 |
| 27/09/2021 | 5'976,91 | 445'938,96 | 13,64 |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 28/09/2021 | 5'976,91 | 451'915,87 | 13,82 |
| 29/09/2021 | 5'976,91 | 457'892,79 | 14,00 |
| 30/09/2021 | 5'976,91 | 463'869,70 | 14,19 |
| 01/10/2021 | 18'568,23 | 482'437,93 | 14,75 |
| 04/10/2021 | 18'568,22 | 501'006,15 | 15,32 |
| 05/10/2021 | 12'591,31 | 513'597,46 | 15,71 |
| 06/10/2021 | 12'591,31 | 526'188,77 | 16,09 |
| 07/10/2021 | 6'368,53 | 532'557,31 | 16,29 |
| 08/10/2021 | 6'799,33 | 539'356,64 | 16,49 |
| 11/10/2021 | 5'295,74 | 544'652,38 | 16,66 |
| 12/10/2021 | 6'049,14 | 550'701,53 | 16,84 |
| 13/10/2021 | 6'723,11 | 557'424,63 | 17,05 |
| 14/10/2021 | 5'969,71 | 563'394,34 | 17,23 |
| 15/10/2021 | 6'598,23 | 569'992,57 | 17,43 |
| 18/10/2021 | 1'302,48 | 571'295,05 | 17,47 |
| 19/10/2021 | 1'302,48 | 572'597,53 | 17,51 |
| 20/10/2021 | 1'302,48 | 573'900,02 | 17,55 |
| 21/10/2021 | 26'019,10 | 599'919,12 | 18,35 |
| 22/10/2021 | 27'091,89 | 627'011,00 | 19,17 |
| 25/10/2021 | 27'091,89 | 654'102,89 | 20,00 |
| 26/10/2021 | 37'724,37 | 691'827,26 | 21,16 |
| 27/10/2021 | 1'072,79 | 692'900,05 | 21,19 |
| 28/10/2021 | 7'318,07 | 700'218,13 | 21,41 |
| 29/10/2021 | 6'995,47 | 707'213,60 | 21,63 |
| 02/11/2021 | 5'491,88 | 712'705,48 | 21,80 |
| 03/11/2021 | 5'491,88 | 718'197,36 | 21,96 |
| 04/11/2021 | 5'491,88 | 723'689,24 | 22,13 |
| 05/11/2021 | 6'794,37 | 730'483,61 | 22,34 |
| 08/11/2021 | 1'302,48 | 731'786,09 | 22,38 |
| 09/11/2021 | 1'302,48 | 733'088,58 | 22,42 |
| 10/11/2021 | 1'302,48 | 734'391,06 | 22,46 |
| 11/11/2021 | 26'019,10 | 760'410,16 | 23,25 |
| 12/11/2021 | 26'019,10 | 786'429,25 | 24,05 |
| 15/11/2021 | 27'845,29 | 814'274,54 | 24,90 |
| 16/11/2021 | 37'724,37 | 851'998,91 | 26,05 |
| 17/11/2021 | 1'072,79 | 853'071,70 | 26,09 |
| 18/11/2021 | 1'072,79 | 854'144,49 | 26,12 |
| 19/11/2021 | 6'564,67 | 860'709,17 | 26,32 |
| 22/11/2021 | 7'669,44 | 868'378,60 | 26,56 |
| 23/11/2021 | 6'165,85 | 874'544,45 | 26,74 |
| 24/11/2021 | 5'491,88 | 880'036,33 | 26,91 |
| 25/11/2021 | 5'491,88 | 885'528,21 | 27,08 |
| 26/11/2021 | 6'794,37 | 892'322,58 | 27,29 |
| 29/11/2021 | 1'302,48 | 893'625,06 | 27,33 |
| 30/11/2021 | 1'302,48 | 894'927,55 | 27,37 |
| 01/12/2021 | 1'302,48 | 896'230,03 | 27,41 |
| 02/12/2021 | 26'019,10 | 922'249,13 | 28,20 |
| 03/12/2021 | 26'019,10 | 948'268,22 | 29,00 |
| 06/12/2021 | 27'091,89 | 975'360,11 | 29,83 |
| 07/12/2021 | 37'724,37 | 1'013'084,48 | 30,98 |
| 09/12/2021 | 1'072,79 | 1'014'157,27 | 31,01 |
| 10/12/2021 | 1'826,19 | 1'015'983,46 | 31,07 |
| 13/12/2021 | 6'564,67 | 1'022'548,14 | 31,27 |
| 14/12/2021 | 6'995,47 | 1'029'543,61 | 31,48 |
| 15/12/2021 | 5'491,88 | 1'035'035,49 | 31,65 |
| 16/12/2021 | 5'491,88 | 1'040'527,37 | 31,82 |
| 17/12/2021 | 5'491,88 | 1'046'019,25 | 31,99 |
| 20/12/2021 | 6'794,37 | 1'052'813,62 | 32,20 |
| 21/12/2021 | 1'302,48 | 1'054'116,10 | 32,24 |
| 22/12/2021 | 1'302,48 | 1'055'418,59 | 32,28 |
| 23/12/2021 | 1'302,48 | 1'056'721,07 | 32,32 |
| 24/12/2021 | 26'019,10 | 1'082'740,17 | 33,11 |
| 27/12/2021 | 26'019,10 | 1'108'759,27 | 33,91 |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 28/12/2021 | 27'091,89 | 1'135'851,15 | 34,74 |
| 29/12/2021 | 37'724,37 | 1'173'575,52 | 35,89 |
| 30/12/2021 | 1'746,76 | 1'175'322,28 | 35,94 |
| 31/12/2021 | 1'746,76 | 1'177'069,04 | 36,00 |
| 03/01/2022 | 6'564,67 | 1'183'633,71 | 36,20 |
| 04/01/2022 | 6'995,47 | 1'190'629,18 | 36,41 |
| 05/01/2022 | 5'491,88 | 1'196'121,06 | 36,58 |
| 07/01/2022 | 5'491,88 | 1'201'612,94 | 36,75 |
| 10/01/2022 | 5'491,88 | 1'207'104,83 | 36,91 |
| 11/01/2022 | 7'547,76 | 1'214'652,59 | 37,15 |
| 12/01/2022 | 1'302,48 | 1'215'955,07 | 37,18 |
| 13/01/2022 | 1'302,48 | 1'217'257,56 | 37,22 |
| 14/01/2022 | 1'302,48 | 1'218'560,04 | 37,26 |
| 17/01/2022 | 26'019,10 | 1'244'579,14 | 38,06 |
| 18/01/2022 | 27'091,89 | 1'271'671,03 | 38,89 |
| 19/01/2022 | 27'091,89 | 1'298'762,92 | 39,72 |
| 20/01/2022 | 37'724,37 | 1'336'487,28 | 40,87 |
| 21/01/2022 | 1'072,79 | 1'337'560,08 | 40,90 |
| 24/01/2022 | 6'564,67 | 1'344'124,75 | 41,10 |
| 25/01/2022 | 6'995,47 | 1'351'120,22 | 41,32 |
| 26/01/2022 | 5'491,88 | 1'356'612,10 | 41,49 |
| 27/01/2022 | 5'491,88 | 1'362'103,98 | 41,65 |
| 28/01/2022 | 5'491,88 | 1'367'595,87 | 41,82 |
| 31/01/2022 | 6'794,37 | 1'374'390,23 | 42,03 |
| 01/02/2022 | 1'302,48 | 1'375'692,72 | 42,07 |
| 02/02/2022 | 1'302,48 | 1'376'995,20 | 42,11 |
| 03/02/2022 | 1'302,48 | 1'378'297,68 | 42,15 |
| 04/02/2022 | 26'019,10 | 1'404'316,78 | 42,95 |
| 07/02/2022 | 26'019,10 | 1'430'335,88 | 43,74 |
| 08/02/2022 | 27'091,89 | 1'457'427,77 | 44,57 |
| 09/02/2022 | 38'477,77 | 1'495'905,53 | 45,75 |
| 10/02/2022 | 1'072,79 | 1'496'978,33 | 45,78 |
| 11/02/2022 | 1'746,76 | 1'498'725,08 | 45,83 |
| 14/02/2022 | 7'238,64 | 1'505'963,72 | 46,05 |
| 15/02/2022 | 6'995,47 | 1'512'959,19 | 46,27 |
| 16/02/2022 | 5'491,88 | 1'518'451,07 | 46,44 |
| 17/02/2022 | 5'491,88 | 1'523'942,96 | 46,60 |
| 18/02/2022 | 5'491,88 | 1'529'434,84 | 46,77 |
| 21/02/2022 | 6'794,37 | 1'536'229,20 | 46,98 |
| 22/02/2022 | 1'302,48 | 1'537'531,69 | 47,02 |
| 23/02/2022 | 1'302,48 | 1'538'834,17 | 47,06 |
| 24/02/2022 | 1'302,48 | 1'540'136,65 | 47,10 |
| 25/02/2022 | 26'019,10 | 1'566'155,75 | 47,89 |
| 28/02/2022 | 26'019,10 | 1'592'174,85 | 48,69 |
| 01/03/2022 | 27'091,89 | 1'619'266,74 | 49,52 |
| 02/03/2022 | 37'724,37 | 1'656'991,11 | 50,67 |
| 03/03/2022 | 1'072,79 | 1'658'063,90 | 50,70 |
| 04/03/2022 | 1'072,79 | 1'659'136,69 | 50,74 |
| 07/03/2022 | 6'564,67 | 1'665'701,36 | 50,94 |
| 08/03/2022 | 6'995,47 | 1'672'696,83 | 51,15 |
| 09/03/2022 | 6'245,28 | 1'678'942,11 | 51,34 |
| 10/03/2022 | 5'491,88 | 1'684'434,00 | 51,51 |
| 11/03/2022 | 5'491,88 | 1'689'925,88 | 51,68 |
| 14/03/2022 | 6'794,37 | 1'696'720,24 | 51,89 |
| 15/03/2022 | 1'302,48 | 1'698'022,73 | 51,93 |
| 16/03/2022 | 1'302,48 | 1'699'325,21 | 51,97 |
| 17/03/2022 | 31'038,60 | 1'730'363,81 | 52,92 |
| 18/03/2022 | 30'808,90 | 1'761'172,71 | 53,86 |
| 21/03/2022 | 41'441,38 | 1'802'614,09 | 55,13 |
| 22/03/2022 | 1'072,79 | 1'803'686,88 | 55,16 |
| 23/03/2022 | 1'072,79 | 1'804'759,67 | 55,19 |
| 24/03/2022 | 6'564,67 | 1'811'324,35 | 55,39 |
| 25/03/2022 | 7'594,55 | 1'818'918,90 | 55,62 |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|------------|------------------|---------------------|-------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 28/03/2022 | 6'090,96 | 1'825'009,86 | 55,81 |
| 29/03/2022 | 5'491,88 | 1'830'501,74 | 55,98 |
| 30/03/2022 | 5'491,88 | 1'835'993,62 | 56,15 |
| 31/03/2022 | 6'794,37 | 1'842'787,99 | 56,35 |
| 01/04/2022 | 1'302,48 | 1'844'090,47 | 56,39 |
| 04/04/2022 | 1'302,48 | 1'845'392,96 | 56,43 |
| 05/04/2022 | 58'461,86 | 1'903'854,82 | 58,22 |
| 06/04/2022 | 84'675,27 | 1'988'530,09 | 60,81 |
| 07/04/2022 | 83'921,87 | 2'072'451,96 | 63,38 |
| 08/04/2022 | 84'994,67 | 2'157'446,63 | 65,98 |
| 11/04/2022 | 27'835,29 | 2'185'281,92 | 66,83 |
| 12/04/2022 | 38'467,77 | 2'223'749,69 | 68,00 |
| 13/04/2022 | 1'072,79 | 2'224'822,49 | 68,04 |
| 14/04/2022 | 6'564,67 | 2'231'387,16 | 68,24 |
| 15/04/2022 | 6'995,47 | 2'238'382,63 | 68,45 |
| 19/04/2022 | 5'491,88 | 2'243'874,51 | 68,62 |
| 20/04/2022 | 5'491,88 | 2'249'366,39 | 68,79 |
| 21/04/2022 | 5'491,88 | 2'254'858,28 | 68,96 |
| 22/04/2022 | 6'794,37 | 2'261'652,64 | 69,16 |
| 26/04/2022 | 1'302,48 | 2'262'955,12 | 69,20 |
| 27/04/2022 | 1'302,48 | 2'264'257,61 | 69,24 |
| 28/04/2022 | 58'461,86 | 2'322'719,47 | 71,03 |
| 29/04/2022 | 83'178,47 | 2'405'897,94 | 73,57 |
| 02/05/2022 | 83'178,47 | 2'489'076,41 | 76,12 |
| 03/05/2022 | 84'404,52 | 2'573'480,94 | 78,70 |
| 04/05/2022 | 37'877,62 | 2'611'358,56 | 79,86 |
| 05/05/2022 | 1'226,05 | 2'612'584,61 | 79,89 |
| 06/05/2022 | 1'226,05 | 2'613'810,66 | 79,93 |
| 09/05/2022 | 6'031,44 | 2'619'842,10 | 80,12 |
| 10/05/2022 | 6'300,70 | 2'626'142,80 | 80,31 |
| 11/05/2022 | 5'558,80 | 2'631'701,59 | 80,48 |
| 12/05/2022 | 4'805,40 | 2'636'506,99 | 80,63 |
| 13/05/2022 | 4'805,40 | 2'641'312,38 | 80,77 |
| 16/05/2022 | 5'456,64 | 2'646'769,03 | 80,94 |
| 17/05/2022 | 651,24 | 2'647'420,27 | 80,96 |
| 18/05/2022 | 651,24 | 2'648'071,51 | 80,98 |
| 19/05/2022 | 651,24 | 2'648'722,75 | 81,00 |
| 20/05/2022 | 26'019,10 | 2'674'741,85 | 81,80 |
| 23/05/2022 | 26'019,10 | 2'700'760,94 | 82,59 |
| 24/05/2022 | 38'929,97 | 2'739'690,91 | 83,78 |
| 25/05/2022 | 38'929,97 | 2'778'620,88 | 84,97 |
| 26/05/2022 | 12'910,87 | 2'791'531,74 | 85,37 |
| 27/05/2022 | 12'910,87 | 2'804'442,61 | 85,76 |
| 30/05/2022 | 12'910,87 | 2'817'353,48 | 86,16 |
| 31/05/2022 | 12'910,87 | 2'830'264,35 | 86,55 |
| 01/06/2022 | 12'910,87 | 2'843'175,22 | 86,95 |
| 03/06/2022 | 12'910,87 | 2'856'086,09 | 87,34 |
| 06/06/2022 | 12'910,87 | 2'868'996,96 | 87,74 |
| 07/06/2022 | 12'910,87 | 2'881'907,82 | 88,13 |
| 08/06/2022 | 50'081,01 | 2'931'988,83 | 89,66 |
| 09/06/2022 | 50'081,01 | 2'982'069,84 | 91,19 |
| 10/06/2022 | 51'135,77 | 3'033'205,61 | 92,76 |
| 13/06/2022 | 60'002,47 | 3'093'208,08 | 94,59 |
| 14/06/2022 | 47'091,60 | 3'140'299,68 | 96,03 |
| 15/06/2022 | 47'091,60 | 3'187'391,28 | 97,47 |
| 16/06/2022 | 9'921,46 | 3'197'312,74 | 97,78 |
| 17/06/2022 | 9'921,46 | 3'207'234,20 | 98,08 |
| 20/06/2022 | 9'921,46 | 3'217'155,66 | 98,38 |
| 21/06/2022 | 9'921,46 | 3'227'077,12 | 98,69 |
| 22/06/2022 | 9'921,46 | 3'236'998,58 | 98,99 |
| 23/06/2022 | 9'921,46 | 3'246'920,04 | 99,29 |
| 24/06/2022 | 13'858,64 | 3'260'778,68 | 99,72 |
| 27/06/2022 | 3'937,18 | 3'264'715,85 | 99,84 |

| DATA | IMPORTI PREVISTI | | |
|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| | Parziale euro | Progressivo euro | (%) |
| 28/06/2022 | 3'937,18 | 3'268'653,03 | 99,96 |
| 29/06/2022 | 1'375,00 | 3'270'028,03 | 100,00 |
| Palermo, 25/05/2021 | | | |
| Tecnico | | | |
