

REGIONE SICILIANA



COMUNE DI CORLEONE



REALIZZAZIONE DI UN'AREA DESTINATA A CAMPO DI TIRO A VOLO
IN CONTRADA PONTE ARANCI

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI AMMINISTRATIVI
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

elaborato

A.8

SCALA



PROGETTAZIONE

Arch. Filippo Diana

COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Nazareno Salamone

R.U.P.

Geom. Paolo Russo

Comune di Corleone

Città metropolitana di Palermo
Area 7 - Tecnica

VALIDAZIONE POSITIVA
ai sensi dell'art. 26 e comma 8
D.P.R. 50 del 2016

Corleone li, _____

R.U.P.
Geom. Paolo Russo


Assessore
Salvatore Schillaci


Sindaco
Dott. Nicolò Nicolosi


ID	Nome attività	Durata	Importo
1	Lavori a MISURA	116 g	222'495,03
2	ILLUMINAZIONE STRADALE	50 g	25'743,39
3	ILLUMINAZIONE STRADALE	50 g	25'743,39
4	MOVIMENTO TERRA	2 g	661,04
5	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, ... di escavazione di adeguata pote...	1 g	378,84
6	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... meccanici che manuali - per ogni m³...	1 g	282,20
7	OPERE DI FONDAZIONE	15 g	12'041,63
8	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fonda ... PVC annegato nel getto) e dei fori...	1 g	1'192,80
9	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in g ... a a regola d'arte, classe B 125 (carico...	1 g	817,74
10	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... leta a perfetta regola d'arte, ...	2 g	1'612,24
11	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di ... ta regola d'arte, cavido...	4 g	2'687,45
12	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero, c...	3 g	2'878,76
13	Esecuzione di giunzione derivata, grado di pro ... egola d'arte, per cavo principale di sezi...	1 g	1'504,44
14	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissagg...	2 g	1'272,60
15	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corf ... do, in opera completa di morsett...	1 g	75,60
16	OPERE DI ELEVAZIONE	10 g	13'040,72
17	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero, c...	1 g	372,96
18	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... base in mm D = 127 mm; d = 65 ...	2 g	8'021,72
19	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predispos ... lopedonale e di categoria di intens...	7 g	4'646,04
20	IMPIANTO ELETTRICO	15 g	31'308,30
21	IMPIANTO ELETTRICO	15 g	31'308,30
22	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in mate ... in opera, centralino da parete IP55 ...	1 g	113,30
23	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... e fino a morsettiere, interr.non automat...	1 g	61,00
24	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... erfetta regola d'arte, spia prese...	1 g	66,60
25	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... n=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo ...	1 g	70,70
26	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... interr.crepuscolare 2-2000 Lu...	1 g	186,90
27	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... egola d'arte, contattore modulare...	1 g	45,90
28	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori . lcn=4,5 kA curva C -...	1 g	94,60
29	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero, c...	12 g	19'180,00
30	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in mate ... in opera, centralino da parete IP55 ...	1 g	284,60
31	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di ... a regola d'arte, cavidotto corrugato dop...	3 g	2'275,00
32	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... o a morsettieria, interr.non automatico -...	1 g	61,60
33	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... fetta regola d'arte, spia...	1 g	51,00
34	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori . lcn=4,5 kA curva C -...	1 g	446,40
35	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acc ... gamenti elettrici, blocco diff. 4P In <= ...	1 g	531,60
36	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... lori superiori . lcn=4,5 kA curva C - 1P+...	2 g	435,60
37	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... n=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo ...	1 g	282,80
38	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o ... la minuteria ed ogni altro onere, con cavo di t...	2 g	933,40
39	Fornitura e posa in opera di punto di comando pe ... e, con un singolo comando interrotto o pulsa...	1 g	569,80
40	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... d ogni altro onere, monofase, conduttori...	2 g	838,40
41	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... a quella del cavo principale presa 2P+I 10/16A ...	1 g	169,60
42	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... essere almeno IP44. Meno restrittiva diame...	1 g	610,00
43	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da in ... so da 2700 fino a 4200 lumen. Dri...	1 g	2'465,60
44	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LE ... sospensione. Flusso luminoso da 5600...	1 g	1'533,90
45	IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO	23 g	36'942,65
46	IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO	23 g	36'942,65
47	Fornitura e collocazione di bottaio in fire-clay delle ... e l'opera completa e funzionante a perfetta reg...	1 g	217,22
48	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionant...	1 g	956,31

[illegible]

— Previsione

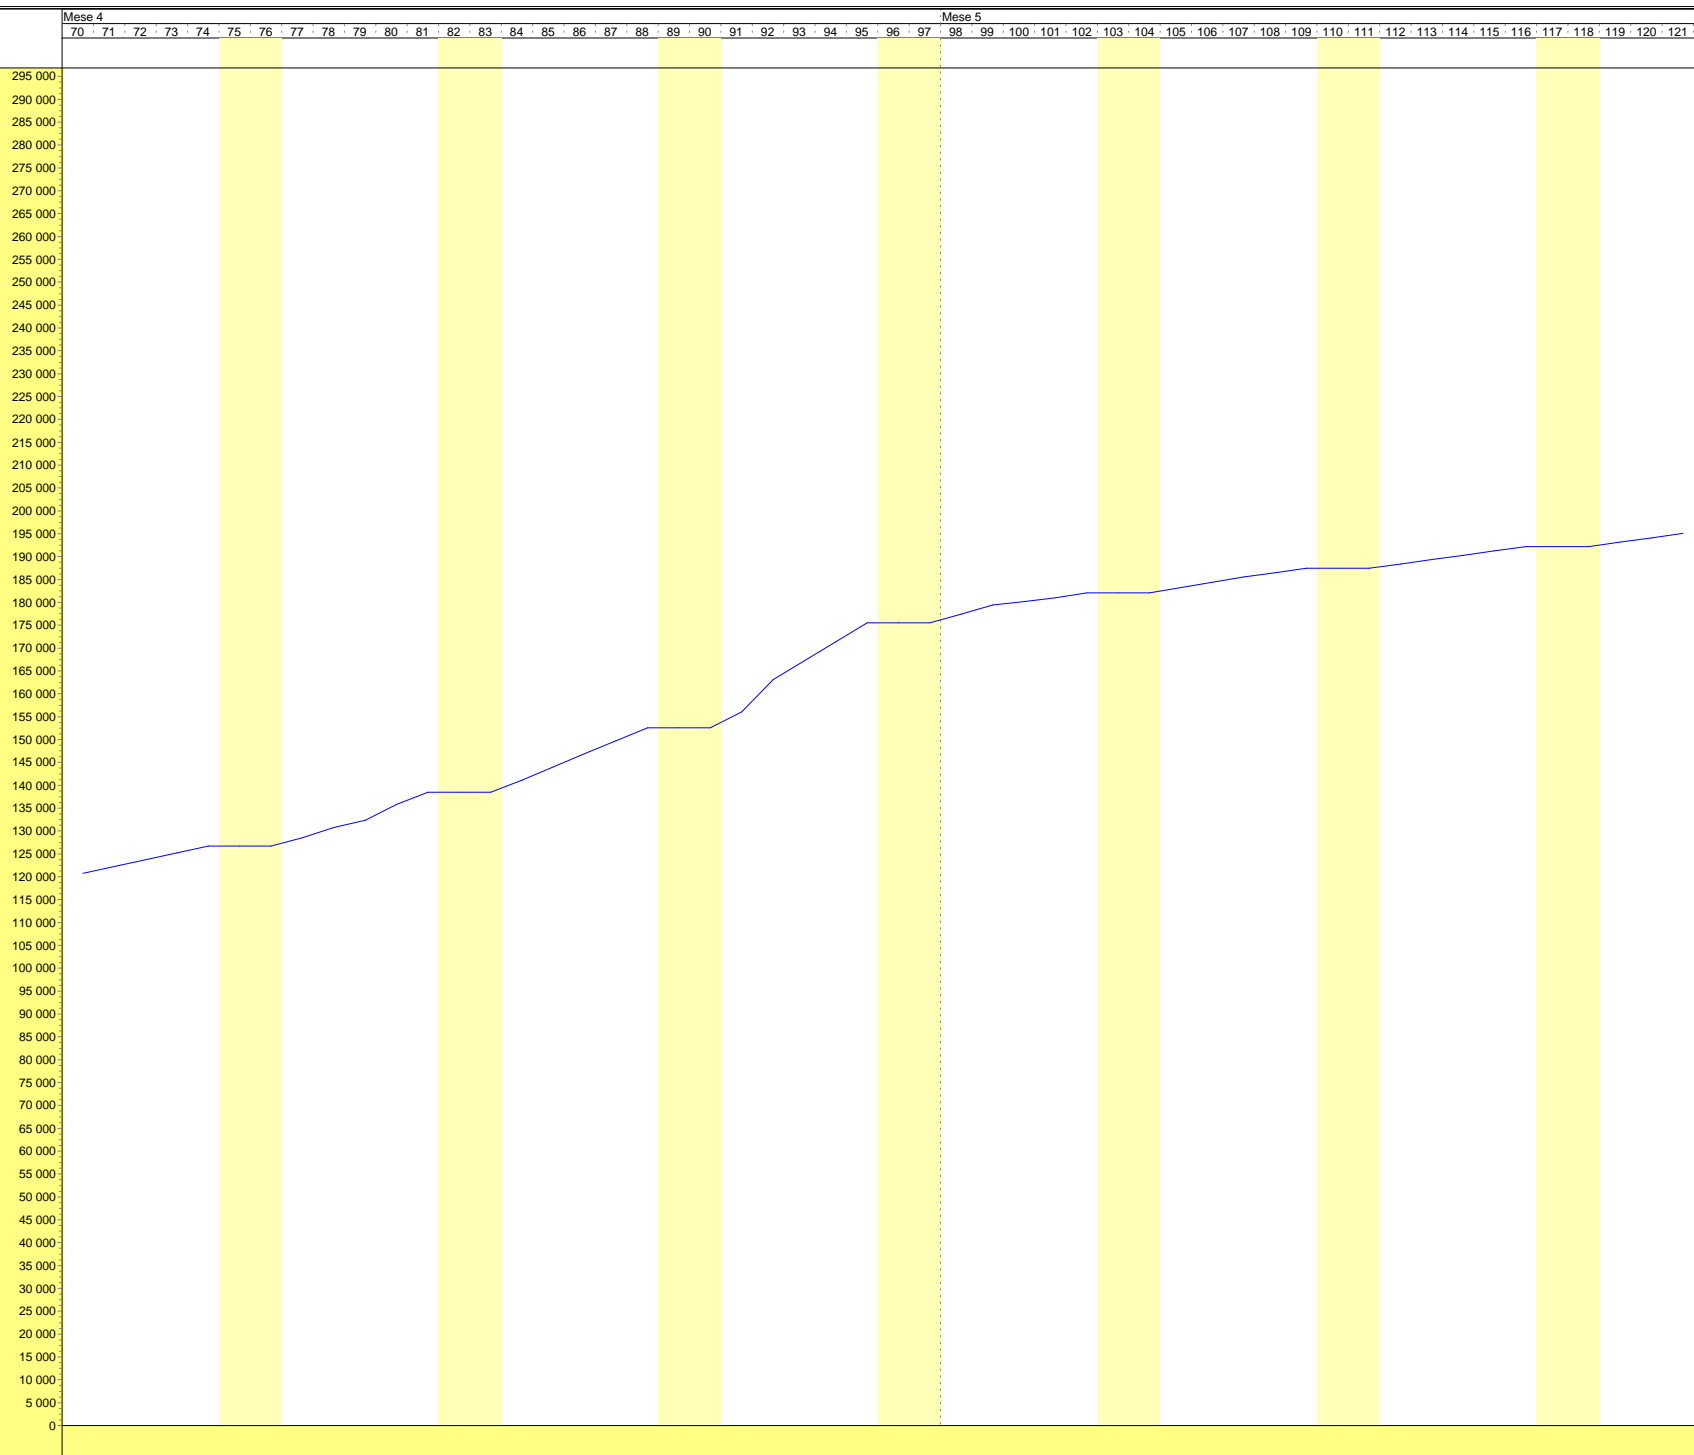

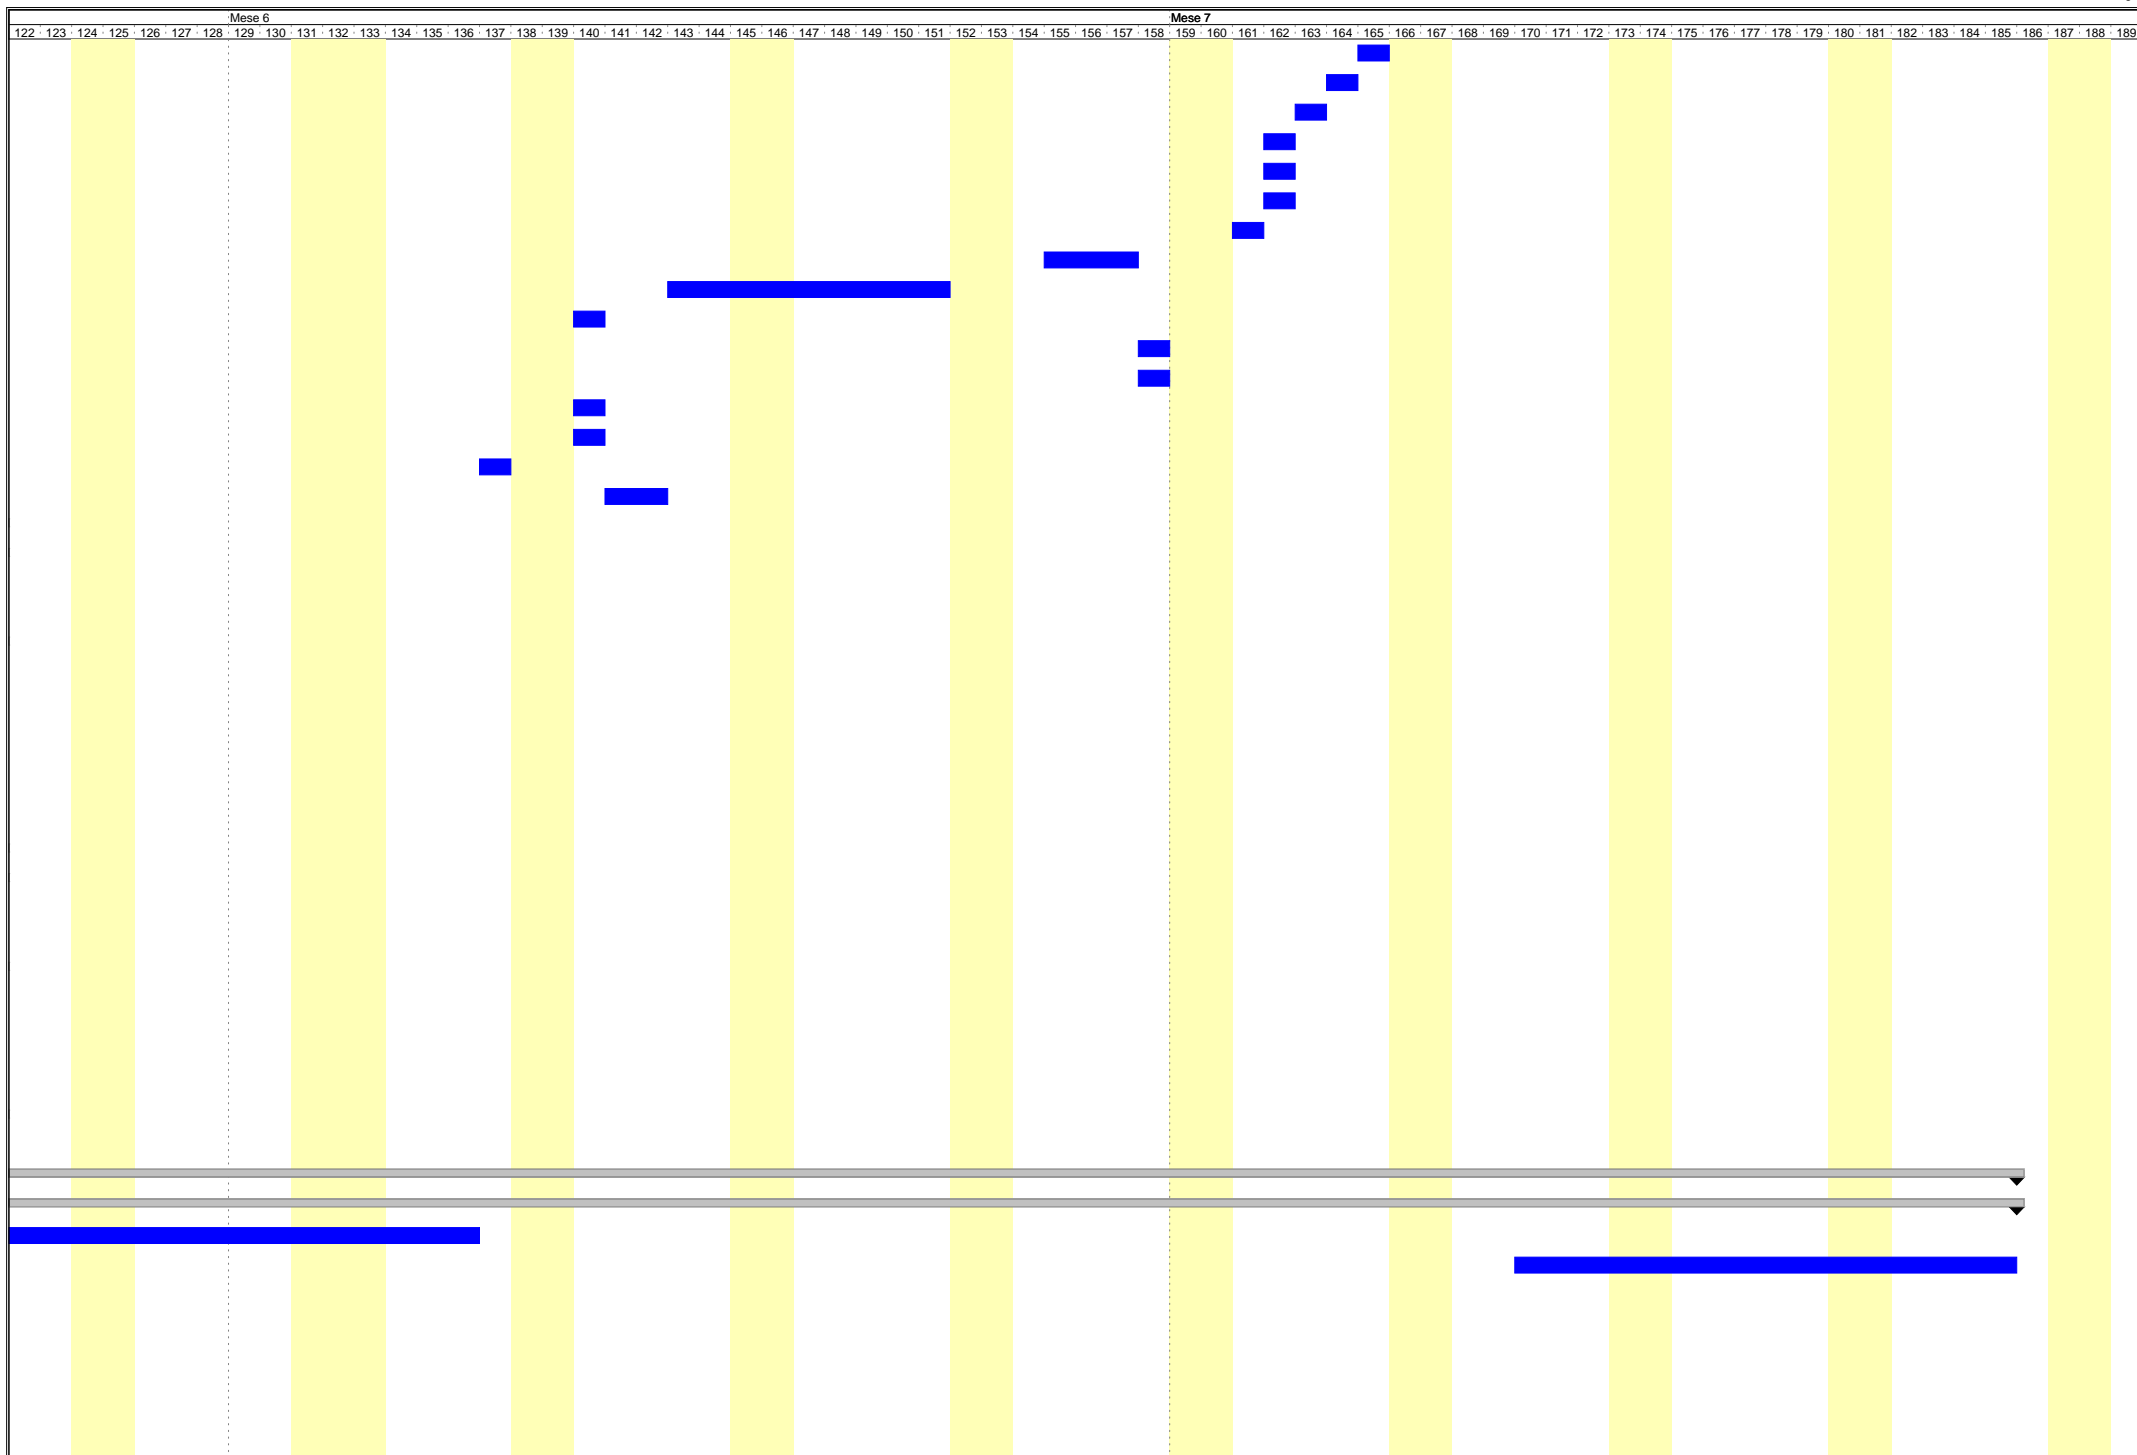

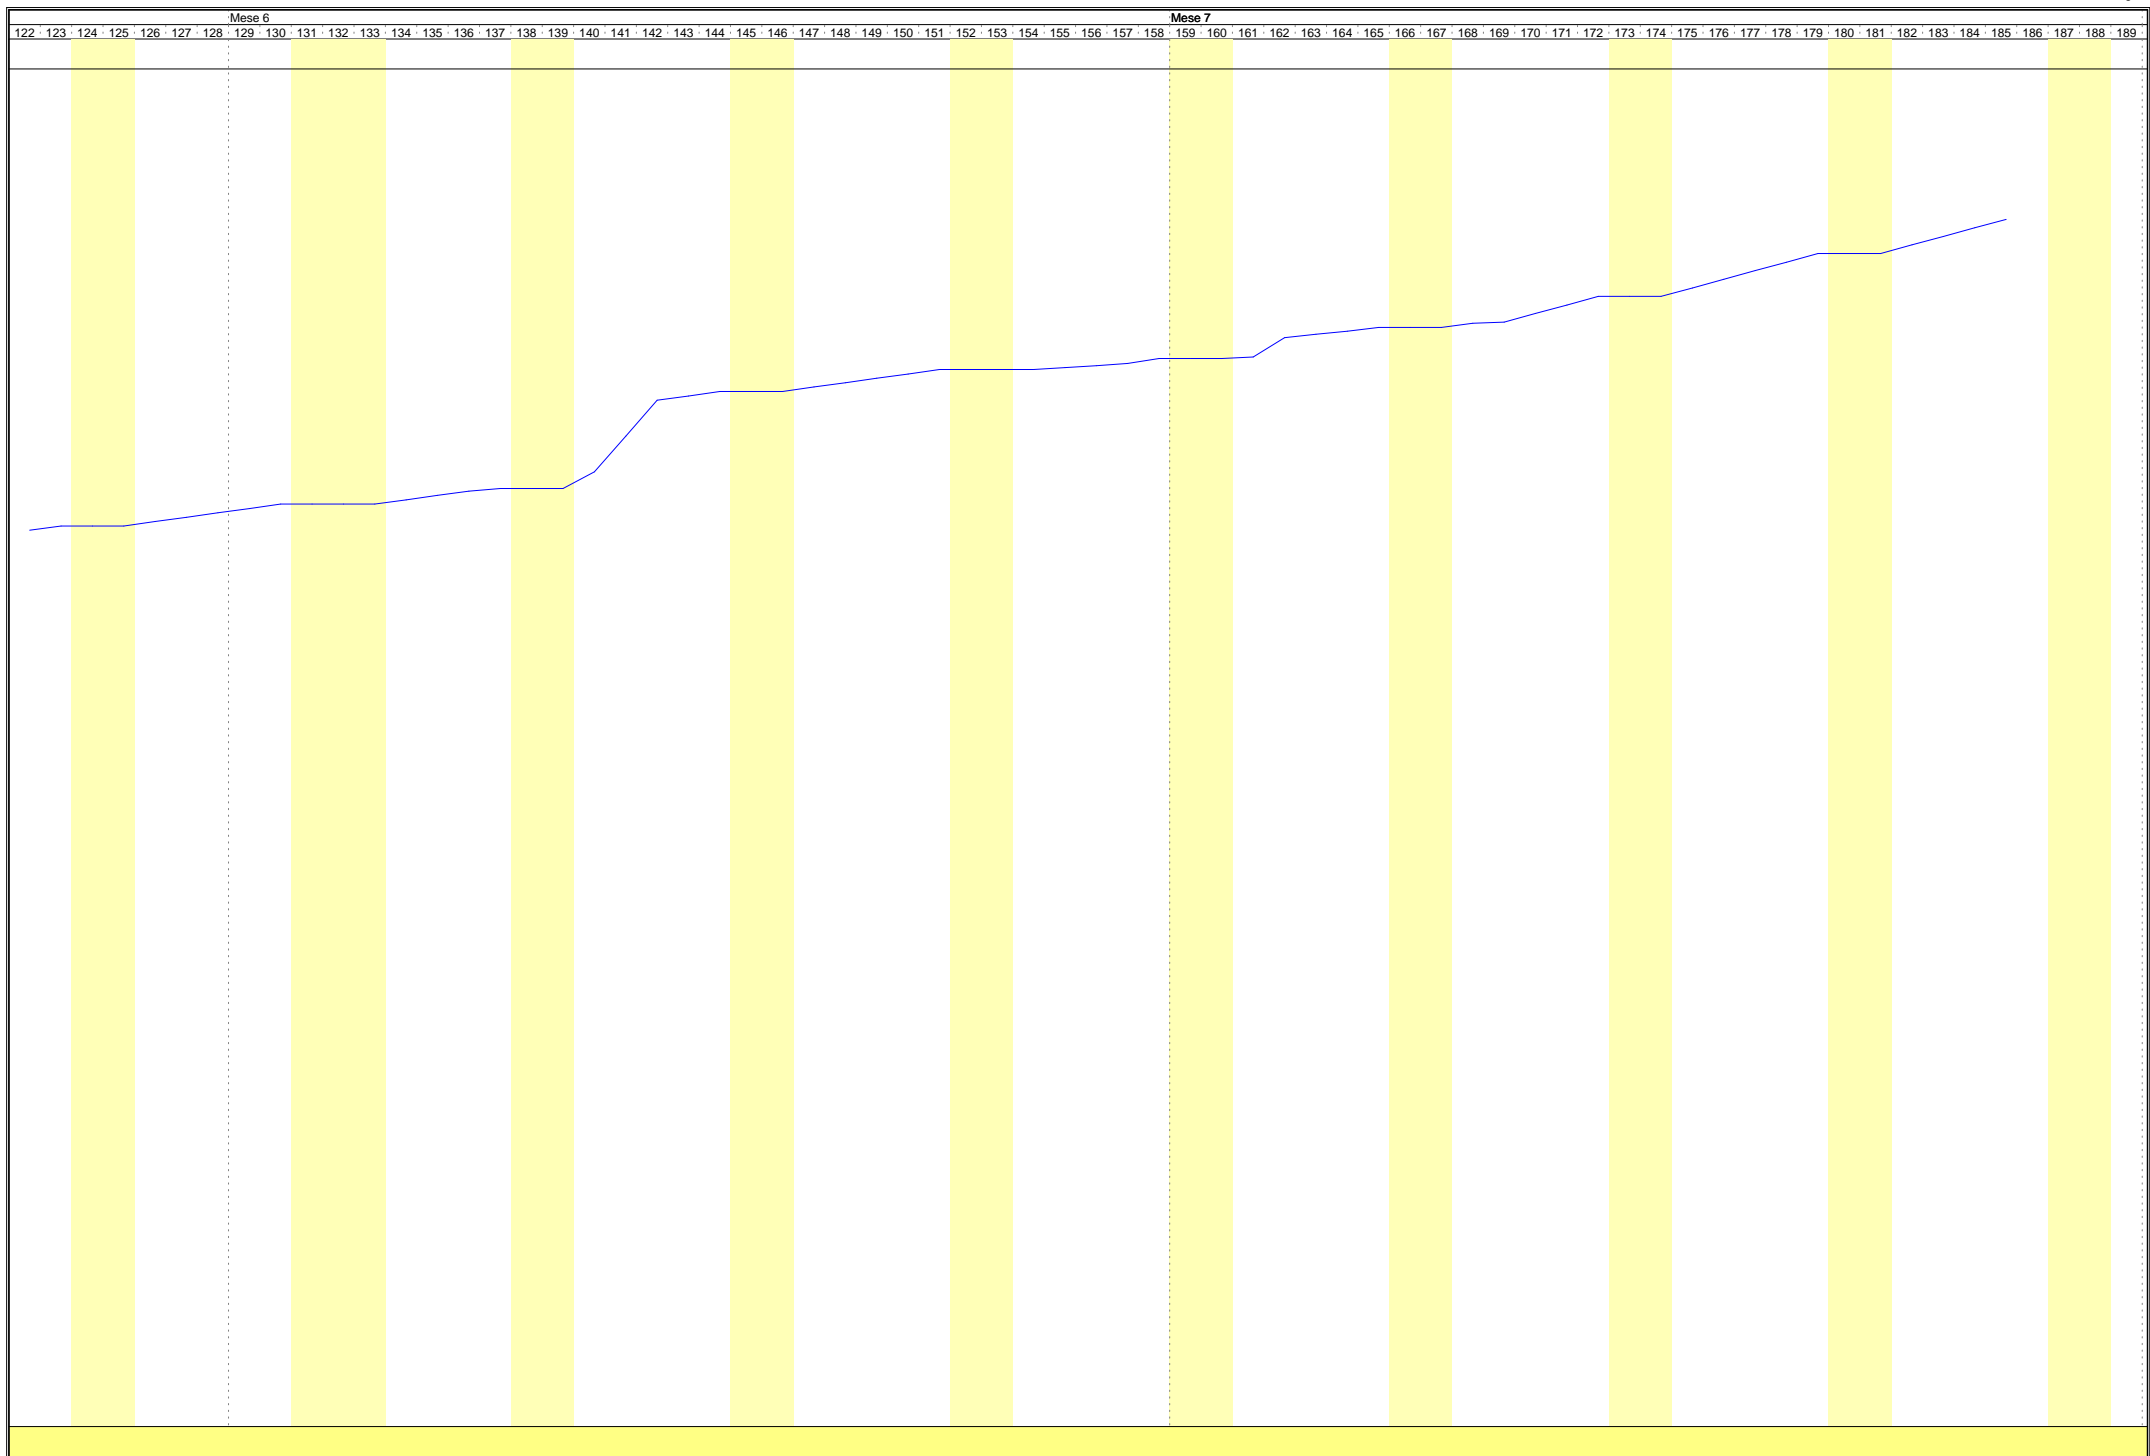

COMUNE DI CORLEONE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

	<h1>Tabella Attività</h1>

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Lavori a MISURA	222'495,03	84,279	1 gg	169 gg	116	169
* ILLUMINAZIONE STRADALE	25'743,39	9,751	1 gg	74 gg	50	74
* * ILLUMINAZIONE STRADALE	25'743,39	9,751	1 gg	74 gg	50	74
* * * MOVIMENTO TERRA	661,04	0,250	1 gg	2 gg	2	2
* * * * Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	378,84	0,144	1 gg	1 gg	1	1
* * * * Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli a ... meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato	282,20	0,107	2 gg	2 gg	1	1
* * * OPERE DI FONDAZIONE	12'041,63	4,561	38 gg	60 gg	15	23
* * * * Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fonda ... PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	1'192,80	0,452	38 gg	38 gg	1	1
* * * * Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in g ... a a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)	817,74	0,310	42 gg	42 gg	1	1
* * * * Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato ce ... leta a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm	1'612,24	0,611	43 gg	45 gg	2	3
* * * * Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di ... ta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=90mm	2'687,45	1,018	46 gg	51 gg	4	6
* * * * Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²	2'878,76	1,090	52 gg	56 gg	3	5
* * * * Esecuzione di giunzione derivata, grado di pro ... egola d'arte. per cavo principale di sezione fino a 16 mm²	1'504,44	0,570	57 gg	57 gg	1	1
* * * * Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profil ... 00 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m	1'272,60	0,482	58 gg	59 gg	2	2
* * * * Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di cor ... do, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm²	75,60	0,029	60 gg	60 gg	1	1
* * * OPERE DI ELEVAZIONE	13'040,72	4,940	63 gg	74 gg	10	12
* * * * Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 2x2,5mm²	372,96	0,141	63 gg	63 gg	1	1
* * * * Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... base in mm D = 127 mm; d = 65 mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,80 m	8'021,72	3,039	64 gg	65 gg	2	2
* * * * Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predispos ... lopedonale e di categoria di intensità luminosa minima G3.	4'646,04	1,760	66 gg	74 gg	7	9
* IMPIANTO ELETTRICO	31'308,30	11,859	77 gg	95 gg	15	19

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
** IMPIANTO ELETTRICO	31'308,30	11,859	77 gg	95 gg	15	19
*** Fornitura e posa in opera di centralino da parete in mate ... in opera. centralino da parete IP55 con portella 36 moduli	113,30	0,043	77 gg	77 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... e fino a morsettiera. interr.non automatico - 4P - da 80 A	61,00	0,023	77 gg	77 gg	1	1
*** Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... erfetta regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED	66,60	0,025	77 gg	77 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... n=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A	70,70	0,027	77 gg	77 gg	1	1
*** Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula	186,90	0,071	78 gg	78 gg	1	1
*** Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... egola d'arte. contattore modulare 2P 25 A (categoria AC7a)	45,90	0,017	78 gg	78 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori]. lcn=4,5 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A	94,60	0,036	78 gg	78 gg	1	1
*** Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x50mm²	19'180,00	7,265	80 gg	95 gg	12	16
*** Fornitura e posa in opera di centralino da parete in mate ... in opera. centralino da parete IP55 con portella 72 moduli	284,60	0,108	78 gg	78 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di ... a regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm	2'275,00	0,862	77 gg	79 gg	3	3
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... o a morsettiera. interr.non automatico - 4P - da 40 a 63 A	61,60	0,023	80 gg	80 gg	1	1
*** Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato ... fetta regola d'arte. spia di segnalazione D=22mm da quadro	51,00	0,019	80 gg	80 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... valori superiori]. lcn=4,5 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A	446,40	0,169	80 gg	80 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da acc ... gamenti elettrici. blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA	531,60	0,201	80 gg	80 gg	1	1
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... lori superiori]. lcn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	435,60	0,165	81 gg	84 gg	2	4
*** Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico ... n=4,5 kA curva C - In = 0,30A Tipo AC- 1P+N - da 6 a 32 A	282,80	0,107	91 gg	91 gg	1	1
*** Derivazione per punto luce semplice, interrotto o ... , la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17	933,40	0,354	85 gg	86 gg	2	2
*** Fornitura e posa in opera di punto di comando pe ... e. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer	569,80	0,216	91 gg	91 gg	1	1
*** Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofa ... d ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm²	838,40	0,318	87 gg	88 gg	2	2
*** Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... a quella del cavo principale presa 2P+t 10/16A - 1 modulo	169,60	0,064	91 gg	91 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie ... essere almeno IP44. Meno restrittiva diametro esterno 25mm	610,00	0,231	92 gg	92 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da in ... so da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico - Flusso	2'465,60	0,934	92 gg	92 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LE ... sospensione. Flusso luminoso da 5600 a 5800 lumen.	1'533,90	0,581	92 gg	92 gg	1	1
* IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO	36'942,65	13,994	137 gg	169 gg	23	33
* * IMPIANTO IDRICO E DI SCARICO	36'942,65	13,994	137 gg	169 gg	23	33
* * * Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	217,22	0,082	169 gg	169 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	956,31	0,362	168 gg	168 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès por ... nte a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm	779,58	0,295	165 gg	165 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrifica ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	729,36	0,276	164 gg	164 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	736,29	0,279	163 gg	163 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monobloc ... re per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.	1'615,40	0,612	162 gg	162 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	1'836,12	0,696	162 gg	162 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza riba ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	775,14	0,294	162 gg	162 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto ... o d'acqua. con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm	301,74	0,114	161 gg	161 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di punto di scarico e ve ... la norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere	1'321,20	0,500	155 gg	157 gg	3	3
* * * Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN ... ta regola d'arte. per tubi correnti in vista o in cunicolo	6'692,56	2,535	143 gg	151 gg	7	9
* * * Fornitura e collocazione di contatore per acqua a ... ca in ottone Ot 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.	43,65	0,017	140 gg	140 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi ... ompleta ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 10 cm	693,60	0,263	158 gg	158 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di pozzetto per pluv ... e l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	413,28	0,157	158 gg	158 gg	1	1
* * * Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione pe ... nzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.	2'559,43	0,969	140 gg	140 gg	1	1

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina pe ... primario a t=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar	1'062,33	0,402	140 gg	140 gg	1	1
* * * Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietil ... d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza di 500 l	531,28	0,201	137 gg	137 gg	1	1
* * * Fornitura, posa in opera e collaudo di impianto di sollev ... mensione nominale connessione 80 e prevalenza da 4 a 6,5 m	15'678,16	5,939	141 gg	142 gg	2	2
* MOVIMENTO TERRA	19'893,20	7,535	3 gg	35 gg	21	33
* * OPERE PREPARATORIE	19'893,20	7,535	3 gg	35 gg	21	33
* * * Pulizia del versante roccioso da arbusti ed erbe infestan ... mprende l'accatastamento in sito dei materiali di risulta.	5'640,00	2,136	9 gg	35 gg	17	27
* * * Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW	14'253,20	5,399	3 gg	8 gg	4	6
* OPERE STRADALI	42'396,55	16,059	9 gg	28 gg	13	20
* * Compattazione del fondo degli scavi, quando questi ... rico dell'impresa. - per ogni m² di superficie compattata	1'574,63	0,596	9 gg	10 gg	2	2
* * Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polip ... monti per sovrapposizioni. - per m² di superficie coperta	5'261,10	1,993	11 gg	17 gg	4	7
* * Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stra ... iuto a regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato	17'187,32	6,510	18 gg	21 gg	2	4
* * Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per ... escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.	4'328,06	1,639	22 gg	23 gg	2	2
* * Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idone ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	3'051,84	1,156	24 gg	25 gg	2	2
* * Fornitura, trasporto e posa in opera di condotte ... -sanitarie vigenti del Ministero della Salute. DN mm. 1100	10'993,60	4,164	28 gg	28 gg	1	1
* OPERE EDILI	30'007,34	11,367	29 gg	107 gg	54	79
* * OPERE IN FONDAZIONE	16'428,19	6,223	29 gg	37 gg	6	9
* * * Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... armatura. per opere in fondazione lavori edili con C 20/25	9'108,89	3,450	36 gg	37 gg	2	2
* * * Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettros ... ove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.	7'319,30	2,772	29 gg	35 gg	4	7
* * OPERE IN ELEVAZIONE	13'579,15	5,144	93 gg	107 gg	11	15
* * * Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezion ... nelle murature e la successiva suggellatura degli stessi.	5'212,32	1,974	93 gg	95 gg	3	3
* * * Fornitura e posa in opere di opere in acciaio INOX tipo A ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	2'207,92	0,836	98 gg	99 gg	2	2

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* * * Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo ... presi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.	1'570,27	0,595	100 gg	101 gg	2	2
* * * Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in ... onere e magistero. - per ogni m² di superficie effettiva	4'588,64	1,738	102 gg	107 gg	4	6
* FORNITURE	36'203,60	13,714	36 gg	99 gg	44	64
* * Fornitura e posa in opera di telo sintetico per raccolta ... rapposizione di due teli contigui, distanziati ogni 10 cm.	36'203,60	13,714	36 gg	99 gg	44	64
Lavori a CORPO	41'502,65	15,721	108 gg	185 gg	55	78
* FORNITURE	41'502,65	15,721	108 gg	185 gg	55	78
* * Fornitura e posa in opera di elementi modulari prefabbric ... le onduvilla rosse o verdi, kit grondaia in pvc o lamiera.	18'997,36	7,196	108 gg	136 gg	20	29
* * Fornitura e posa in opera di macchine lanciapiattelli per ... l sequeziatore di programma e la fornitura dei piattelli.	22'505,29	8,525	170 gg	185 gg	12	16
Data, 24/11/2020						
Tecnico						

COMUNE DI CORLEONE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Tabella Date e Importi

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	378,84	378,84	0,144
2 gg	282,20	661,04	0,250
3 gg	3'563,30	4'224,34	1,600
4 gg	3'563,30	7'787,64	2,950
7 gg	3'563,30	11'350,94	4,300
8 gg	3'563,30	14'914,24	5,649
9 gg	1'119,08	16'033,32	6,073
10 gg	1'119,07	17'152,39	6,497
11 gg	1'647,04	18'799,43	7,121
14 gg	1'647,04	20'446,47	7,745
16 gg	1'647,04	22'093,51	8,369
17 gg	1'647,04	23'740,56	8,993
18 gg	8'925,42	32'665,98	12,374
21 gg	8'925,42	41'591,40	15,754
22 gg	2'495,80	44'087,20	16,700
23 gg	2'495,79	46'583,00	17,645
24 gg	1'857,68	48'440,68	18,349
25 gg	1'857,68	50'298,36	19,053
28 gg	11'325,36	61'623,73	23,343
29 gg	2'161,59	63'785,32	24,161
30 gg	2'161,59	65'946,91	24,980
31 gg	2'161,59	68'108,50	25,799
35 gg	2'161,59	70'270,09	26,618
36 gg	5'377,25	75'647,34	28,655
37 gg	5'377,26	81'024,60	30,691
38 gg	2'015,61	83'040,21	31,455
42 gg	1'640,55	84'680,76	32,076
43 gg	1'628,93	86'309,69	32,693
45 gg	1'628,93	87'938,62	33,310
46 gg	1'494,67	89'433,29	33,877
49 gg	1'494,67	90'927,96	34,443
50 gg	1'494,67	92'422,63	35,009
51 gg	1'494,67	93'917,30	35,575
52 gg	1'782,40	95'699,70	36,250
53 gg	1'782,40	97'482,09	36,925
56 gg	1'782,40	99'264,49	37,601
57 gg	2'327,25	101'591,74	38,482
58 gg	1'459,11	103'050,85	39,035
59 gg	1'459,11	104'509,96	39,587
60 gg	898,41	105'408,37	39,928

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
63 gg	1'195,77	106'604,14	40,381
64 gg	4'833,67	111'437,81	42,212
65 gg	4'833,67	116'271,48	44,043
66 gg	1'486,53	117'758,01	44,606
67 gg	1'486,53	119'244,53	45,169
70 gg	1'486,53	120'731,06	45,732
71 gg	1'486,53	122'217,59	46,295
72 gg	1'486,53	123'704,12	46,858
73 gg	1'486,53	125'190,65	47,421
74 gg	1'486,53	126'677,18	47,984
77 gg	1'892,74	128'569,92	48,701
78 gg	2'193,14	130'763,06	49,532
79 gg	1'581,14	132'344,20	50,131
80 gg	3'511,74	135'855,95	51,461
81 gg	2'638,94	138'494,89	52,461
84 gg	2'638,94	141'133,83	53,460
85 gg	2'887,84	144'021,67	54,554
86 gg	2'887,84	146'909,52	55,648
87 gg	2'840,34	149'749,86	56,724
88 gg	2'840,34	152'590,20	57,800
91 gg	3'443,34	156'033,54	59,104
92 gg	7'030,64	163'064,19	61,767
93 gg	4'158,58	167'222,77	63,343
94 gg	4'158,58	171'381,35	64,918
95 gg	4'158,58	175'539,93	66,493
98 gg	1'926,77	177'466,70	67,223
99 gg	1'926,77	179'393,47	67,953
100 gg	785,13	180'178,60	68,250
101 gg	785,13	180'963,73	68,547
102 gg	1'147,16	182'110,89	68,982
105 gg	1'147,16	183'258,05	69,417
106 gg	1'147,16	184'405,21	69,851
107 gg	1'147,16	185'552,37	70,286
108 gg	949,87	186'502,24	70,645
109 gg	949,87	187'452,11	71,005
112 gg	949,87	188'401,97	71,365
113 gg	949,87	189'351,84	71,725
114 gg	949,87	190'301,71	72,085
115 gg	949,87	191'251,58	72,444
116 gg	949,87	192'201,45	72,804

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
119 gg	949,87	193'151,31	73,164
120 gg	949,87	194'101,18	73,524
121 gg	949,87	195'051,05	73,884
122 gg	949,87	196'000,92	74,243
123 gg	949,87	196'950,79	74,603
126 gg	949,87	197'900,65	74,963
127 gg	949,87	198'850,52	75,323
128 gg	949,87	199'800,39	75,683
129 gg	949,87	200'750,26	76,042
130 gg	949,87	201'700,13	76,402
134 gg	949,87	202'649,99	76,762
135 gg	949,87	203'599,86	77,122
136 gg	949,87	204'549,73	77,482
137 gg	531,28	205'081,01	77,683
140 gg	3'665,41	208'746,42	79,071
141 gg	7'839,08	216'585,50	82,041
142 gg	7'839,08	224'424,58	85,010
143 gg	956,08	225'380,66	85,372
144 gg	956,08	226'336,74	85,734
147 gg	956,08	227'292,82	86,097
148 gg	956,08	228'248,90	86,459
149 gg	956,08	229'204,98	86,821
150 gg	956,08	230'161,07	87,183
151 gg	956,08	231'117,15	87,545
155 gg	440,40	231'557,55	87,712
156 gg	440,40	231'997,95	87,879
157 gg	440,40	232'438,35	88,046
158 gg	1'106,88	233'545,23	88,465
161 gg	301,74	233'846,97	88,579
162 gg	4'226,66	238'073,63	90,180
163 gg	736,29	238'809,92	90,459
164 gg	729,36	239'539,28	90,735
165 gg	779,58	240'318,86	91,031
168 gg	956,31	241'275,17	91,393
169 gg	217,22	241'492,39	91,475
170 gg	1'875,44	243'367,83	92,186
171 gg	1'875,44	245'243,27	92,896
172 gg	1'875,44	247'118,71	93,606
175 gg	1'875,44	248'994,15	94,317
176 gg	1'875,44	250'869,59	95,027

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
177 gg	1'875,44	252'745,03	95,738
178 gg	1'875,44	254'620,47	96,448
179 gg	1'875,44	256'495,91	97,158
182 gg	1'875,44	258'371,35	97,869
183 gg	1'875,44	260'246,79	98,579
184 gg	1'875,44	262'122,23	99,290
185 gg	1'875,44	263'997,67	100,000
