



Isole Egadi
Comune di Favignana
Provincia Regionale di Trapani

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI FAVIGNANA



PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE

Ufficio di progettazione:

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche
Sicilia - Calabria
Ufficio 3 Tecnico e Opere Marittime per la Sicilia

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Salvatore Caruso

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Leonardo Tallo

Dott. Ing. Gianluca Marvuglia

Dott. Ing. Giuseppe Scorsone

Collaboratori:

Geom. Francesco Daidone

Geom. Mario Lanzo

IL DIRIGENTE:

Dott. Ing. Giovanni Coppola

Il Progettista delle strutture:

DUOMI S.r.l.














































































Ing. Guglielmo Migliorino

4	5 APRILE 2022	EMISSIONE REVISIONE 4			
3	20 SETTEMBRE 2021	EMISSIONE REVISIONE 3			
2	20 MAGGIO 2020	EMISSIONE REVISIONE 2			
1	11 DICEMBRE 2019	EMISSIONE REVISIONE 1			
0	21 MAGGIO 2019	EMISSIONE			
Rev.	Data	Descrizione	Eseguito	Controllato	Approvato


Titolo elaborato :

CRONOPROGRAMMA

DATA	DESCRIZIONE	N°/SIGLA	REV	SCALA
05/04/2022	EMISSIONE REVISIONE 4	P E - R 0 1 1	4	

LAVORI		Bimestre	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
		durata in mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi	2 mesi
1	Accantieramento	2														
2	Prefabbricazione cassoni e costruzione massi in cls	10														
3	Imbasamento e scogliere	8														
4	Posa in opera e riempimento cassoni	8														
5	Radice, scogliera - pali	6														
6	Sovrastuttura e pavimentazioni	8														
7	Impianti, arredi e opere di finitura	5														
8	Opera di compensazione 2	6														
9	Opera di compensazione 3	6														
10	Opera di compensazione 4	12														
11	Opera di compensazione 6	12														
12	Opera di compensazione 7	6														
13	Smobilitazione cantiere	1														

progressione bimestre	1°	€	387.649,56
	2°	€	387.649,56
	3°	€	387.649,56
	4°	€	266.326,24
	5°	€	429.792,00
	6°	€	1.526.814,44
	7°	€	1.478.182,06
	8°	€	4.110.104,11
	9°	€	4.785.365,65
	10°	€	5.042.048,36
	11°	€	2.506.010,08
	12°	€	2.888.058,65
	13°	€	2.212.797,11
	14°	€	490.004,73
		€	26.898.452,11

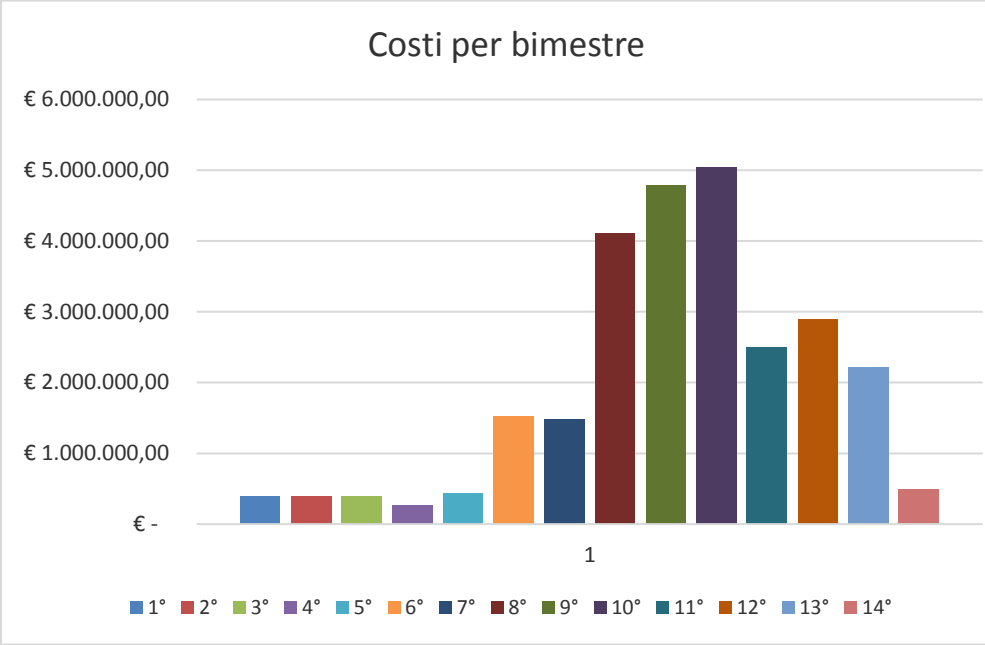

		AVANZAMENTO LAVORI		Costi per bimestre	
bimestre	1°	€	387.649,56	€	387.649,56
	2°	€	775.299,12	€	387.649,56
	3°	€	1.162.948,68	€	387.649,56
	4°	€	1.429.274,92	€	266.326,24
	5°	€	1.859.066,92	€	429.792,00
	6°	€	3.385.881,36	€	1.526.814,44
	7°	€	4.864.063,42	€	1.478.182,06
	8°	€	8.974.167,53	€	4.110.104,11
	9°	€	13.759.533,18	€	4.785.365,65
	10°	€	18.801.581,54	€	5.042.048,36
	11°	€	21.307.591,62	€	2.506.010,08
	12°	€	24.195.650,27	€	2.888.058,65
	13°	€	26.408.447,38	€	2.212.797,11
	14°	€	26.898.452,11	€	490.004,73
				€	26.898.452,11

