

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA**



Regione Siciliana

**Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico**

*Servizio 5 - Espletamento di servizi di ingegneria di competenza
regionale e/o per conto di enti locali
(per le Province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani)*

**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE SAN MAURO
CASTELVERDE - GANGI SP 52 ED SP 60**

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI €. **13.500.000,00**- CUP D97H21001660002

RIFERIMENTO ELABORATO

N. 30

DATA: 14/07/2021

SCALA:

CRONOPROGRAMMA

**I PROGETTISTI
p.p.v.**

F.to Arch. Vincenzo Viscardi

F.to Arch. Giuseppe Pedone

F.to Geom. Paolo Franzone

F.to Geom. Francesco Carollo

COLLABORATORI TECNICI

Arch. Fabiola Fucile

Ing. Piero Fabio

**COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
(Geom. Francesco Carollo)**

Visto: Il Dirigente
Servizio 5 -D.R.T
Ing. Giuseppe Pirrello

**IL SUPPORTO AL R.U.P.
F.to Fabrizio Pirrone**

**IL R.U.P.
F.to Ing. Giuseppe Pirrello**

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione del piano viario delle strade S.P.52 di S. Mauro Castelverde ed S.P.60 di Gangi, dall'innesto con la S.S.113 sino al bivio con la S.S.120


COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità


Palermo, 14/07/2021


Il Tecnico
(geom. Paolo Franzone)


S.P. n. 52 - 60 - S. Mauro C.de - Gangi (PA)
Interventi per il ripristino della viabilità

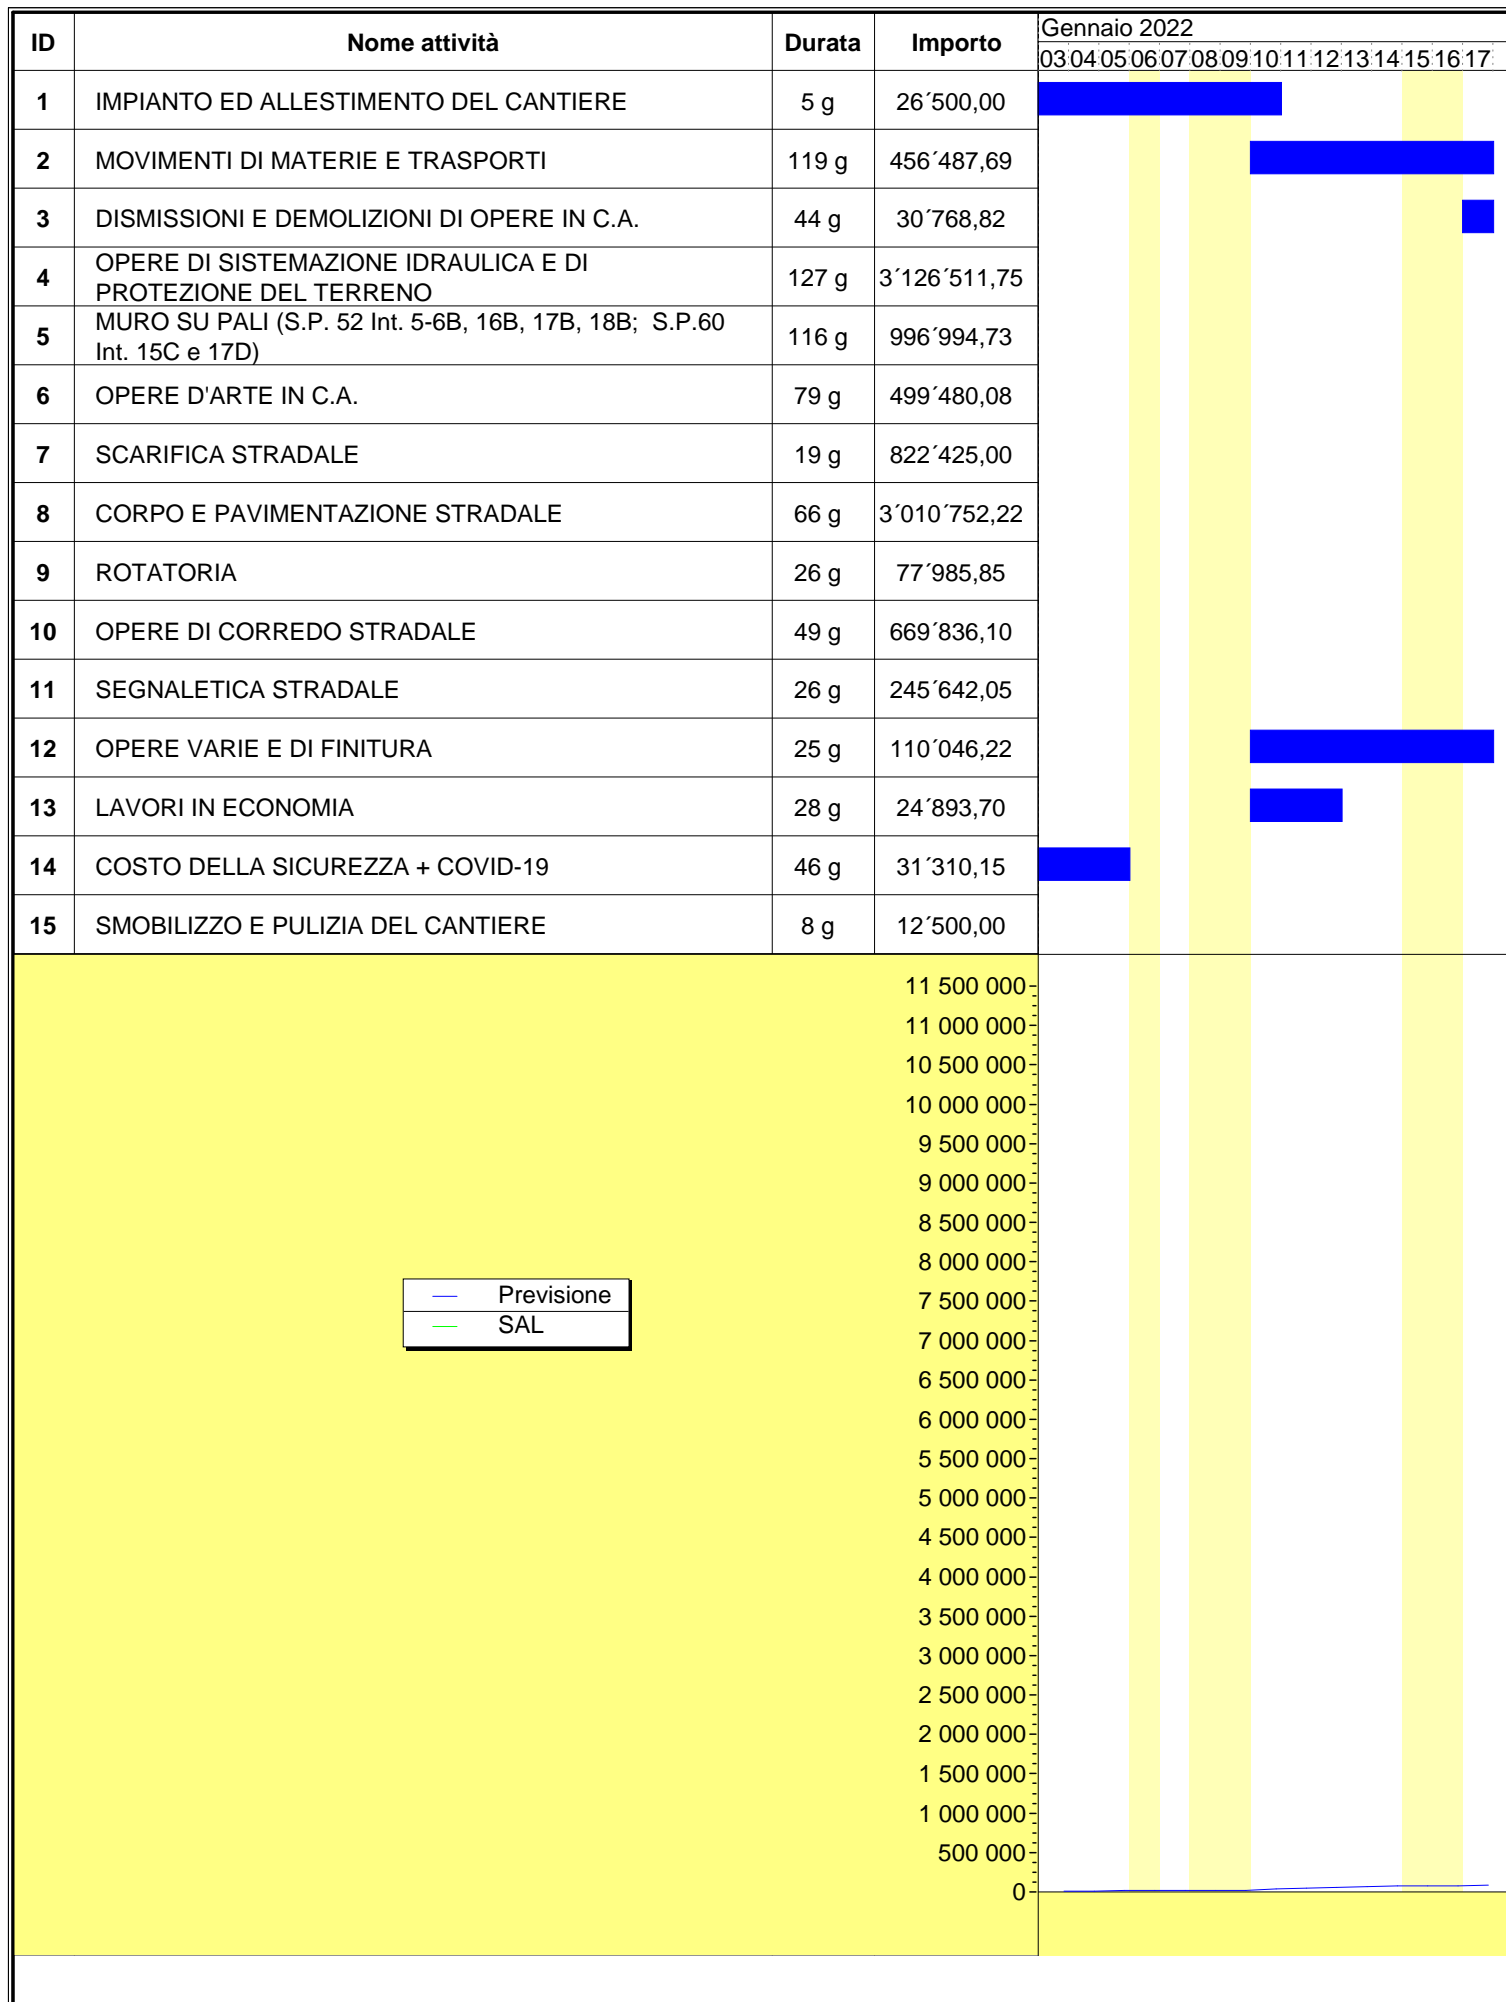


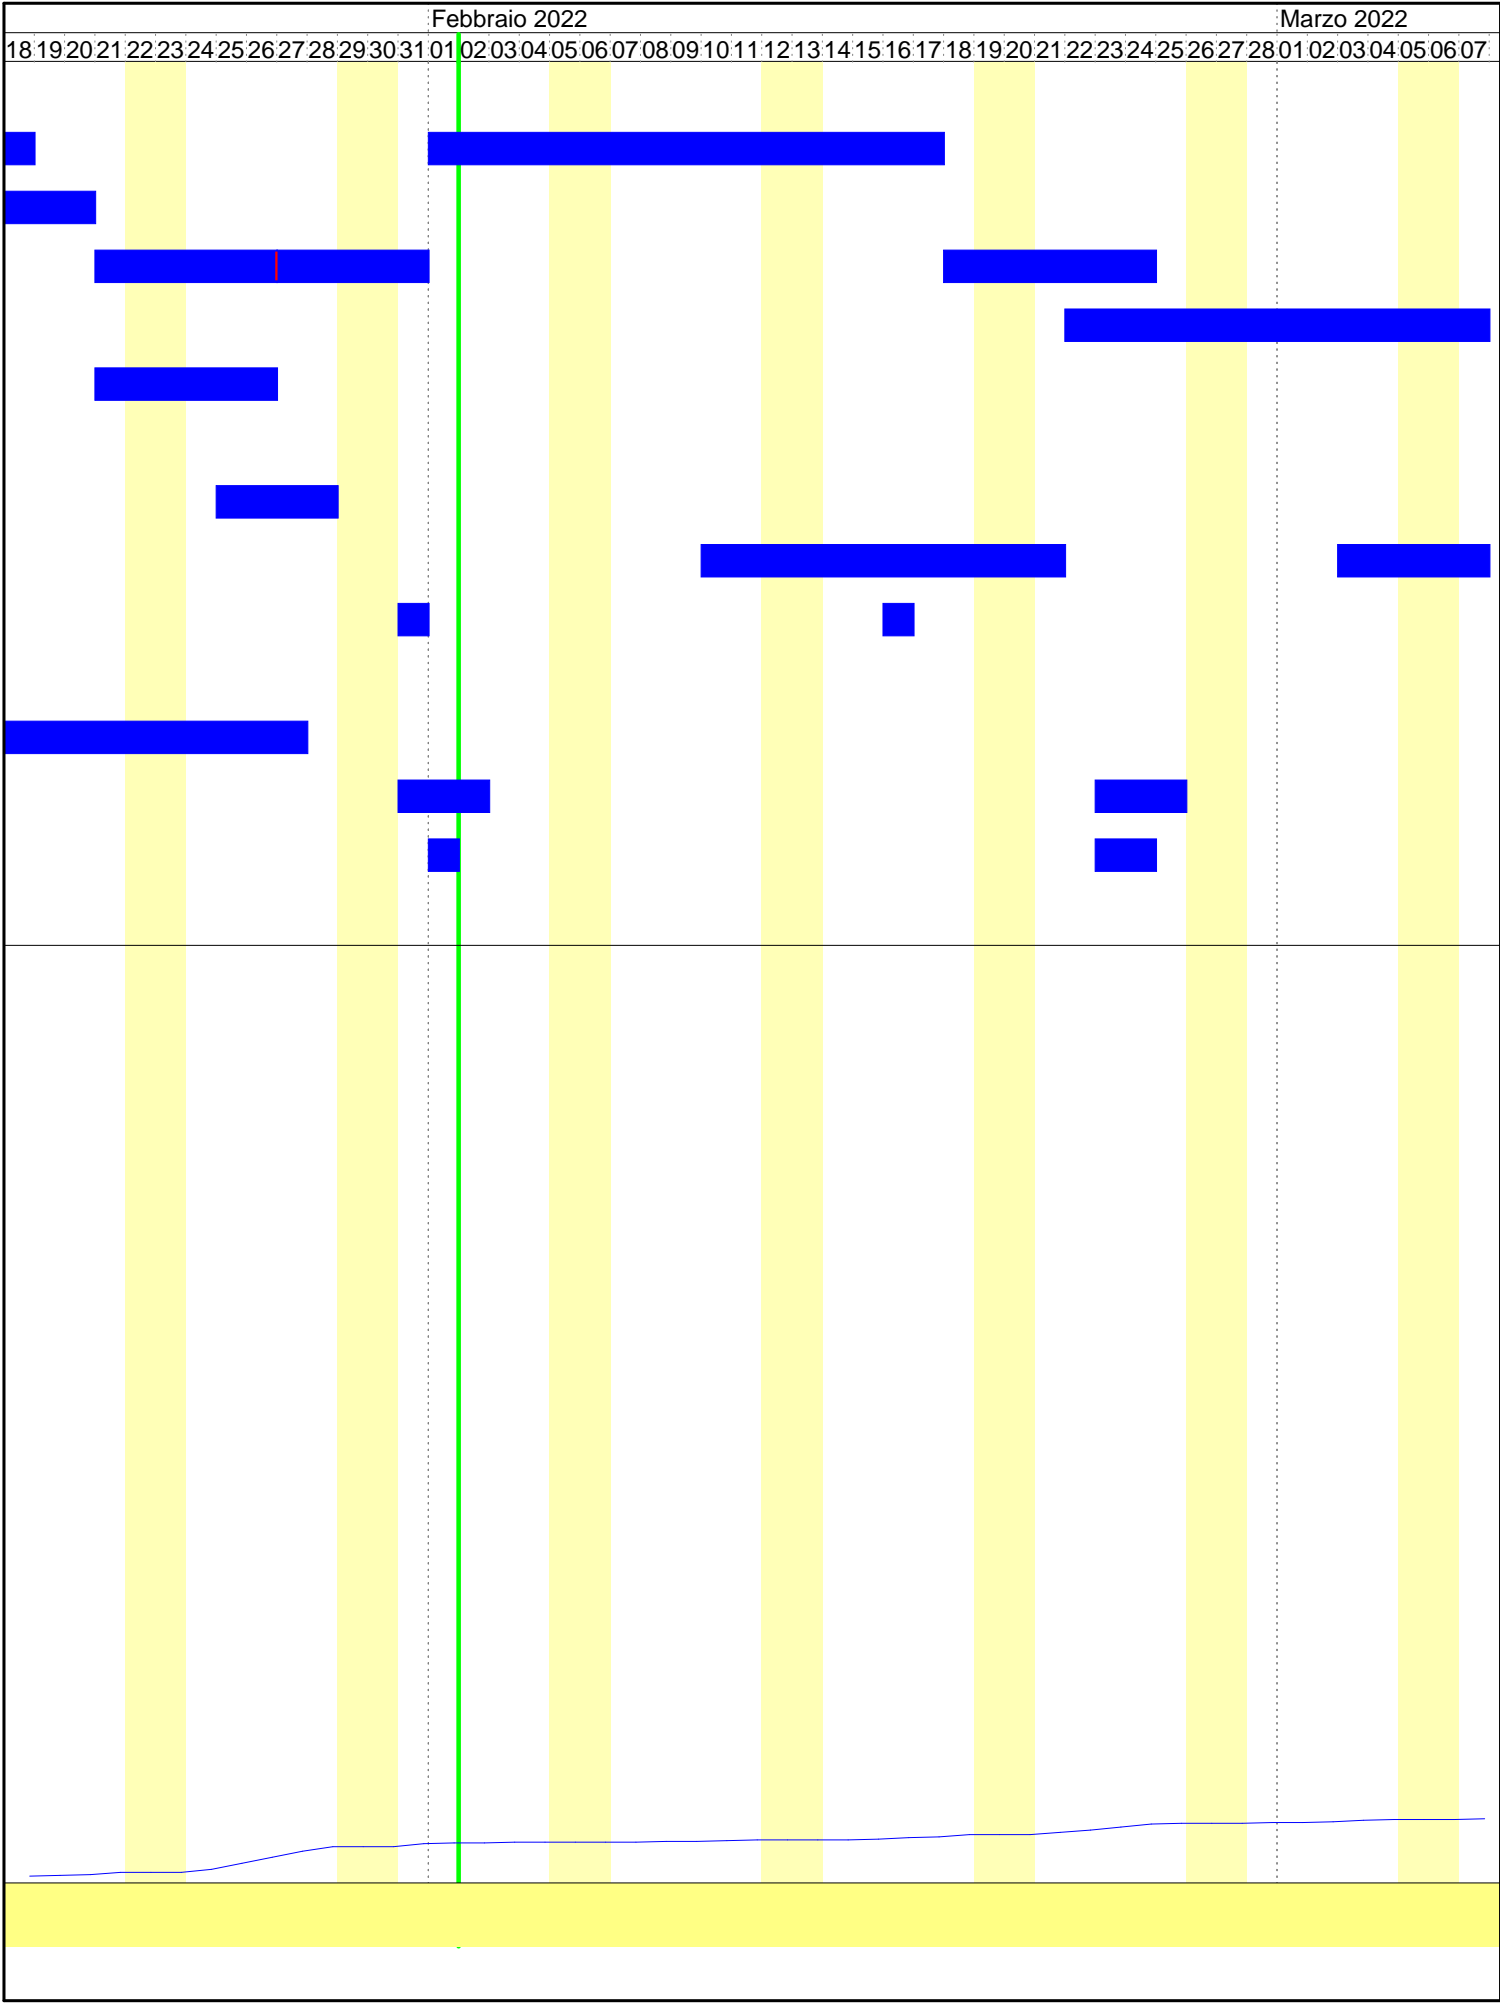


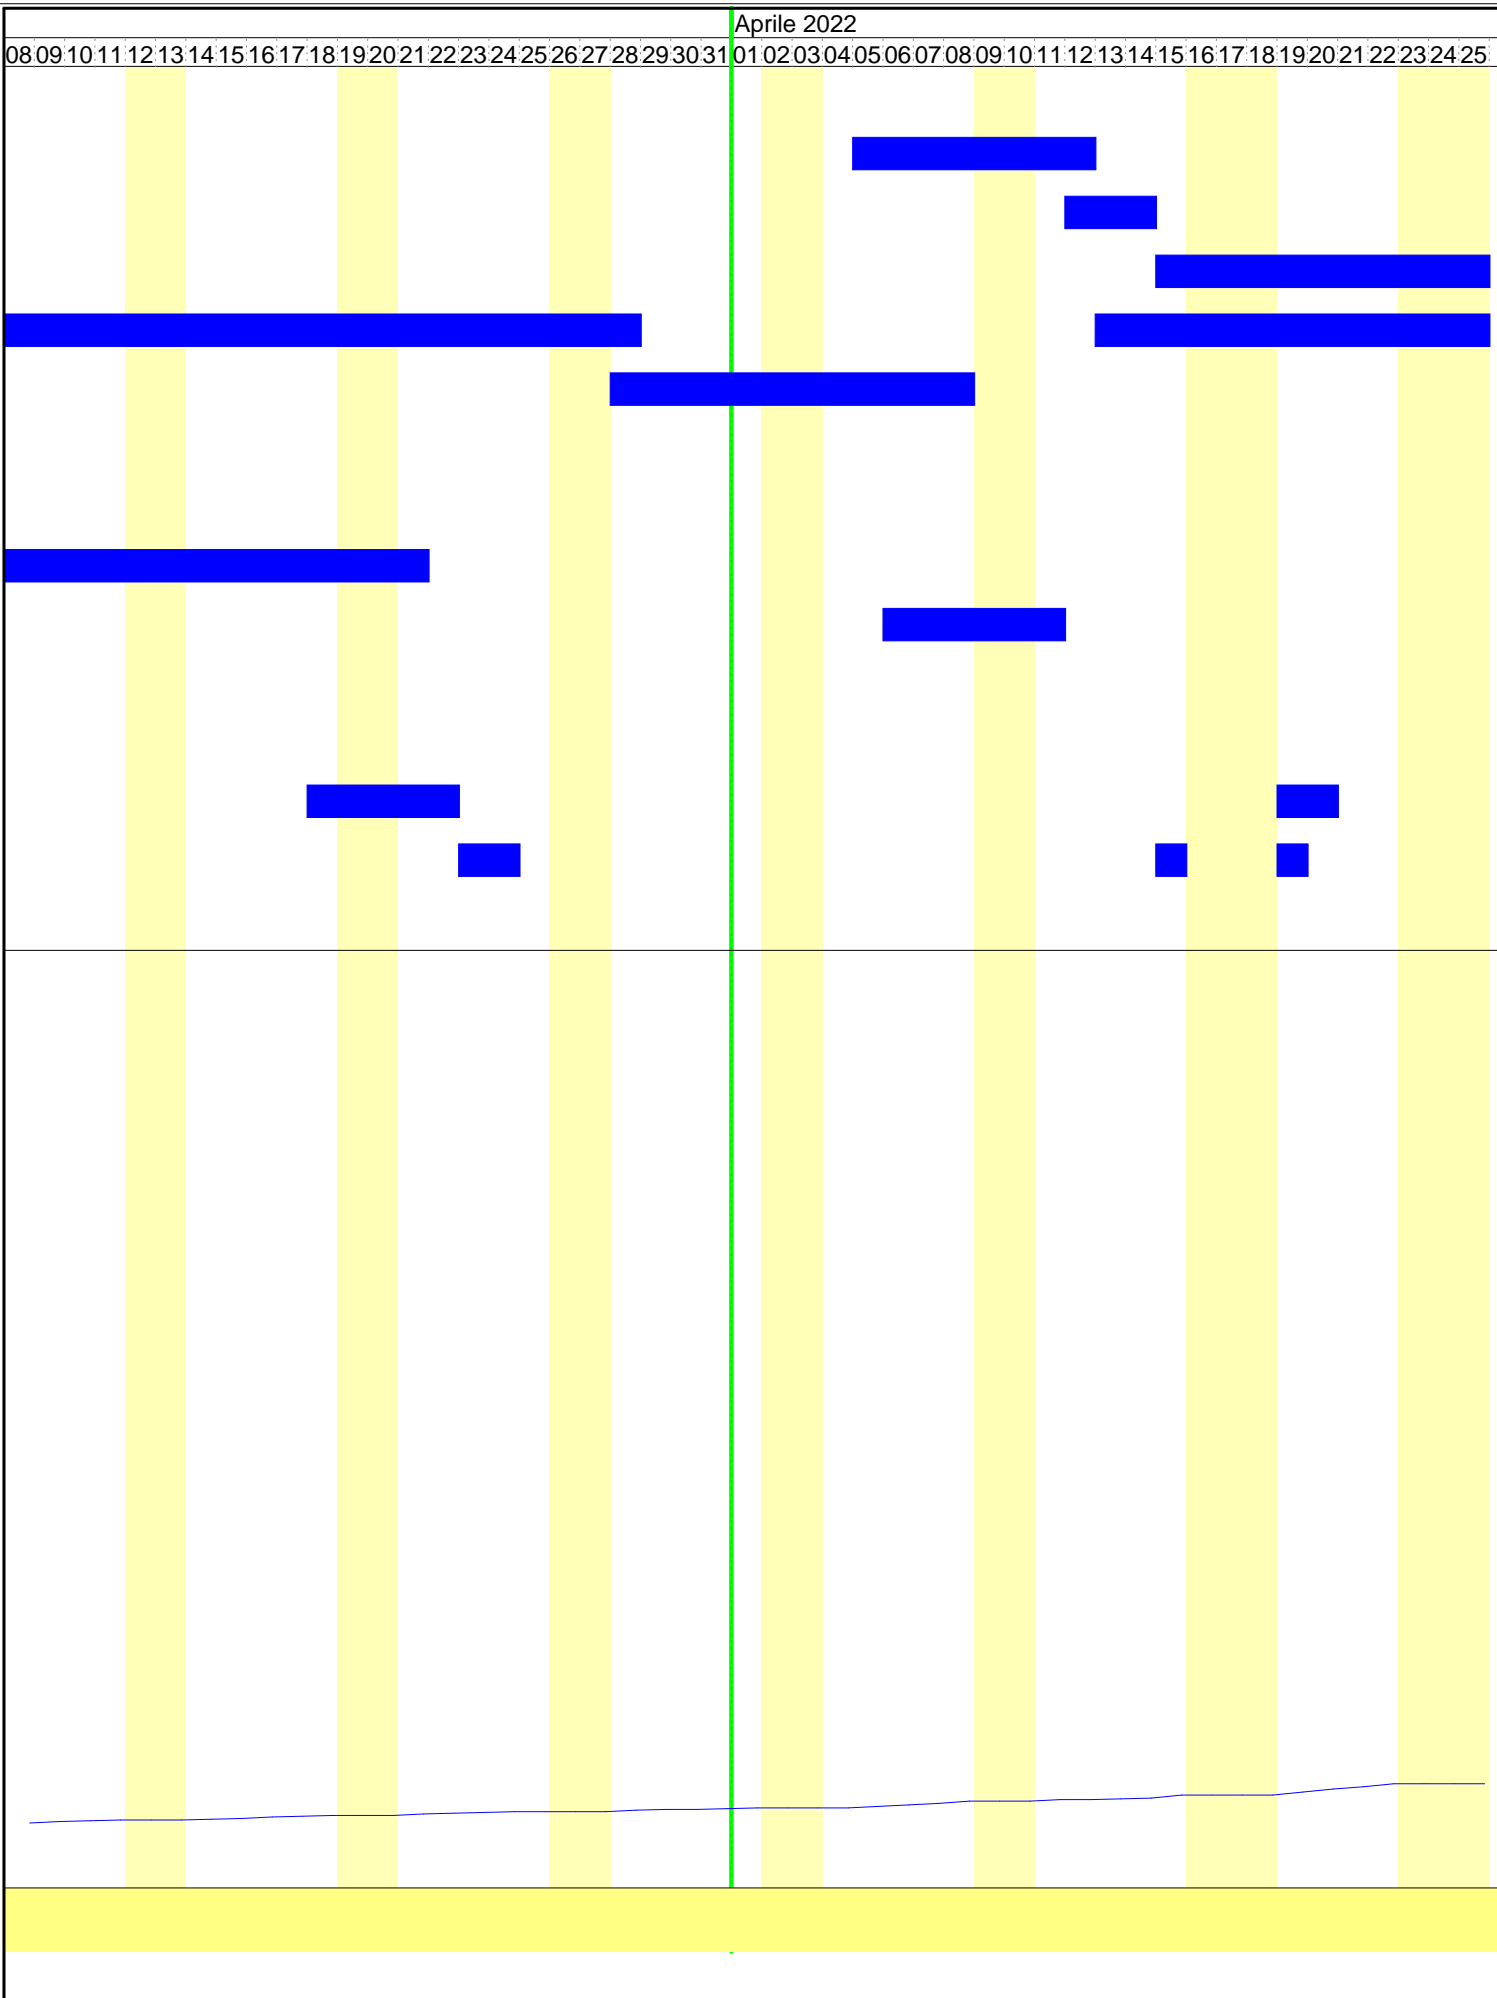


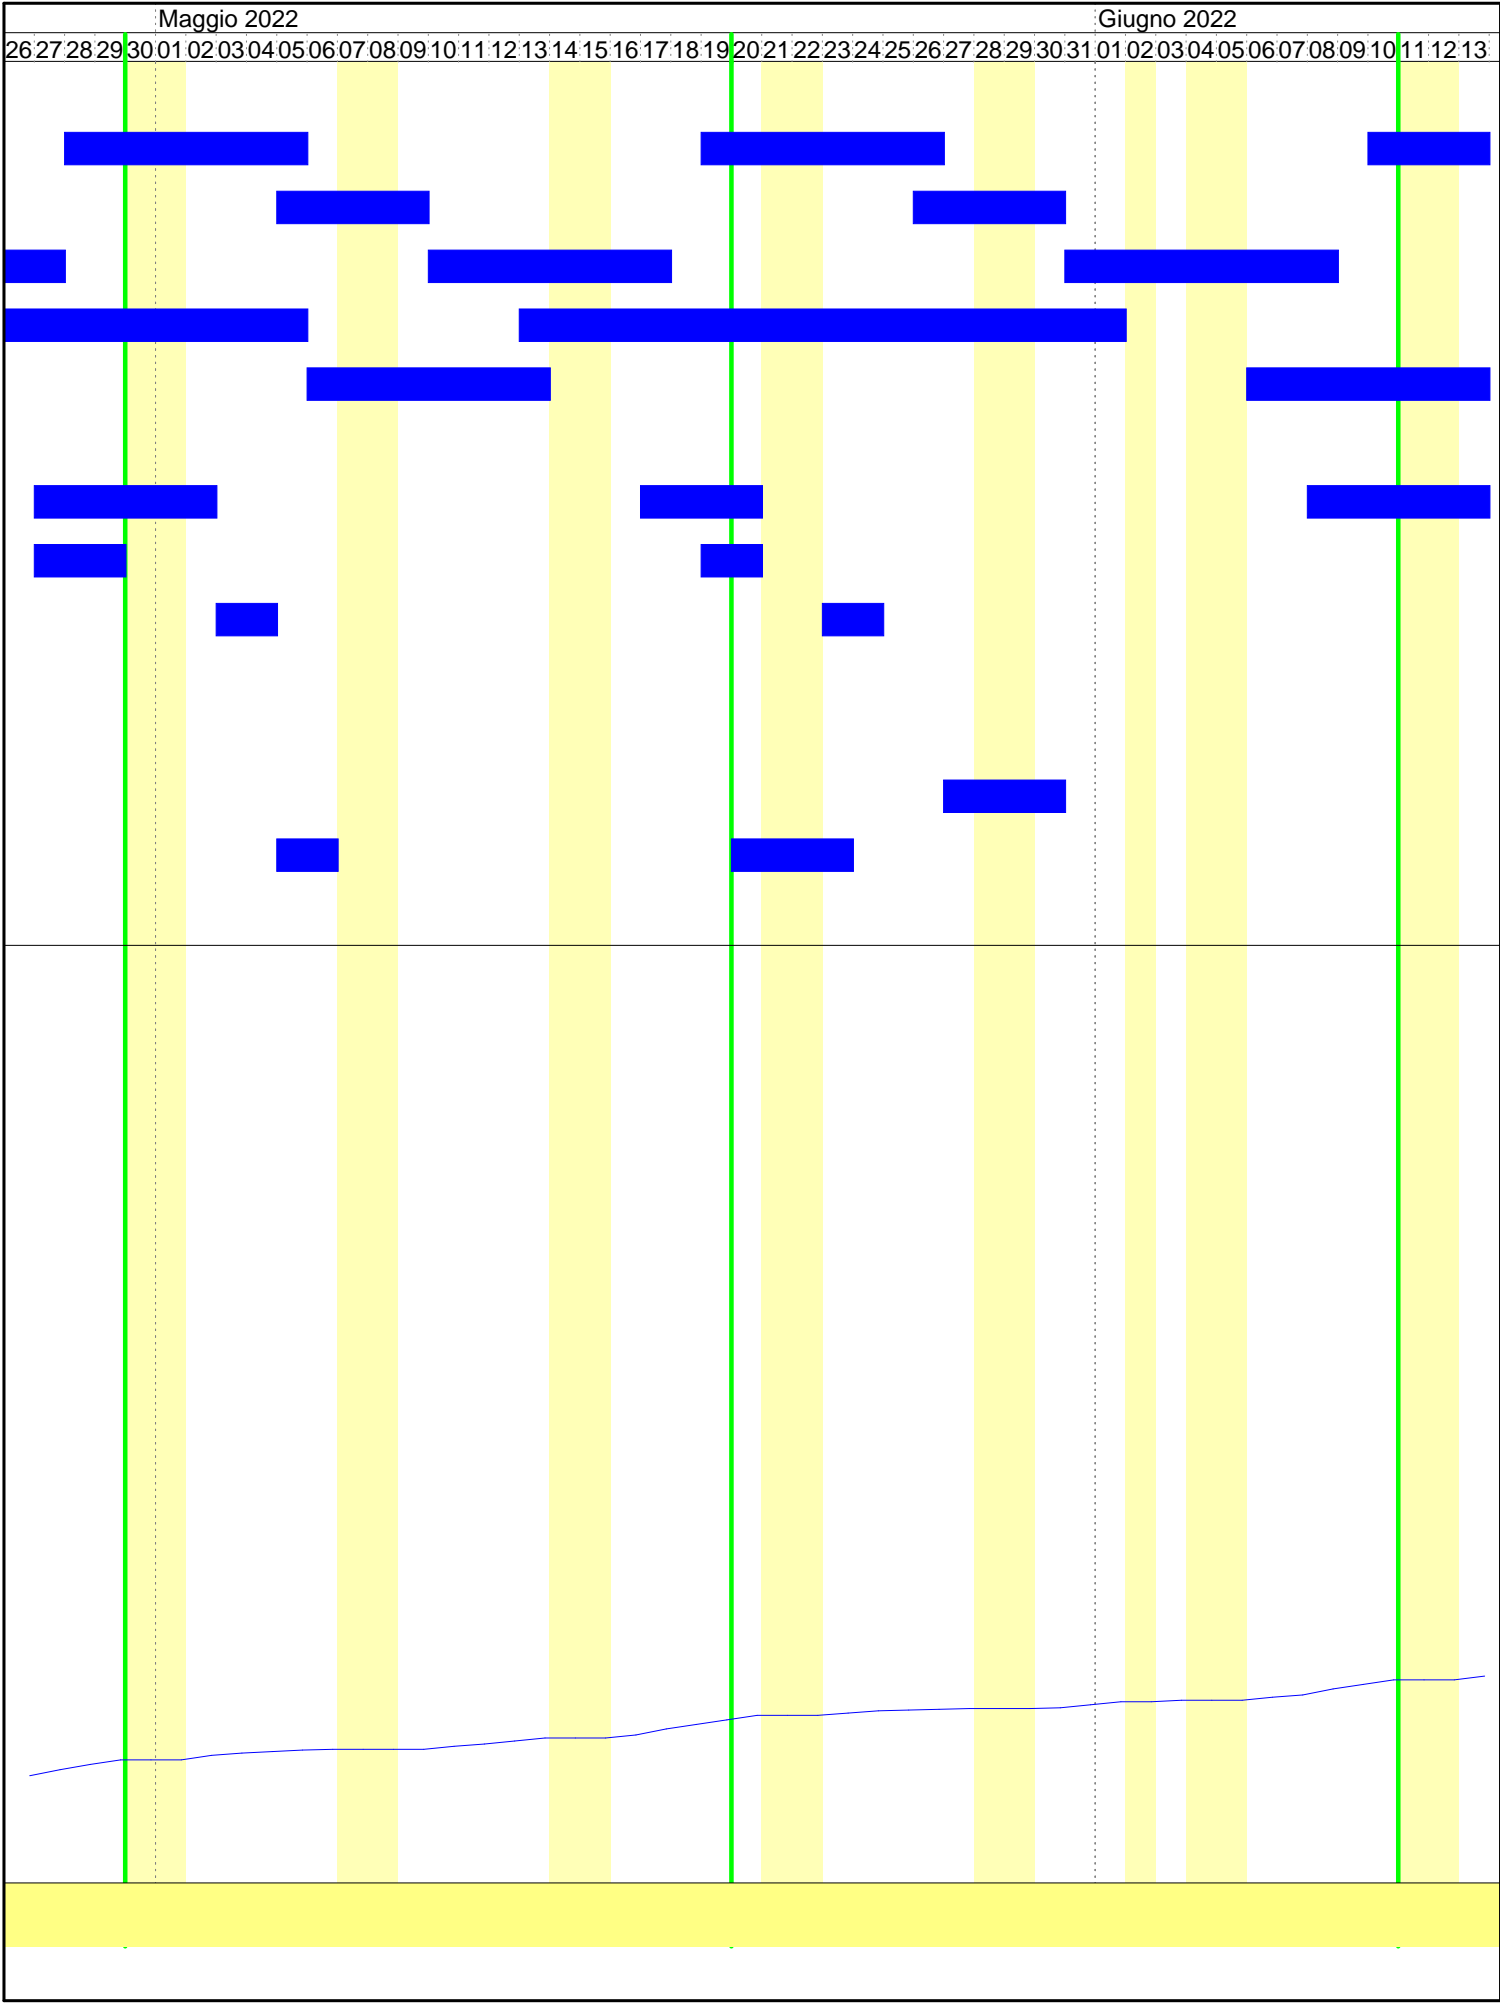


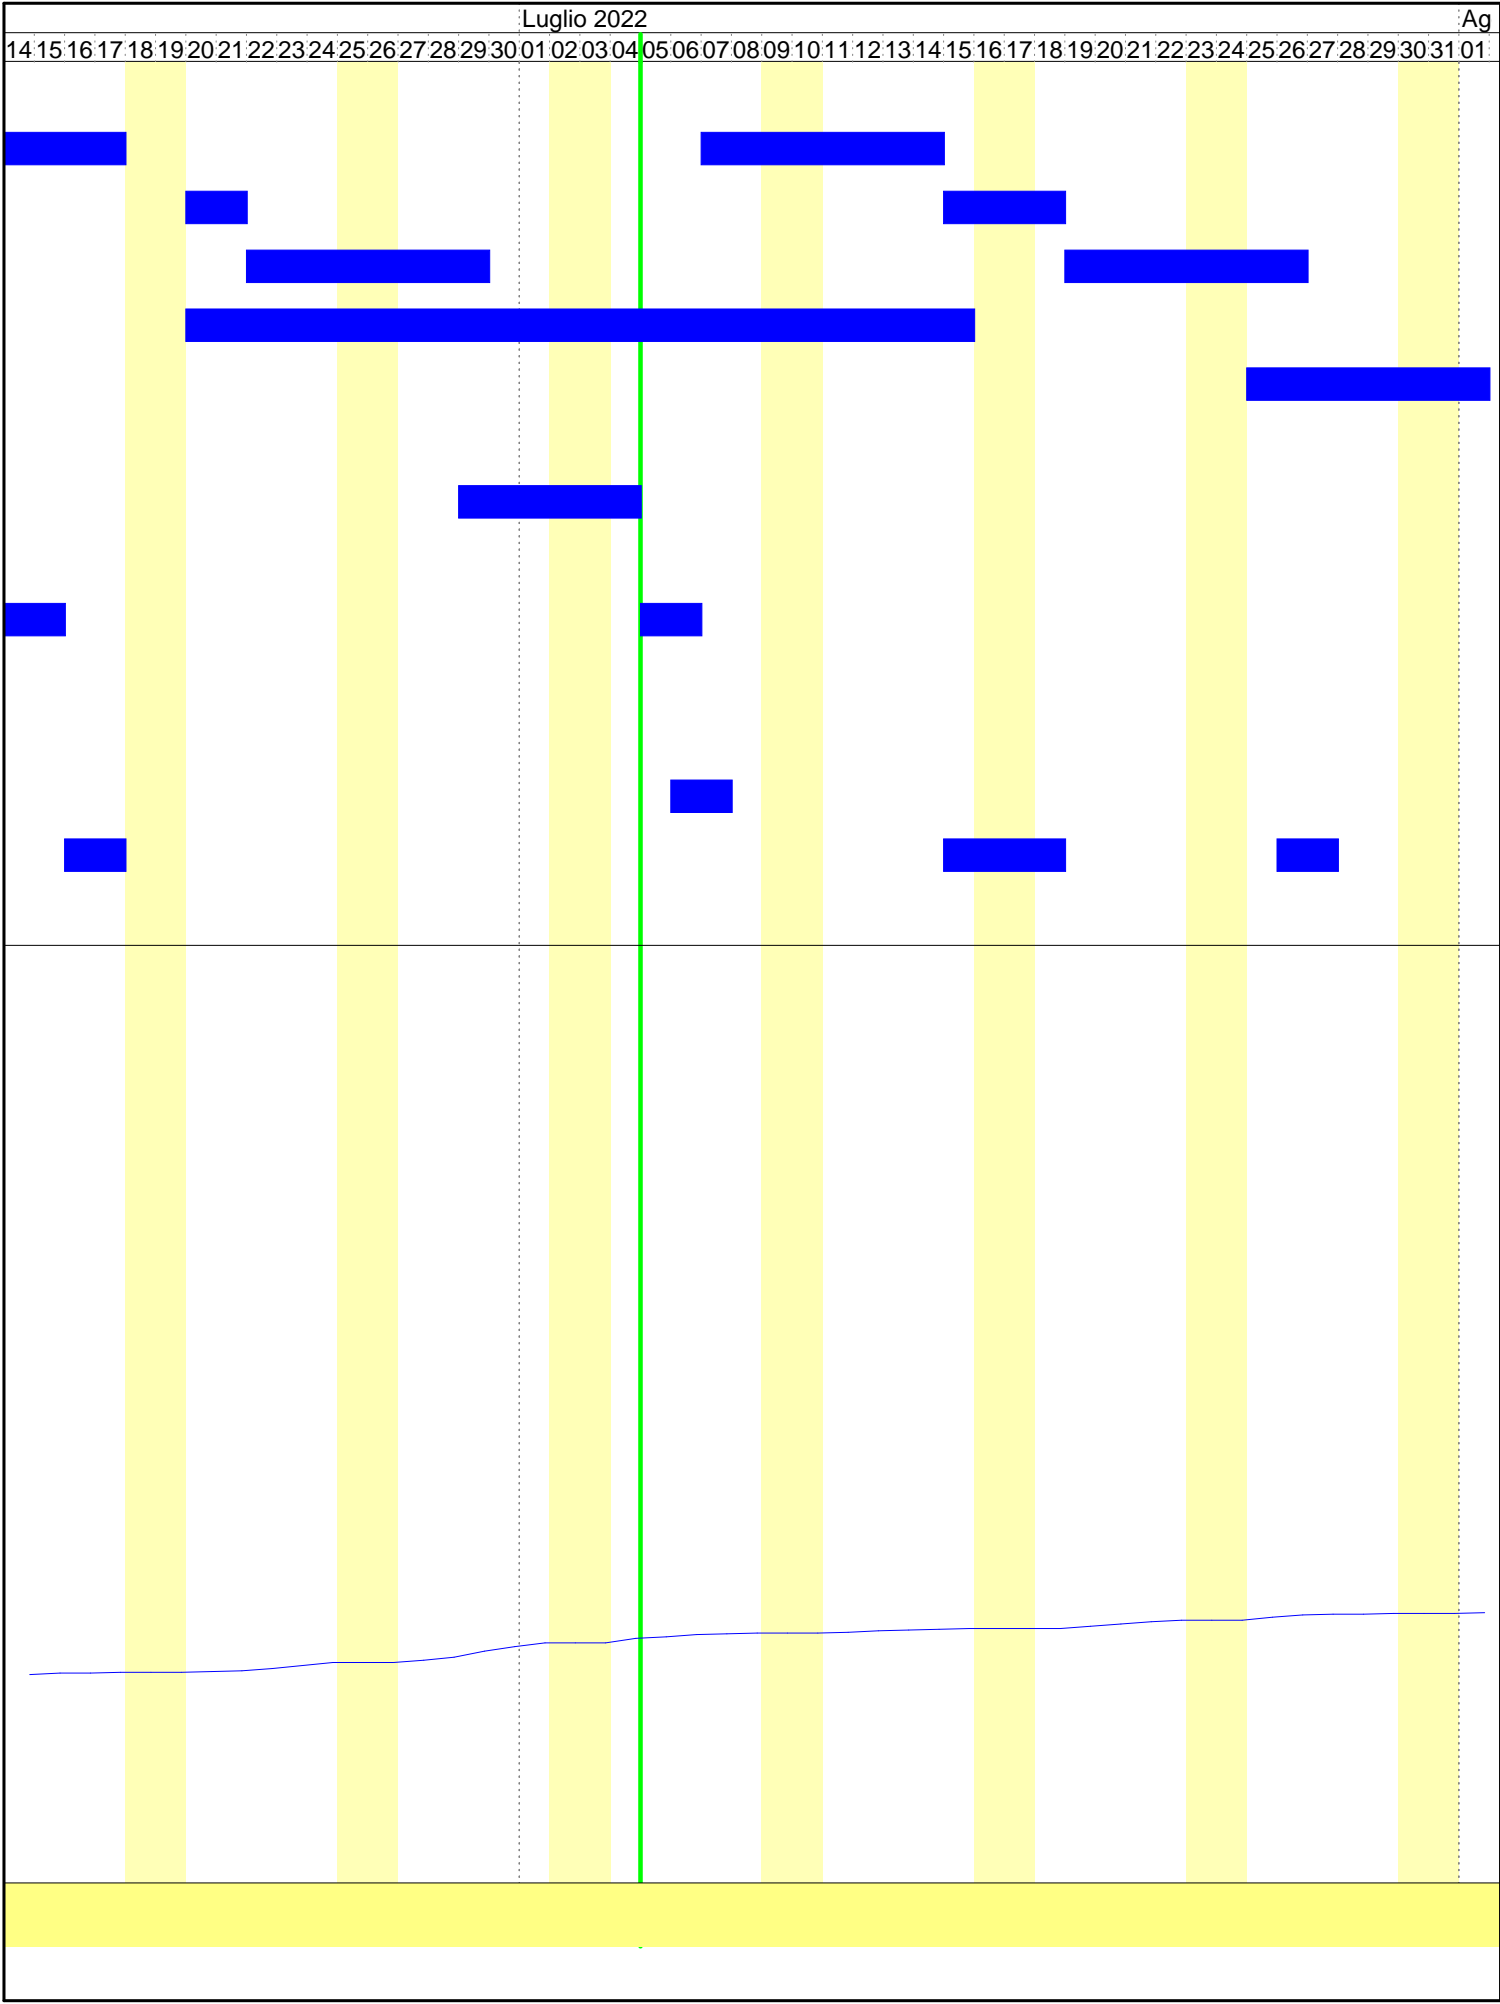


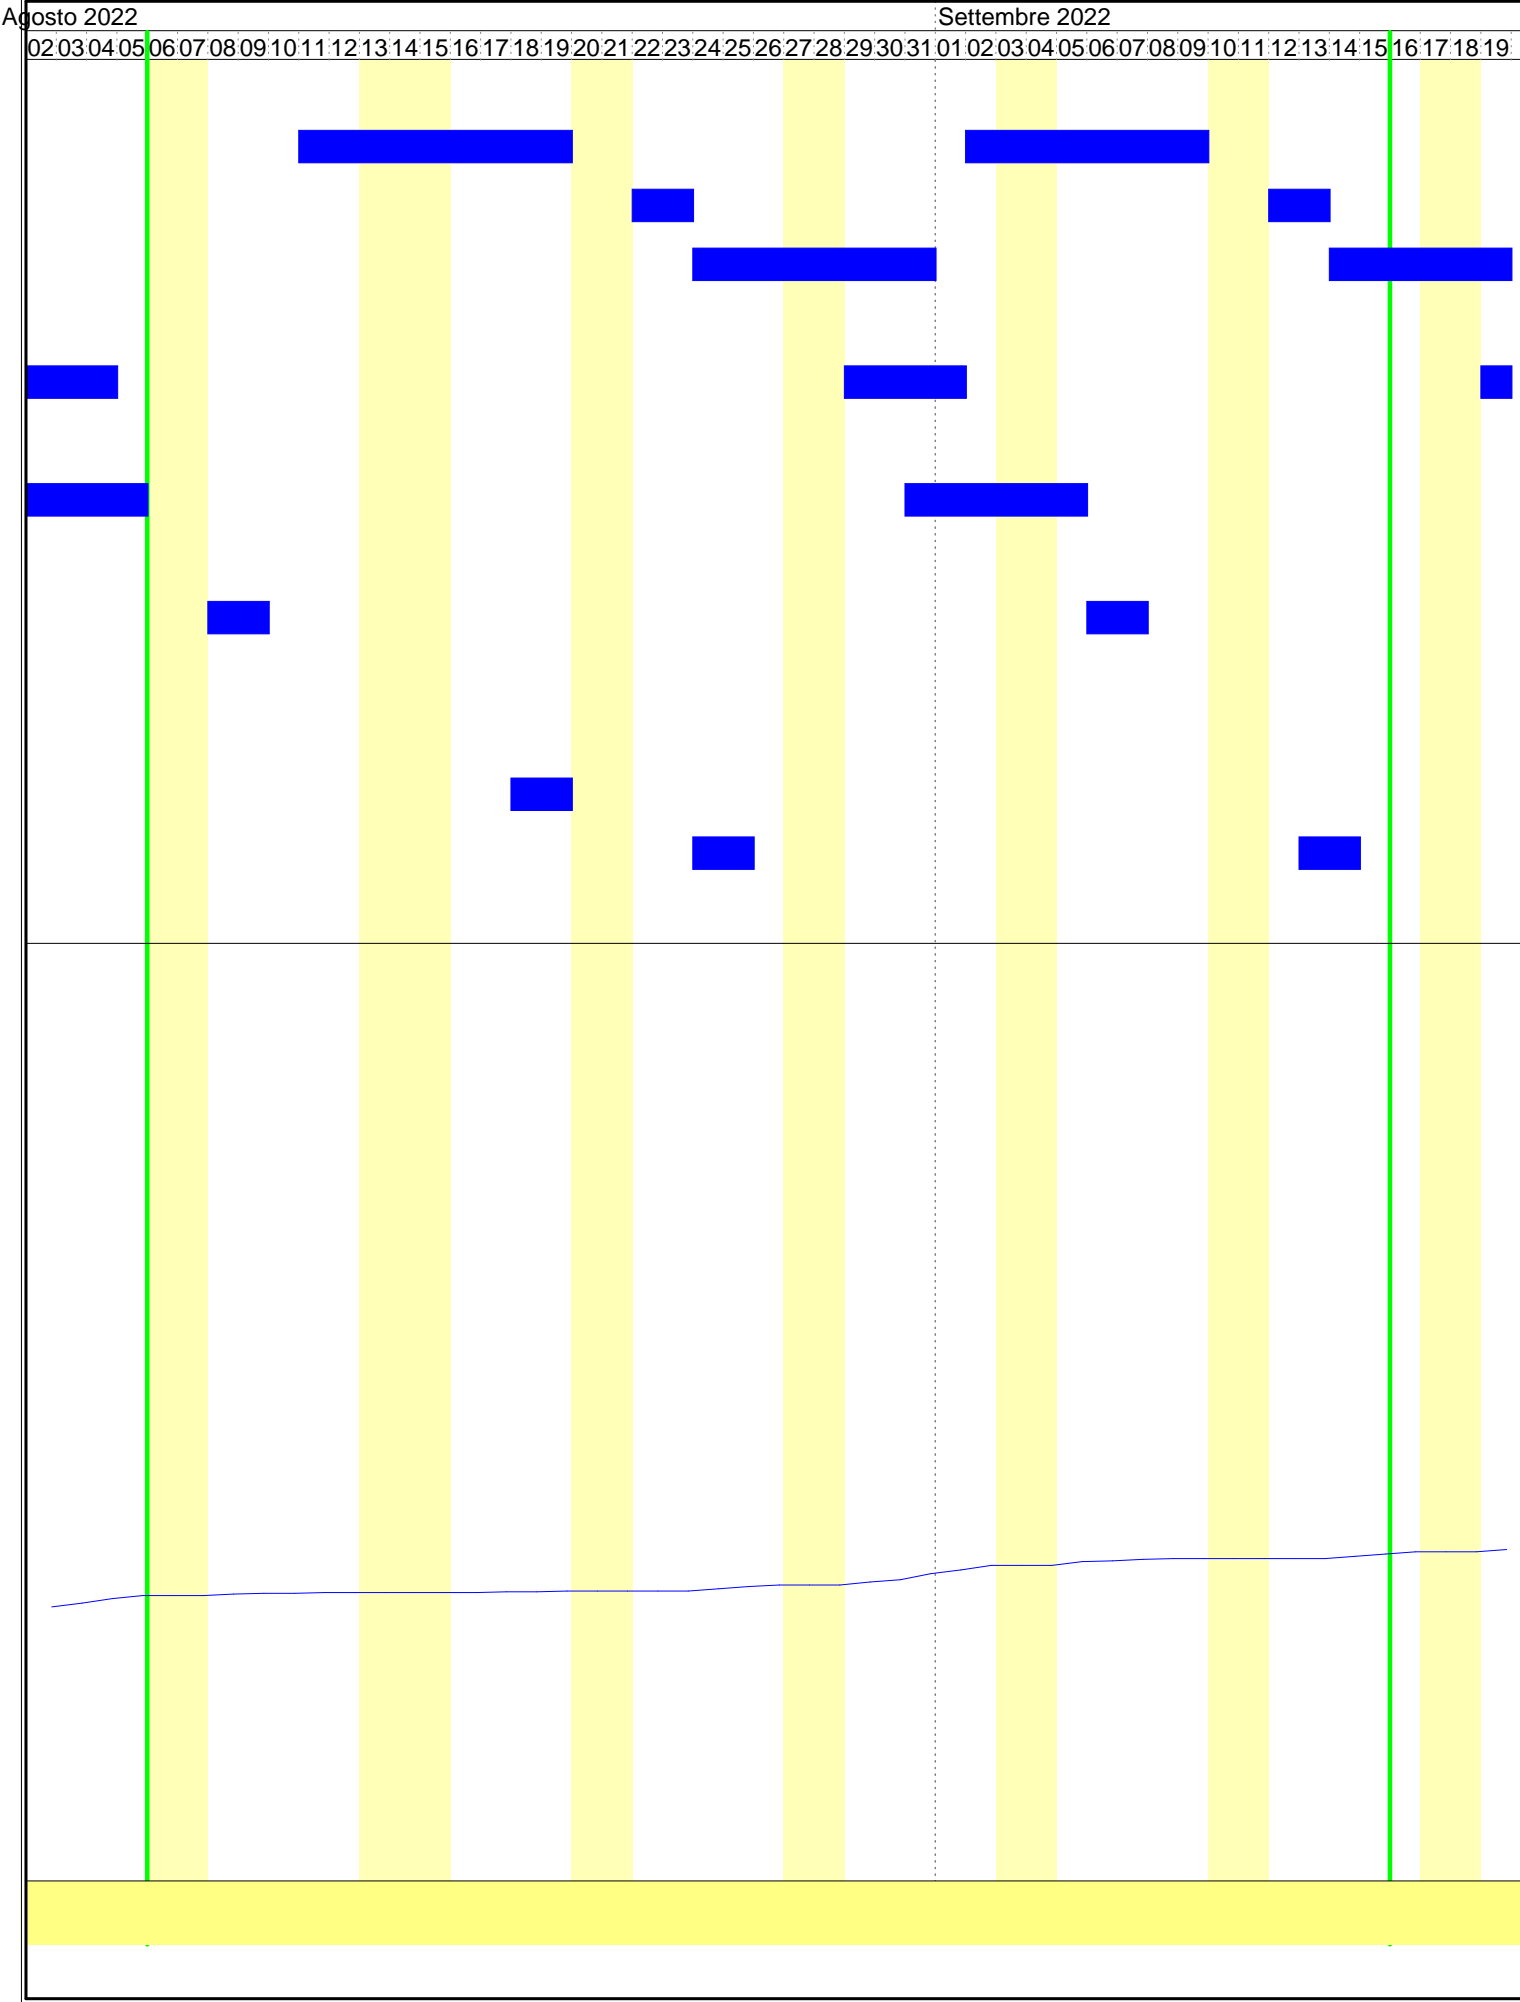


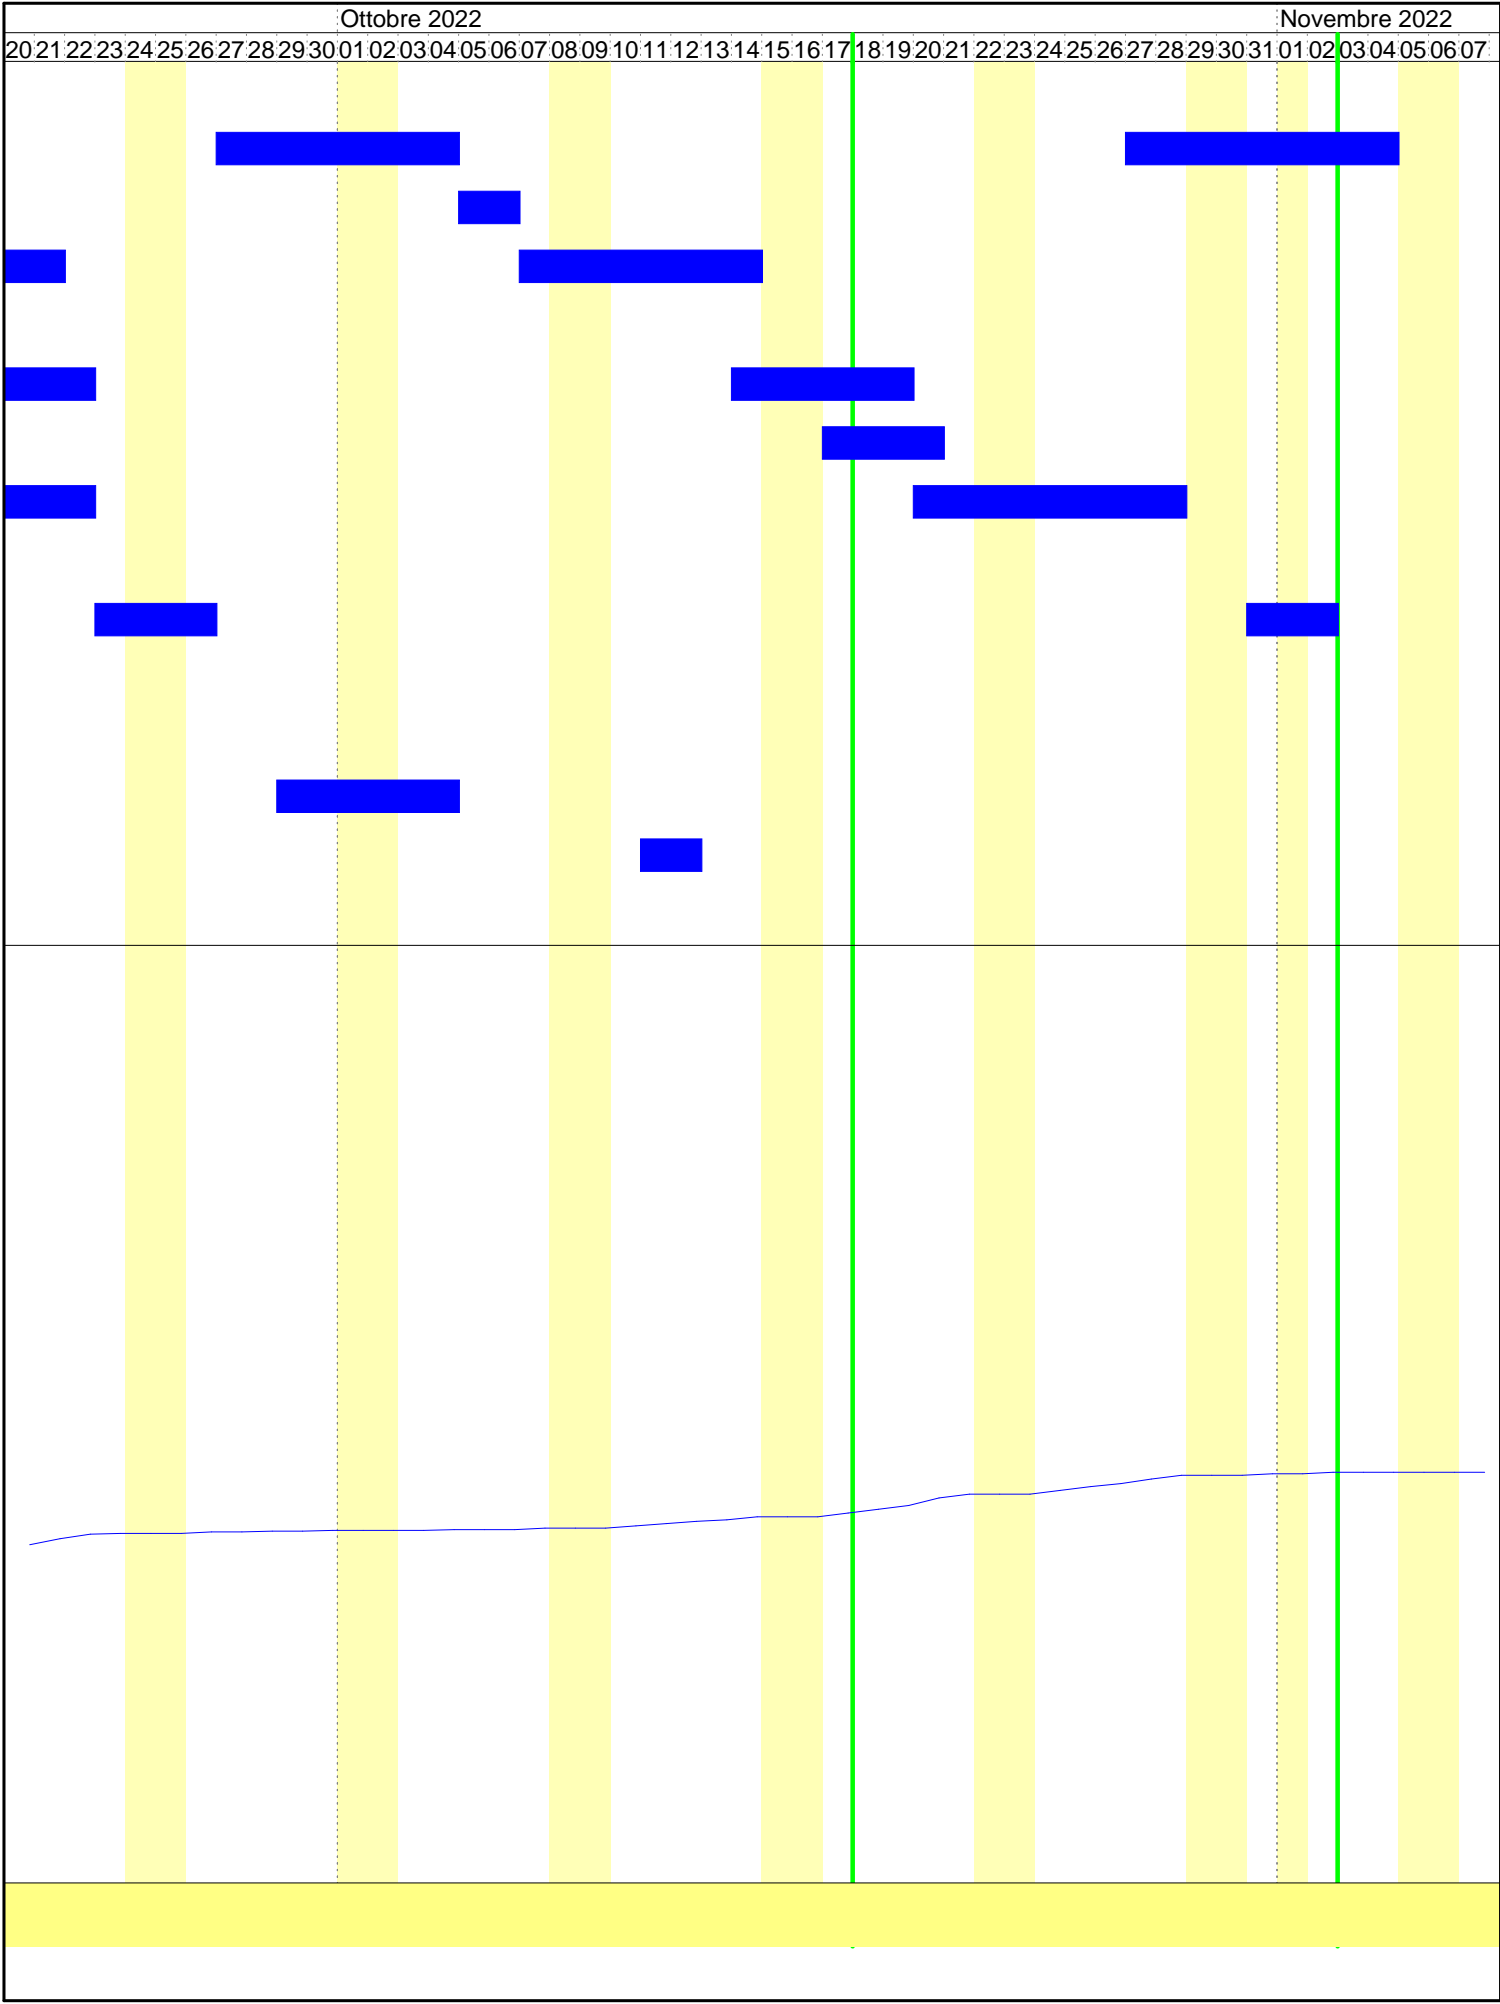


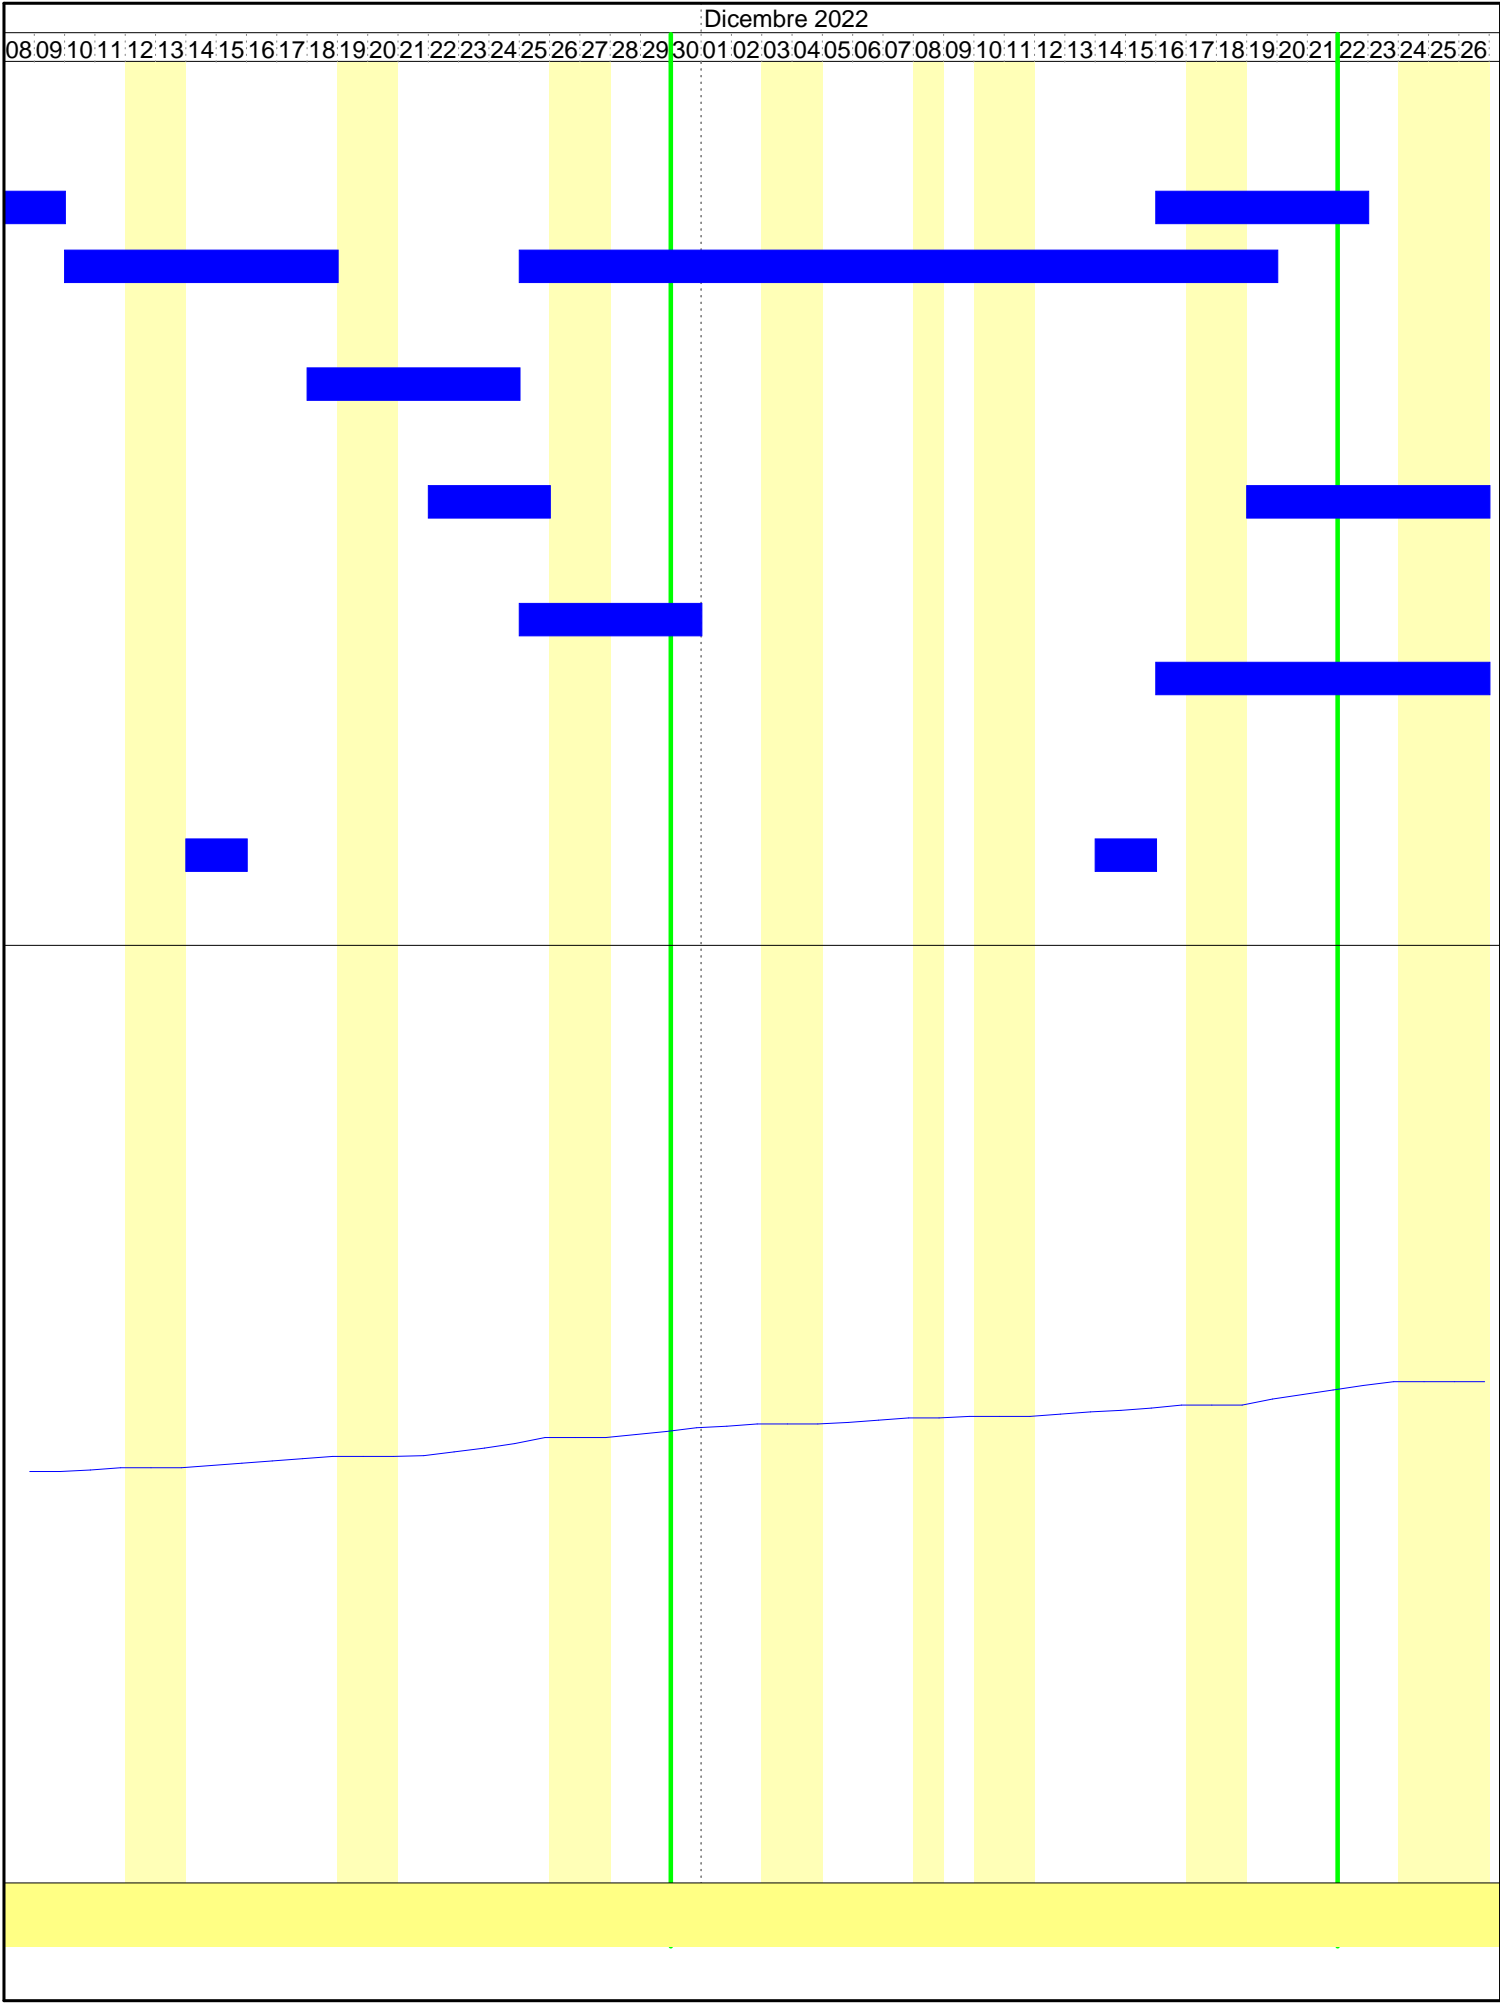

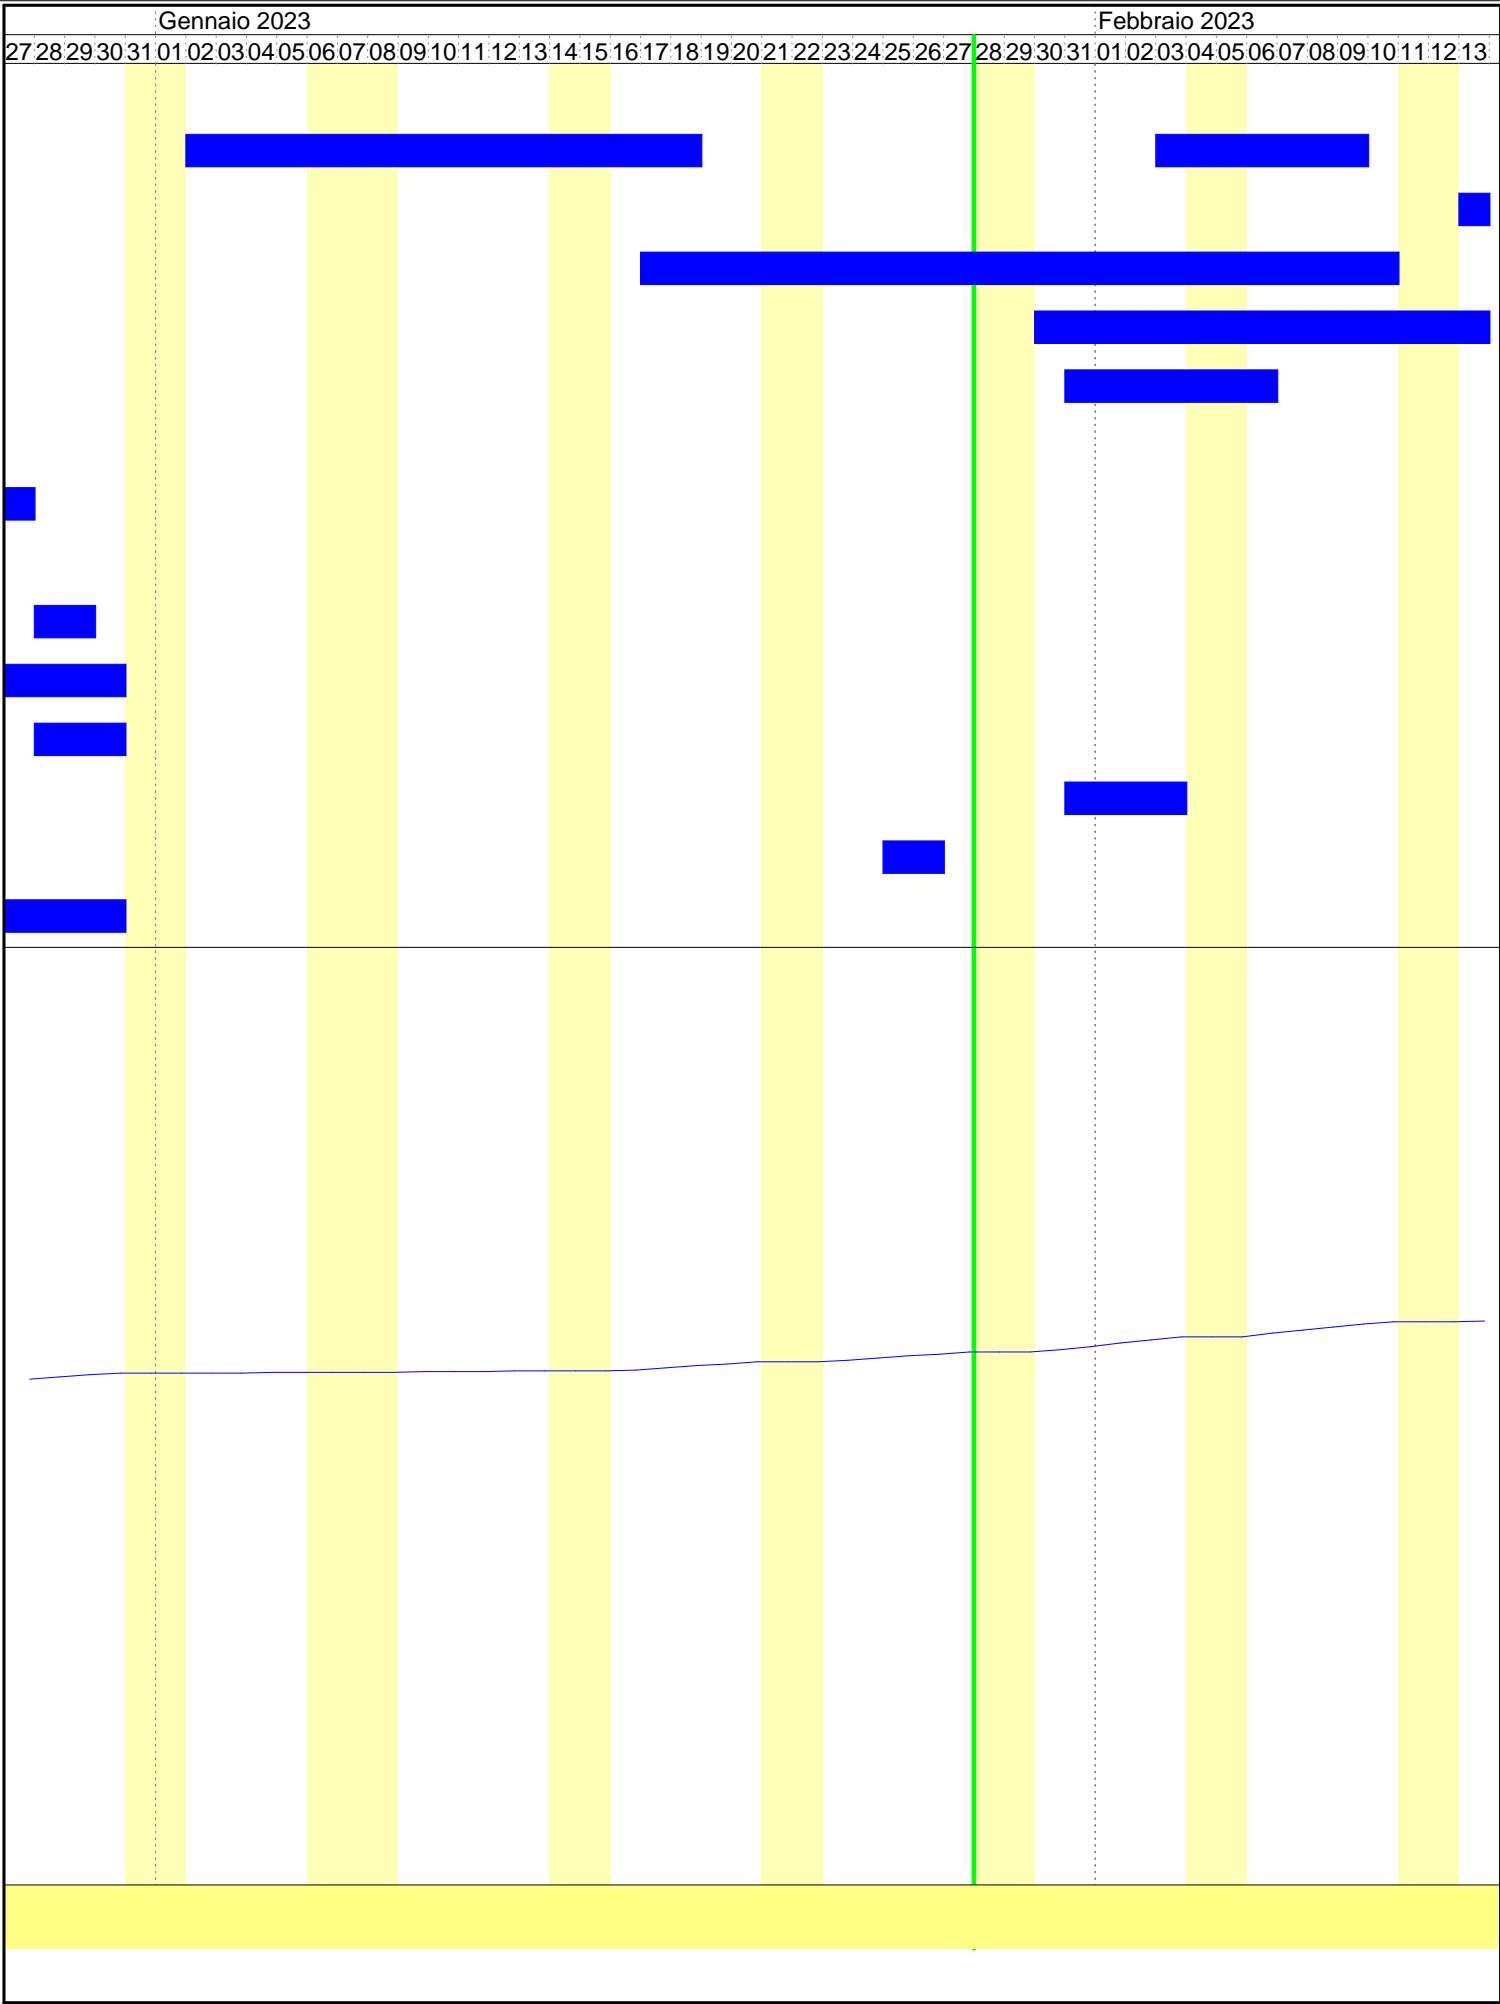

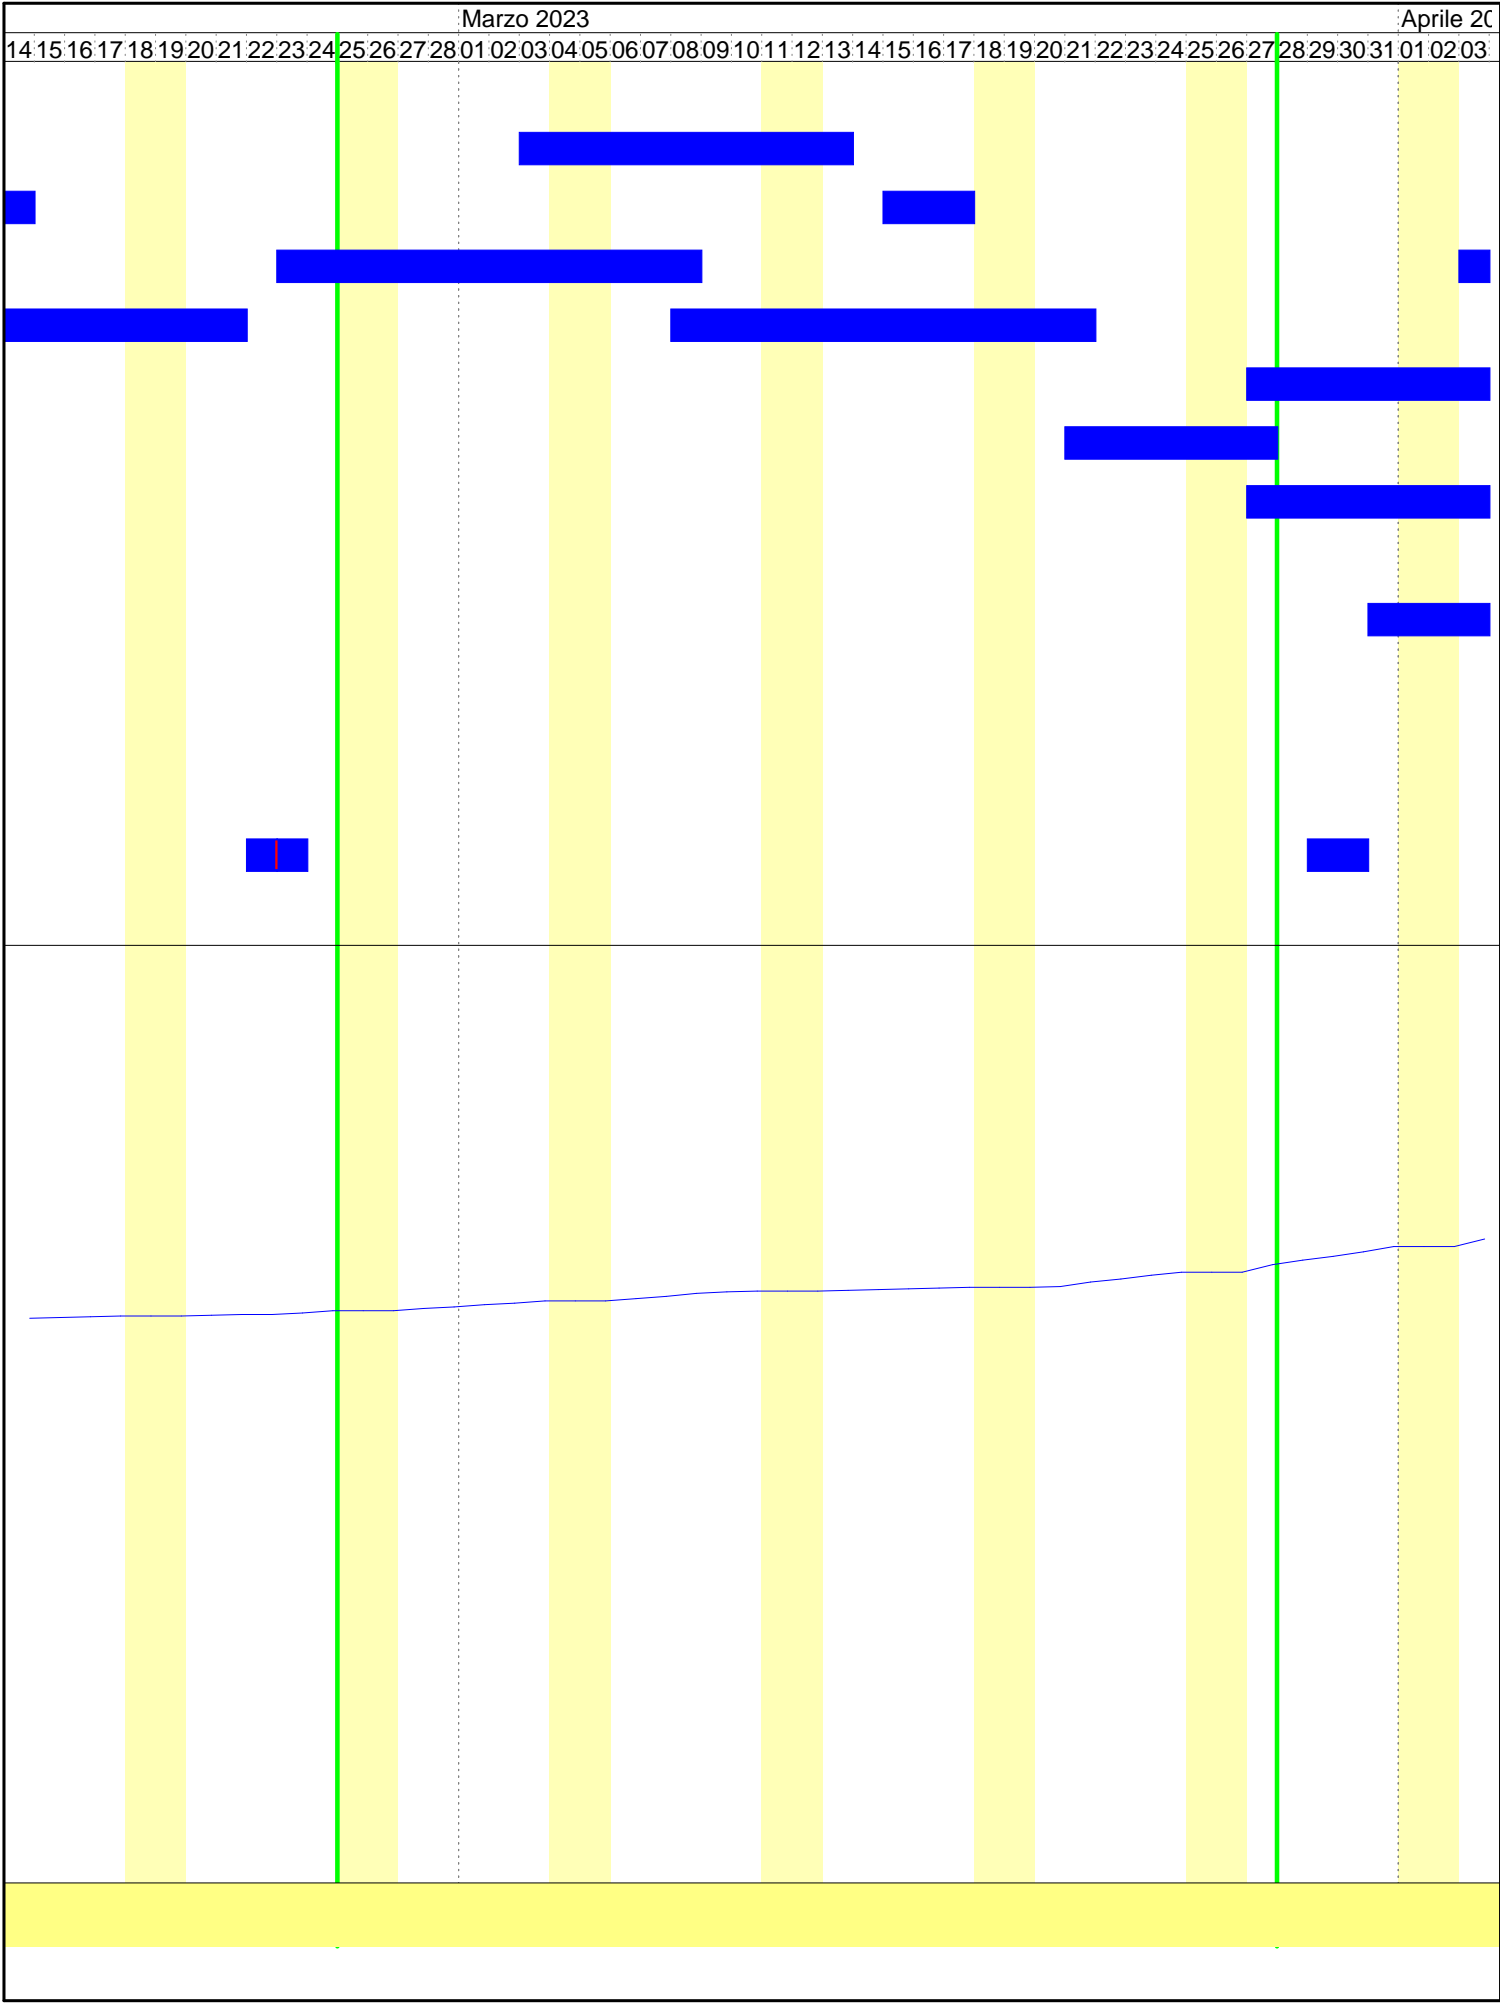

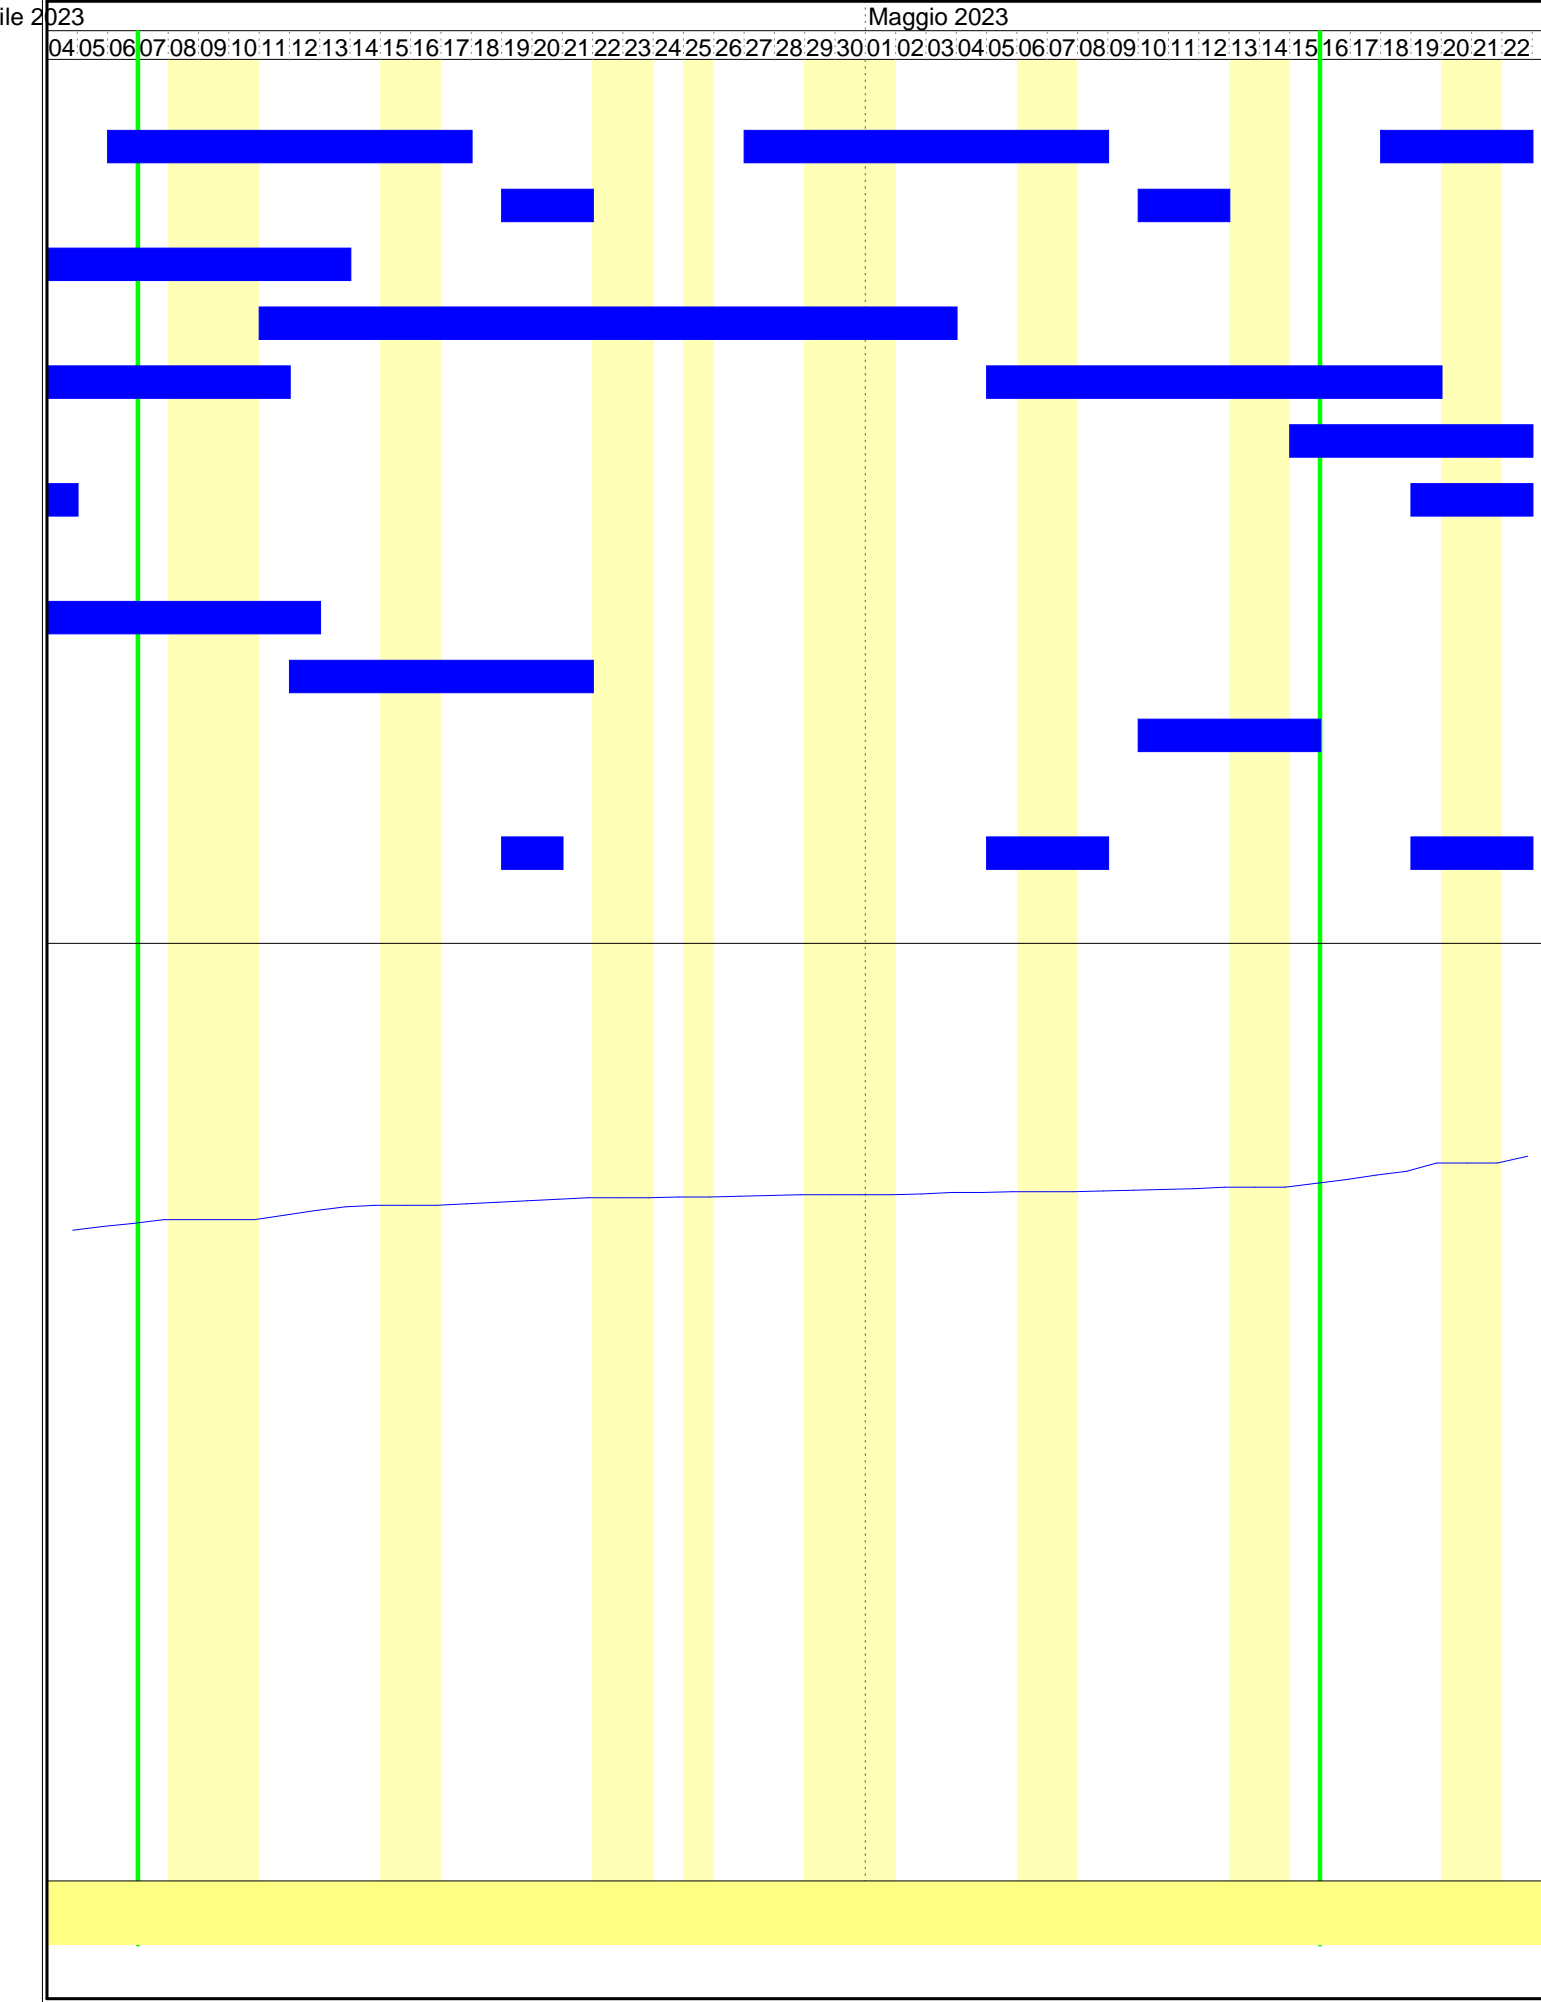

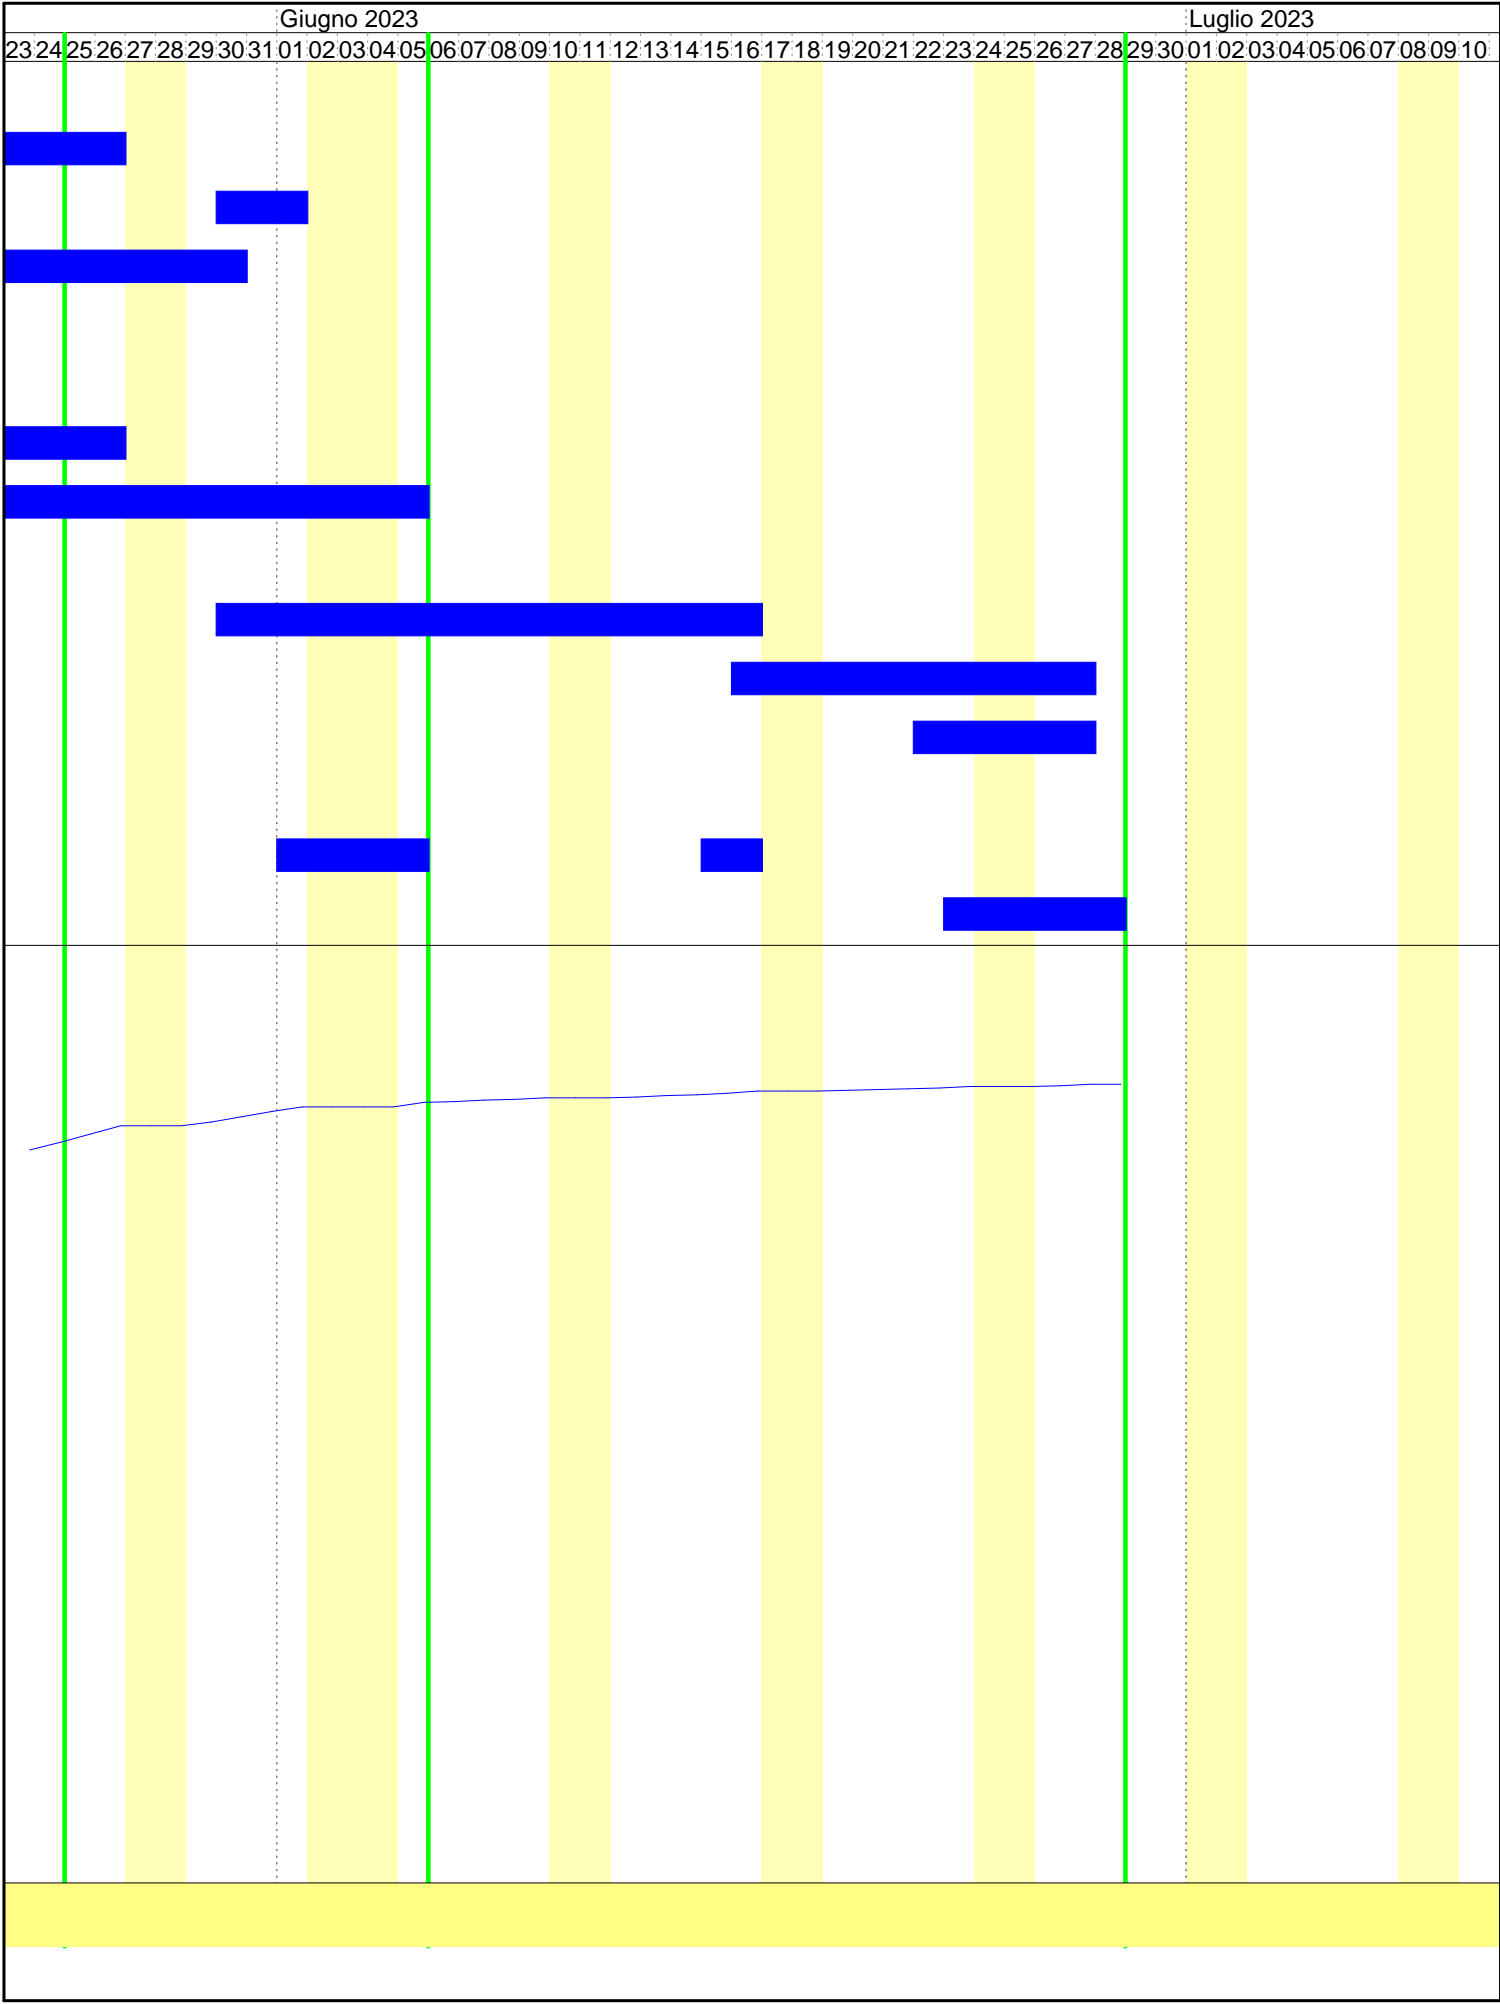

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Tabella Attività

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione del piano viario delle strade S.P.52 di S. Mauro Castelverde ed S.P.60 di Gangi, dall'innesto con la S.S.113 sino al bivio con la S.S.120

COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Palermo, 14/07/2021

Il Tecnico
(geom. Paolo Franzone)

S.P. n. 52 - 60 - S. Mauro C.de - Ganci (PA)
Interventi per il ripristino della viabilità

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
IMPIANTO ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	26'500,00	0,26	03/01/2022	10/01/2022	5	8
MOVIMENTI DI MATERIE E TRASPORTI	456'487,69	4,50	10/01/2022	26/05/2023	119	168
<i>periodo 01</i>	27'389,26	0,27	10/01/2022	18/01/2022	7	9
<i>periodo 02</i>	50'213,65	0,50	01/02/2022	17/02/2022	13	17
<i>periodo 03</i>	22'824,38	0,23	05/04/2022	12/04/2022	6	8
<i>periodo 04</i>	22'824,38	0,23	28/04/2022	05/05/2022	6	8
<i>periodo 05</i>	22'824,38	0,23	19/05/2022	26/05/2022	6	8
<i>periodo 06</i>	22'824,38	0,23	10/06/2022	17/06/2022	6	8
<i>periodo 07</i>	22'824,38	0,23	07/07/2022	14/07/2022	6	8
<i>periodo 08</i>	22'824,38	0,23	11/08/2022	19/08/2022	6	9
<i>periodo 09</i>	22'824,38	0,23	02/09/2022	09/09/2022	6	8
<i>periodo 10</i>	22'824,38	0,23	27/09/2022	04/10/2022	6	8
<i>periodo 11</i>	22'824,38	0,23	27/10/2022	04/11/2022	6	9
<i>periodo 12</i>	45'648,77	0,45	02/01/2023	18/01/2023	12	17
<i>periodo 13</i>	18'259,51	0,18	03/02/2023	09/02/2023	5	7
<i>periodo 14</i>	27'389,26	0,27	03/03/2023	13/03/2023	7	11
<i>periodo 15</i>	27'389,26	0,27	06/04/2023	17/04/2023	7	12
<i>periodo 16</i>	27'389,26	0,27	27/04/2023	08/05/2023	7	12
<i>periodo 17</i>	27'389,26	0,27	18/05/2023	26/05/2023	7	9
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI DI OPERE IN C.A.	30'768,82	0,30	17/01/2022	01/06/2023	44	52
<i>periodo 01</i>	2'769,19	0,03	17/01/2022	20/01/2022	4	4
<i>periodo 02</i>	2'153,82	0,02	12/04/2022	14/04/2022	3	3
<i>periodo 03</i>	2'153,82	0,02	05/05/2022	09/05/2022	3	5
<i>periodo 04</i>	2'153,82	0,02	26/05/2022	30/05/2022	3	5
<i>periodo 05</i>	1'538,44	0,02	20/06/2022	21/06/2022	2	2
<i>periodo 06</i>	1'538,44	0,02	15/07/2022	18/07/2022	2	4
<i>periodo 07</i>	1'538,44	0,02	22/08/2022	23/08/2022	2	2
<i>periodo 08</i>	1'538,44	0,02	12/09/2022	13/09/2022	2	2
<i>periodo 09</i>	1'538,44	0,02	05/10/2022	06/10/2022	2	2
<i>periodo 10</i>	1'538,44	0,02	08/11/2022	09/11/2022	2	2
<i>periodo 11</i>	3'384,57	0,03	16/12/2022	22/12/2022	5	7
<i>periodo 12</i>	1'538,44	0,02	13/02/2023	14/02/2023	2	2
<i>periodo 13</i>	2'153,82	0,02	15/03/2023	17/03/2023	3	3
<i>periodo 14</i>	2'153,82	0,02	19/04/2023	21/04/2023	3	3
<i>periodo 15</i>	2'153,82	0,02	10/05/2023	12/05/2023	3	3
<i>periodo 16</i>	923,06	0,01	30/05/2023	01/06/2023	3	3
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI PROTEZIONE DEL TERRENO	3'126'511,75	30,83	21/01/2022	30/05/2023	127	180
<i>periodo 01</i>	93'795,35	0,92	21/01/2022	26/01/2022	4	6
<i>periodo 02</i>	62'530,24	0,62	27/01/2022	31/01/2022	3	5
<i>periodo 03</i>	125'060,47	1,23	18/02/2022	24/02/2022	5	7
<i>periodo 04</i>	187'590,70	1,85	15/04/2022	27/04/2022	7	13
<i>periodo 05</i>	156'325,59	1,54	10/05/2022	17/05/2022	6	8
<i>periodo 06</i>	156'325,59	1,54	31/05/2022	08/06/2022	6	9
<i>periodo 07</i>	156'325,59	1,54	22/06/2022	29/06/2022	6	8
<i>periodo 08</i>	156'325,59	1,54	19/07/2022	26/07/2022	6	8
<i>periodo 09</i>	156'325,59	1,54	24/08/2022	31/08/2022	6	8
<i>periodo 10</i>	156'325,59	1,54	14/09/2022	21/09/2022	6	8
<i>periodo 11</i>	156'325,59	1,54	07/10/2022	14/10/2022	6	8
<i>periodo 12</i>	187'590,70	1,85	10/11/2022	18/11/2022	7	9
<i>periodo 13</i>	406'446,53	4,01	25/11/2022	19/12/2022	16	25
<i>periodo 14</i>	468'976,76	4,62	17/01/2023	10/02/2023	19	25
<i>periodo 15</i>	250'120,94	2,47	23/02/2023	08/03/2023	10	14
<i>periodo 16</i>	187'590,70	1,85	03/04/2023	13/04/2023	8	11
<i>periodo 17</i>	62'530,23	0,62	23/05/2023	30/05/2023	6	8
MURO SU PALI (S.P. 52 Int. 5-6B, 16B, 17B, 18B; S.P.60 Int. 15C e 17D)	996'994,73	9,83	22/02/2022	03/05/2023	116	164
<i>periodo 01</i>	219'338,84	2,16	22/02/2022	28/03/2022	25	35
<i>periodo 02</i>	129'609,31	1,28	13/04/2022	05/05/2022	15	23
<i>periodo 03</i>	119'639,37	1,18	13/05/2022	01/06/2022	14	20

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	periodo 04	169'489,10	1,67	20/06/2022	15/07/2022	20	26
	periodo 05	149'549,21	1,47	30/01/2023	21/02/2023	17	23
	periodo 06	89'729,53	0,88	08/03/2023	21/03/2023	10	14
	periodo 07	119'639,37	1,18	11/04/2023	03/05/2023	15	23
OPERE D'ARTE IN C.A.		499'480,08	4,92	21/01/2022	19/05/2023	79	104
	periodo 01	24'974,00	0,25	21/01/2022	26/01/2022	4	6
	periodo 02	64'932,41	0,64	28/03/2022	08/04/2022	10	12
	periodo 03	39'958,41	0,39	06/05/2022	13/05/2022	6	8
	periodo 04	39'958,41	0,39	06/06/2022	13/06/2022	6	8
	periodo 05	54'942,81	0,54	25/07/2022	04/08/2022	9	11
	periodo 06	24'974,00	0,25	29/08/2022	01/09/2022	4	4
	periodo 07	24'974,00	0,25	19/09/2022	22/09/2022	4	4
	periodo 08	24'974,00	0,25	14/10/2022	19/10/2022	4	6
	periodo 09	29'968,80	0,30	18/11/2022	24/11/2022	5	7
	periodo 10	29'968,80	0,30	31/01/2023	06/02/2023	5	7
	periodo 11	69'927,21	0,69	27/03/2023	11/04/2023	11	16
	periodo 12	69'927,21	0,69	05/05/2023	19/05/2023	11	15
SCARIFICA STRADALE		822'425,00	8,11	17/10/2022	26/05/2023	19	23
	periodo 01	172'709,25	1,70	17/10/2022	20/10/2022	4	4
	periodo 02	213'830,50	2,11	21/03/2023	27/03/2023	5	7
	periodo 03	435'885,25	4,30	15/05/2023	26/05/2023	10	12
CORPO E PAVIMENTAZIONE STRADALE		3'010'752,22	29,69	25/01/2022	05/06/2023	66	88
	periodo 01	180'645,13	1,78	25/01/2022	28/01/2022	4	4
	periodo 02	180'645,13	1,78	27/04/2022	02/05/2022	4	6
	periodo 03	180'645,13	1,78	17/05/2022	20/05/2022	4	4
	periodo 04	180'645,13	1,78	08/06/2022	13/06/2022	4	6
	periodo 05	180'645,13	1,78	29/06/2022	04/07/2022	4	6
	periodo 06	180'645,13	1,78	02/08/2022	05/08/2022	4	4
	periodo 07	180'645,13	1,78	31/08/2022	05/09/2022	4	6
	periodo 08	150'537,61	1,48	20/09/2022	22/09/2022	3	3
	periodo 09	331'182,74	3,27	20/10/2022	28/10/2022	7	9
	periodo 10	180'645,13	1,78	22/11/2022	25/11/2022	4	4
	periodo 11	270'967,70	2,67	19/12/2022	27/12/2022	6	9
	periodo 12	331'182,74	3,27	27/03/2023	04/04/2023	7	9
	periodo 13	481'720,36	4,75	19/05/2023	05/06/2023	11	18
ROTATORIA		77'985,85	0,77	10/02/2022	20/05/2022	26	36
	periodo 01	24'175,61	0,24	10/02/2022	21/02/2022	8	12
	periodo 02	38'992,92	0,38	03/03/2022	21/03/2022	13	19
	periodo 03	9'358,30	0,09	27/04/2022	29/04/2022	3	3
	periodo 04	5'459,01	0,05	19/05/2022	20/05/2022	2	2
OPERE DI CORREDO STRADALE		669'836,10	6,60	31/01/2022	16/06/2023	49	66
	periodo 01	13'396,72	0,13	31/01/2022	31/01/2022	1	1
	periodo 02	13'396,72	0,13	16/02/2022	16/02/2022	1	1
	periodo 03	53'586,89	0,53	06/04/2022	11/04/2022	4	6
	periodo 04	26'793,44	0,26	03/05/2022	04/05/2022	2	2
	periodo 05	26'793,44	0,26	23/05/2022	24/05/2022	2	2
	periodo 06	26'793,44	0,26	14/06/2022	15/06/2022	2	2
	periodo 07	26'793,44	0,26	05/07/2022	06/07/2022	2	2
	periodo 08	26'793,44	0,26	08/08/2022	09/08/2022	2	2
	periodo 09	26'793,44	0,26	06/09/2022	07/09/2022	2	2
	periodo 10	26'793,44	0,26	23/09/2022	26/09/2022	2	4
	periodo 11	26'793,44	0,26	31/10/2022	02/11/2022	2	3
	periodo 12	53'586,89	0,53	25/11/2022	30/11/2022	4	6
	periodo 13	26'793,44	0,26	28/12/2022	29/12/2022	2	2
	periodo 14	107'173,78	1,06	31/03/2023	12/04/2023	8	13
	periodo 15	187'554,11	1,85	30/05/2023	16/06/2023	13	18
SEGNALETICA STRADALE		245'642,05	2,42	16/12/2022	27/06/2023	26	37
	periodo 01	93'343,98	0,92	16/12/2022	30/12/2022	10	15

ATTIVITA'		PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
		euro	(%)			Lav.	Tot.
	periodo 02	76'149,04	0,75	12/04/2023	21/04/2023	8	10
	periodo 03	76'149,04	0,75	16/06/2023	27/06/2023	8	12
OPERE VARIE E DI FINITURA		110'046,22	1,09	10/01/2022	27/06/2023	25	33
	periodo 01	61'625,88	0,61	10/01/2022	27/01/2022	14	18
	periodo 02	13'205,55	0,13	28/12/2022	30/12/2022	3	3
	periodo 03	17'607,40	0,17	10/05/2023	15/05/2023	4	6
	periodo 04	17'607,40	0,17	22/06/2023	27/06/2023	4	6
LAVORI IN ECONOMIA		24'893,70	0,25	10/01/2022	03/02/2023	28	34
	periodo 01	2'738,31	0,03	10/01/2022	12/01/2022	3	3
	periodo 02	2'738,31	0,03	31/01/2022	02/02/2022	3	3
	periodo 03	2'738,31	0,03	23/02/2022	25/02/2022	3	3
	periodo 04	2'738,31	0,03	18/03/2022	22/03/2022	3	5
	periodo 05	1'742,56	0,02	19/04/2022	20/04/2022	2	2
	periodo 06	1'742,56	0,02	27/05/2022	30/05/2022	2	4
	periodo 07	1'742,56	0,02	06/07/2022	07/07/2022	2	2
	periodo 08	1'742,56	0,02	18/08/2022	19/08/2022	2	2
	periodo 09	3'485,12	0,03	29/09/2022	04/10/2022	4	6
	periodo 10	3'485,12	0,03	31/01/2023	03/02/2023	4	4
COSTO DELLA SICUREZZA + COVID-19		31'310,15	0,31	03/01/2022	16/06/2023	46	57
	periodo 01	2'191,71	0,02	03/01/2022	05/01/2022	3	3
	periodo 02	626,20	0,01	01/02/2022	01/02/2022	1	1
	periodo 03	1'252,41	0,01	23/02/2022	24/02/2022	2	2
	periodo 04	1'252,41	0,01	23/03/2022	24/03/2022	2	2
	periodo 05	626,20	0,01	15/04/2022	15/04/2022	1	1
	periodo 06	626,20	0,01	19/04/2022	19/04/2022	1	1
	periodo 07	1'252,41	0,01	05/05/2022	06/05/2022	2	2
	periodo 08	1'252,41	0,01	20/05/2022	23/05/2022	2	4
	periodo 09	1'252,41	0,01	16/06/2022	17/06/2022	2	2
	periodo 10	1'252,41	0,01	15/07/2022	18/07/2022	2	4
	periodo 11	1'252,41	0,01	26/07/2022	27/07/2022	2	2
	periodo 12	1'252,41	0,01	24/08/2022	25/08/2022	2	2
	periodo 13	1'252,41	0,01	13/09/2022	14/09/2022	2	2
	periodo 14	1'252,41	0,01	11/10/2022	12/10/2022	2	2
	periodo 15	1'252,41	0,01	14/11/2022	15/11/2022	2	2
	periodo 16	1'252,41	0,01	14/12/2022	15/12/2022	2	2
	periodo 17	1'252,41	0,01	25/01/2023	26/01/2023	2	2
	periodo 18	626,20	0,01	22/02/2023	22/02/2023	1	1
	periodo 19	626,20	0,01	23/02/2023	23/02/2023	1	1
	periodo 20	1'252,41	0,01	29/03/2023	30/03/2023	2	2
	periodo 21	1'252,41	0,01	19/04/2023	20/04/2023	2	2
	periodo 22	1'252,41	0,01	05/05/2023	08/05/2023	2	4
	periodo 23	1'252,41	0,01	19/05/2023	22/05/2023	2	4
	periodo 24	1'252,41	0,01	01/06/2023	05/06/2023	2	5
	periodo 25	3'444,12	0,03	15/06/2023	16/06/2023	2	2
SMOBILIZZO E PULIZIA DEL CANTIERE		12'500,00	0,12	27/12/2022	28/06/2023	8	10
	periodo 01	6'250,00	0,06	27/12/2022	30/12/2022	4	4
	periodo 02	6'250,00	0,06	23/06/2023	28/06/2023	4	6
Palermo, 14/07/2021							
Tecnico geom. Paolo Franzone							

REGIONE SICILIANA

Dipartimento Reg. Tecnico - Servizio 5

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza e di sistemazione del piano viario delle strade S.P.52 di S. Mauro Castelverde ed S.P.60 di Gangi, dall'innesto con la S.S.113 sino al bivio con la S.S.120

COMMITTENTE: Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Palermo, 14/07/2021

Il Tecnico
(geom. Paolo Franzone)

S.P. n. 52 - 60 - S. Mauro C.de - Ganci (PA)
Interventi per il ripristino della viabilità

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
03/01/2022	6'030,57	6'030,57	0,06
04/01/2022	6'030,57	12'061,14	0,12
05/01/2022	6'030,57	18'091,71	0,18
07/01/2022	5'300,00	23'391,71	0,23
10/01/2022	14'527,37	37'919,08	0,37
11/01/2022	9'227,37	47'146,45	0,46
12/01/2022	9'227,37	56'373,82	0,56
13/01/2022	8'314,60	64'688,42	0,64
14/01/2022	8'314,60	73'003,02	0,72
17/01/2022	9'006,90	82'009,92	0,81
18/01/2022	9'006,90	91'016,82	0,90
19/01/2022	5'094,15	96'110,96	0,95
20/01/2022	5'094,15	101'205,11	1,00
21/01/2022	34'094,19	135'299,30	1,33
24/01/2022	34'094,19	169'393,49	1,67
25/01/2022	79'255,47	248'648,96	2,45
26/01/2022	79'255,47	327'904,43	3,23
27/01/2022	70'406,54	398'310,97	3,93
28/01/2022	66'004,69	464'315,67	4,58
31/01/2022	35'152,90	499'468,57	4,92
01/02/2022	5'401,56	504'870,13	4,98
02/02/2022	4'775,36	509'645,49	5,03
03/02/2022	3'862,59	513'508,08	5,06
04/02/2022	3'862,59	517'370,67	5,10
07/02/2022	3'862,59	521'233,25	5,14
08/02/2022	3'862,59	525'095,84	5,18
09/02/2022	3'862,59	528'958,43	5,22
10/02/2022	6'884,54	535'842,97	5,28
11/02/2022	6'884,54	542'727,51	5,35
14/02/2022	6'884,54	549'612,05	5,42
15/02/2022	6'884,54	556'496,59	5,49
16/02/2022	20'281,26	576'777,85	5,69
17/02/2022	6'884,54	583'662,39	5,75
18/02/2022	28'034,05	611'696,44	6,03
21/02/2022	28'034,05	639'730,48	6,31
22/02/2022	33'785,65	673'516,13	6,64
23/02/2022	35'324,62	708'840,75	6,99
24/02/2022	35'324,62	744'165,37	7,34
25/02/2022	9'686,32	753'851,69	7,43
28/02/2022	8'773,55	762'625,25	7,52
01/03/2022	8'773,55	771'398,80	7,61
02/03/2022	8'773,55	780'172,35	7,69
03/03/2022	11'773,01	791'945,36	7,81
04/03/2022	11'773,01	803'718,37	7,92
07/03/2022	11'773,01	815'491,38	8,04
08/03/2022	11'773,01	827'264,39	8,16
09/03/2022	11'773,01	839'037,40	8,27
10/03/2022	11'773,01	850'810,41	8,39
11/03/2022	11'773,01	862'583,42	8,50
14/03/2022	11'773,01	874'356,43	8,62
15/03/2022	11'773,01	886'129,44	8,74
16/03/2022	11'773,01	897'902,45	8,85
17/03/2022	11'773,01	909'675,46	8,97
18/03/2022	12'685,78	922'361,23	9,09
21/03/2022	12'685,78	935'047,01	9,22
22/03/2022	9'686,32	944'733,34	9,31
23/03/2022	9'399,76	954'133,09	9,41
24/03/2022	9'399,76	963'532,85	9,50
25/03/2022	8'773,55	972'306,40	9,59
28/03/2022	15'266,79	987'573,20	9,74
29/03/2022	6'493,24	994'066,44	9,80
30/03/2022	6'493,24	1'000'559,68	9,87
31/03/2022	6'493,24	1'007'052,92	9,93

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
01/04/2022	6'493,24	1'013'546,16	9,99
04/04/2022	6'493,24	1'020'039,40	10,06
05/04/2022	10'297,31	1'030'336,71	10,16
06/04/2022	23'694,03	1'054'030,73	10,39
07/04/2022	23'694,03	1'077'724,76	10,63
08/04/2022	23'694,03	1'101'418,79	10,86
11/04/2022	17'200,79	1'118'619,57	11,03
12/04/2022	4'522,00	1'123'141,58	11,07
13/04/2022	9'358,56	1'132'500,14	11,17
14/04/2022	9'358,56	1'141'858,70	11,26
15/04/2022	36'065,50	1'177'924,19	11,61
19/04/2022	36'936,78	1'214'860,97	11,98
20/04/2022	36'310,57	1'251'171,54	12,34
21/04/2022	35'439,29	1'286'610,84	12,69
22/04/2022	35'439,29	1'322'050,13	13,04
26/04/2022	35'439,29	1'357'489,42	13,38
27/04/2022	83'720,01	1'441'209,43	14,21
28/04/2022	60'725,40	1'501'934,83	14,81
29/04/2022	60'725,40	1'562'660,24	15,41
02/05/2022	57'605,97	1'620'266,21	15,98
03/05/2022	25'841,41	1'646'107,61	16,23
04/05/2022	25'841,41	1'671'949,02	16,49
05/05/2022	13'788,83	1'685'737,85	16,62
06/05/2022	8'003,88	1'693'741,72	16,70
09/05/2022	7'377,67	1'701'119,40	16,77
10/05/2022	32'714,00	1'733'833,40	17,10
11/05/2022	32'714,00	1'766'547,39	17,42
12/05/2022	32'714,00	1'799'261,39	17,74
13/05/2022	41'259,67	1'840'521,06	18,15
16/05/2022	34'599,93	1'875'121,00	18,49
17/05/2022	79'761,22	1'954'882,21	19,27
18/05/2022	53'706,95	2'008'589,16	19,80
19/05/2022	60'240,52	2'068'829,69	20,40
20/05/2022	60'866,72	2'129'696,41	21,00
23/05/2022	26'372,66	2'156'069,06	21,26
24/05/2022	25'746,46	2'181'815,52	21,51
25/05/2022	12'349,73	2'194'165,25	21,63
26/05/2022	13'067,67	2'207'232,92	21,76
27/05/2022	10'134,89	2'217'367,81	21,86
30/05/2022	10'134,89	2'227'502,70	21,96
31/05/2022	34'599,93	2'262'102,63	22,30
01/06/2022	34'599,93	2'296'702,57	22,65
03/06/2022	26'054,26	2'322'756,83	22,90
06/06/2022	32'714,00	2'355'470,83	23,22
07/06/2022	32'714,00	2'388'184,83	23,55
08/06/2022	77'875,28	2'466'060,11	24,32
09/06/2022	51'821,02	2'517'881,13	24,83
10/06/2022	55'625,08	2'573'506,21	25,37
13/06/2022	55'625,08	2'629'131,29	25,92
14/06/2022	17'200,79	2'646'332,08	26,09
15/06/2022	17'200,79	2'663'532,87	26,26
16/06/2022	4'430,27	2'667'963,13	26,31
17/06/2022	4'430,27	2'672'393,40	26,35
20/06/2022	9'243,68	2'681'637,08	26,44
21/06/2022	9'243,68	2'690'880,75	26,53
22/06/2022	34'528,72	2'725'409,47	26,87
23/06/2022	34'528,72	2'759'938,19	27,21
24/06/2022	34'528,72	2'794'466,91	27,55
27/06/2022	34'528,72	2'828'995,63	27,89
28/06/2022	34'528,72	2'863'524,35	28,23
29/06/2022	79'690,00	2'943'214,35	29,02
30/06/2022	53'635,74	2'996'850,09	29,55
01/07/2022	53'635,74	3'050'485,83	30,08

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/07/2022	53'635,74	3'104'121,57	30,61
05/07/2022	21'871,18	3'125'992,75	30,82
06/07/2022	22'742,46	3'148'735,20	31,05
07/07/2022	13'149,80	3'161'885,00	31,18
08/07/2022	12'278,52	3'174'163,52	31,30
11/07/2022	12'278,52	3'186'442,04	31,42
12/07/2022	12'278,52	3'198'720,56	31,54
13/07/2022	12'278,52	3'210'999,08	31,66
14/07/2022	12'278,52	3'223'277,60	31,78
15/07/2022	9'869,88	3'233'147,48	31,88
18/07/2022	1'395,42	3'234'542,90	31,89
19/07/2022	26'054,26	3'260'597,16	32,15
20/07/2022	26'054,26	3'286'651,43	32,41
21/07/2022	26'054,26	3'312'705,69	32,66
22/07/2022	26'054,26	3'338'759,96	32,92
25/07/2022	32'159,02	3'370'918,98	33,24
26/07/2022	32'785,22	3'403'704,20	33,56
27/07/2022	6'730,96	3'410'435,16	33,63
28/07/2022	6'104,76	3'416'539,92	33,69
29/07/2022	6'104,76	3'422'644,68	33,75
01/08/2022	6'104,76	3'428'749,43	33,81
02/08/2022	51'266,04	3'480'015,47	34,31
03/08/2022	51'266,04	3'531'281,51	34,82
04/08/2022	51'266,04	3'582'547,55	35,32
05/08/2022	45'161,28	3'627'708,84	35,77
08/08/2022	13'396,72	3'641'105,56	35,90
09/08/2022	13'396,72	3'654'502,28	36,03
11/08/2022	3'804,06	3'658'306,34	36,07
12/08/2022	3'804,06	3'662'110,41	36,11
16/08/2022	3'804,06	3'665'914,47	36,15
17/08/2022	3'804,06	3'669'718,54	36,18
18/08/2022	4'675,34	3'674'393,88	36,23
19/08/2022	4'675,34	3'679'069,22	36,28
22/08/2022	769,22	3'679'838,44	36,28
23/08/2022	769,22	3'680'607,66	36,29
24/08/2022	26'680,47	3'707'288,13	36,55
25/08/2022	26'680,47	3'733'968,60	36,82
26/08/2022	26'054,26	3'760'022,86	37,07
29/08/2022	32'297,77	3'792'320,63	37,39
30/08/2022	32'297,77	3'824'618,40	37,71
31/08/2022	77'459,05	3'902'077,44	38,47
01/09/2022	51'404,78	3'953'482,23	38,98
02/09/2022	48'965,35	4'002'447,58	39,46
05/09/2022	48'965,35	4'051'412,92	39,95
06/09/2022	17'200,79	4'068'613,71	40,12
07/09/2022	17'200,79	4'085'814,50	40,29
08/09/2022	3'804,06	4'089'618,56	40,32
09/09/2022	3'804,06	4'093'422,62	40,36
12/09/2022	769,22	4'094'191,84	40,37
13/09/2022	1'395,42	4'095'587,27	40,38
14/09/2022	26'680,47	4'122'267,73	40,64
15/09/2022	26'054,26	4'148'322,00	40,90
16/09/2022	26'054,26	4'174'376,26	41,16
19/09/2022	32'297,77	4'206'674,03	41,48
20/09/2022	82'476,97	4'289'151,00	42,29
21/09/2022	82'476,97	4'371'627,97	43,10
22/09/2022	56'422,70	4'428'050,67	43,66
23/09/2022	13'396,72	4'441'447,39	43,79
26/09/2022	13'396,72	4'454'844,12	43,92
27/09/2022	3'804,06	4'458'648,18	43,96
28/09/2022	3'804,06	4'462'452,25	44,00
29/09/2022	4'675,34	4'467'127,59	44,05
30/09/2022	4'675,34	4'471'802,93	44,09

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
03/10/2022	4'675,34	4'476'478,28	44,14
04/10/2022	4'675,34	4'481'153,62	44,18
05/10/2022	769,22	4'481'922,84	44,19
06/10/2022	769,22	4'482'692,06	44,20
07/10/2022	26'054,26	4'508'746,32	44,46
10/10/2022	26'054,26	4'534'800,59	44,71
11/10/2022	26'680,47	4'561'481,06	44,98
12/10/2022	26'680,47	4'588'161,52	45,24
13/10/2022	26'054,26	4'614'215,79	45,50
14/10/2022	32'297,77	4'646'513,55	45,81
17/10/2022	49'420,81	4'695'934,37	46,30
18/10/2022	49'420,81	4'745'355,18	46,79
19/10/2022	49'420,81	4'794'776,00	47,28
20/10/2022	90'489,13	4'885'265,13	48,17
21/10/2022	47'311,82	4'932'576,95	48,63
24/10/2022	47'311,82	4'979'888,77	49,10
25/10/2022	47'311,82	5'027'200,59	49,57
26/10/2022	47'311,82	5'074'512,41	50,03
27/10/2022	51'115,88	5'125'628,30	50,54
28/10/2022	51'115,88	5'176'744,18	51,04
31/10/2022	17'200,79	5'193'944,97	51,21
02/11/2022	17'200,79	5'211'145,75	51,38
03/11/2022	3'804,06	5'214'949,82	51,42
04/11/2022	3'804,06	5'218'753,88	51,46
08/11/2022	769,22	5'219'523,10	51,46
09/11/2022	769,22	5'220'292,32	51,47
10/11/2022	26'798,67	5'247'090,99	51,74
11/11/2022	26'798,67	5'273'889,67	52,00
14/11/2022	27'424,88	5'301'314,54	52,27
15/11/2022	27'424,88	5'328'739,42	52,54
16/11/2022	26'798,67	5'355'538,09	52,80
17/11/2022	26'798,67	5'382'336,76	53,07
18/11/2022	32'792,43	5'415'129,19	53,39
21/11/2022	5'993,76	5'421'122,95	53,45
22/11/2022	51'155,04	5'472'278,00	53,96
23/11/2022	51'155,04	5'523'433,04	54,46
24/11/2022	51'155,04	5'574'588,09	54,96
25/11/2022	83'960,91	5'658'549,00	55,79
28/11/2022	38'799,63	5'697'348,63	56,18
29/11/2022	38'799,63	5'736'148,26	56,56
30/11/2022	38'799,63	5'774'947,89	56,94
01/12/2022	25'402,91	5'800'350,80	57,19
02/12/2022	25'402,91	5'825'753,71	57,44
05/12/2022	25'402,91	5'851'156,61	57,69
06/12/2022	25'402,91	5'876'559,52	57,94
07/12/2022	25'402,91	5'901'962,43	58,19
09/12/2022	25'402,91	5'927'365,34	58,44
12/12/2022	25'402,91	5'952'768,25	58,69
13/12/2022	25'402,91	5'978'171,15	58,94
14/12/2022	26'029,11	6'004'200,27	59,20
15/12/2022	26'029,11	6'030'229,38	59,46
16/12/2022	35'414,22	6'065'643,60	59,81
19/12/2022	80'575,50	6'146'219,10	60,60
20/12/2022	55'172,60	6'201'391,69	61,14
21/12/2022	55'172,60	6'256'564,29	61,69
22/12/2022	55'172,60	6'311'736,88	62,23
23/12/2022	54'495,68	6'366'232,57	62,77
27/12/2022	56'058,18	6'422'290,75	63,32
28/12/2022	28'695,47	6'450'986,22	63,61
29/12/2022	28'695,47	6'479'681,68	63,89
30/12/2022	15'298,75	6'494'980,43	64,04
02/01/2023	3'804,06	6'498'784,50	64,08
03/01/2023	3'804,06	6'502'588,56	64,11

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/01/2023	3'804,06	6'506'392,62	64,15
05/01/2023	3'804,06	6'510'196,69	64,19
09/01/2023	3'804,06	6'514'000,75	64,23
10/01/2023	3'804,06	6'517'804,82	64,26
11/01/2023	3'804,06	6'521'608,88	64,30
12/01/2023	3'804,06	6'525'412,94	64,34
13/01/2023	3'804,06	6'529'217,01	64,38
16/01/2023	3'804,06	6'533'021,07	64,41
17/01/2023	28'487,05	6'561'508,12	64,70
18/01/2023	28'487,05	6'589'995,18	64,98
19/01/2023	24'682,99	6'614'678,16	65,22
20/01/2023	24'682,99	6'639'361,15	65,46
23/01/2023	24'682,99	6'664'044,14	65,71
24/01/2023	24'682,99	6'688'727,13	65,95
25/01/2023	25'309,19	6'714'036,32	66,20
26/01/2023	25'309,19	6'739'345,51	66,45
27/01/2023	24'682,99	6'764'028,49	66,69
30/01/2023	33'480,00	6'797'508,49	67,02
31/01/2023	40'345,04	6'837'853,53	67,42
01/02/2023	40'345,04	6'878'198,57	67,82
02/02/2023	40'345,04	6'918'543,61	68,22
03/02/2023	43'996,94	6'962'540,56	68,65
06/02/2023	43'125,66	7'005'666,22	69,07
07/02/2023	37'131,90	7'042'798,12	69,44
08/02/2023	37'131,90	7'079'930,02	69,81
09/02/2023	37'131,90	7'117'061,92	70,17
10/02/2023	33'480,00	7'150'541,92	70,50
13/02/2023	9'566,23	7'160'108,16	70,60
14/02/2023	9'566,23	7'169'674,39	70,69
15/02/2023	8'797,01	7'178'471,40	70,78
16/02/2023	8'797,01	7'187'268,41	70,87
17/02/2023	8'797,01	7'196'065,43	70,95
20/02/2023	8'797,01	7'204'862,44	71,04
21/02/2023	8'797,01	7'213'659,45	71,13
22/02/2023	626,20	7'214'285,65	71,13
23/02/2023	25'638,30	7'239'923,95	71,38
24/02/2023	25'012,09	7'264'936,04	71,63
27/02/2023	25'012,09	7'289'948,14	71,88
28/02/2023	25'012,09	7'314'960,23	72,12
01/03/2023	25'012,09	7'339'972,33	72,37
02/03/2023	25'012,09	7'364'984,42	72,62
03/03/2023	28'924,85	7'393'909,27	72,90
06/03/2023	28'924,85	7'422'834,11	73,19
07/03/2023	28'924,85	7'451'758,96	73,47
08/03/2023	37'897,80	7'489'656,76	73,85
09/03/2023	12'885,70	7'502'542,46	73,97
10/03/2023	12'885,70	7'515'428,16	74,10
13/03/2023	12'885,70	7'528'313,87	74,23
14/03/2023	8'972,95	7'537'286,82	74,32
15/03/2023	9'690,89	7'546'977,71	74,41
16/03/2023	9'690,89	7'556'668,60	74,51
17/03/2023	9'690,89	7'566'359,50	74,60
20/03/2023	8'972,95	7'575'332,45	74,69
21/03/2023	51'739,05	7'627'071,50	75,20
22/03/2023	42'766,10	7'669'837,60	75,62
23/03/2023	42'766,10	7'712'603,70	76,05
24/03/2023	42'766,10	7'755'369,80	76,47
27/03/2023	96'434,94	7'851'804,74	77,42
28/03/2023	53'668,84	7'905'473,58	77,95
29/03/2023	54'295,04	7'959'768,62	78,48
30/03/2023	54'295,04	8'014'063,67	79,02
31/03/2023	67'065,56	8'081'129,23	79,68
03/04/2023	90'514,40	8'171'643,63	80,57

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
04/04/2023	90'514,40	8'262'158,03	81,46
05/04/2023	43'202,58	8'305'360,61	81,89
06/04/2023	47'115,33	8'352'475,94	82,35
07/04/2023	47'115,33	8'399'591,27	82,82
11/04/2023	55'091,29	8'454'682,56	83,36
12/04/2023	58'252,90	8'512'935,46	83,94
13/04/2023	44'856,18	8'557'791,63	84,38
14/04/2023	21'407,34	8'579'198,97	84,59
17/04/2023	21'407,34	8'600'606,31	84,80
18/04/2023	17'494,59	8'618'100,90	84,97
19/04/2023	18'838,73	8'636'939,63	85,16
20/04/2023	18'838,73	8'655'778,36	85,34
21/04/2023	18'212,53	8'673'990,88	85,52
24/04/2023	7'975,96	8'681'966,84	85,60
26/04/2023	7'975,96	8'689'942,80	85,68
27/04/2023	11'888,71	8'701'831,51	85,80
28/04/2023	11'888,71	8'713'720,22	85,92
02/05/2023	11'888,71	8'725'608,93	86,03
03/05/2023	11'888,71	8'737'497,64	86,15
04/05/2023	3'912,75	8'741'410,39	86,19
05/05/2023	10'895,97	8'752'306,37	86,30
08/05/2023	10'895,97	8'763'202,34	86,40
09/05/2023	6'357,02	8'769'559,36	86,47
10/05/2023	11'476,81	8'781'036,17	86,58
11/05/2023	11'476,81	8'792'512,97	86,69
12/05/2023	11'476,81	8'803'989,78	86,81
15/05/2023	54'347,39	8'858'337,17	87,34
16/05/2023	49'945,54	8'908'282,72	87,83
17/05/2023	49'945,54	8'958'228,26	88,33
18/05/2023	53'858,30	9'012'086,56	88,86
19/05/2023	98'277,26	9'110'363,82	89,83
22/05/2023	91'920,24	9'202'284,06	90,73
23/05/2023	101'715,74	9'303'999,80	91,74
24/05/2023	101'715,74	9'405'715,54	92,74
25/05/2023	101'715,74	9'507'431,28	93,74
26/05/2023	101'715,75	9'609'147,03	94,74
29/05/2023	54'214,47	9'663'361,49	95,28
30/05/2023	68'949,40	9'732'310,89	95,96
31/05/2023	58'527,69	9'790'838,58	96,54
01/06/2023	59'153,89	9'849'992,47	97,12
05/06/2023	58'846,20	9'908'838,67	97,70
06/06/2023	14'427,24	9'923'265,91	97,84
07/06/2023	14'427,24	9'937'693,15	97,98
08/06/2023	14'427,24	9'952'120,39	98,13
09/06/2023	14'427,24	9'966'547,63	98,27
12/06/2023	14'427,24	9'980'974,86	98,41
13/06/2023	14'427,24	9'995'402,10	98,55
14/06/2023	14'427,24	10'009'829,34	98,70
15/06/2023	16'149,30	10'025'978,64	98,85
16/06/2023	25'667,93	10'051'646,57	99,11
19/06/2023	9'518,63	10'061'165,20	99,20
20/06/2023	9'518,63	10'070'683,83	99,30
21/06/2023	9'518,63	10'080'202,46	99,39
22/06/2023	13'920,48	10'094'122,94	99,53
23/06/2023	15'482,98	10'109'605,91	99,68
26/06/2023	15'482,98	10'125'088,89	99,83
27/06/2023	15'482,98	10'140'571,87	99,98
28/06/2023	1'562,50	10'142'134,37	100,00
Palermo, 14/07/2021			
Tecnico			

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
geom. Paolo Franzone			
