



REGIONE SICILIA

COMUNE DI ROSOLINI

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DI SIRACUSA

OGGETTO:

MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA
CENTRO URBANO RACCOLTA DI ACQUE
BIANCHE SUPERFICIALI DI VIA GIULIA E
COLLEGAMENTO SU VIA MANZONI
---- PROGETTO ESECUTIVO ----

PROGETTISTA:

Ing. Faranna Claudio G.



TAV. 10

CRONOPROGRAMMA

DATA: 04/05/2022


RUP :

Geom. Piero Fioretti



N°	Data	Descrizione della Revisione o Sostituisce

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1	A	Consegna dei lavori	01/10/2022	02/10/2022	1
2	B	Approntamento aree di cantiere	02/10/2022	07/10/2022	5
3	C.1	Taglio e demolizione pavimentazione esistente	07/10/2022	17/10/2022	10
4	C.2	Scavo a sezione obbligata per condotta	17/10/2022	26/11/2022	40
5	C.3	Realizzazione condotta	26/11/2022	26/12/2022	30
6	C.4	Realizzazione pozzetti ecaditoie	26/12/2022	15/01/2023	20
7	C.5	Rifacimento pavimentazione	15/01/2023	25/01/2023	10
8	D	Opere di ripristino luoghi e smobilizzo cantiere	25/01/2023	28/01/2023	3
9	E	Fine lavori	28/01/2023	29/01/2023	1

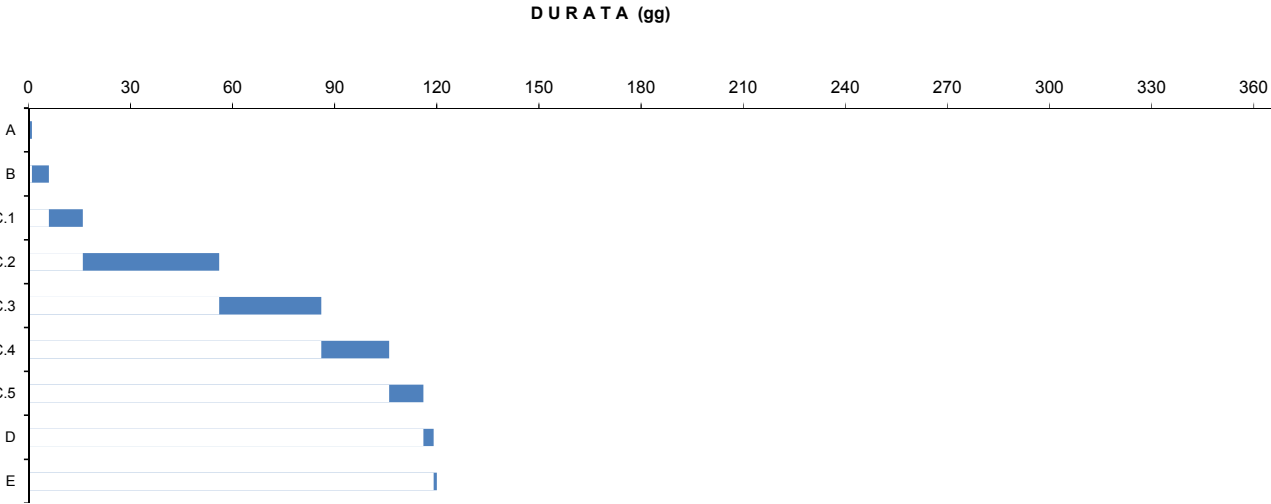

Inizio dei lavori

Fine lavori

TC

120

gg.

naturali consecutivi
