

Comune di
LIBRIZZI
(provincia di Messina)

**RIQUALIFICAZIONE URBANA
PIAZZA CATENA ED AREE LIMITROFE**

- PROGETTO ESECUTIVO -

TAVOLA

A.16

CRONOPROGRAMMA

Patti, lì **18.03.2022**

Il Tecnico
(Arch. Giorgio Molica)

COMUNE DI LIBRIZZI
Città Metropolitana di Messina
Ufficio Tecnico

VISTO: si esprime parere favorevole ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 e ss.mm. e ii. e articolo 5 comma 3 della legge Regione 12.07.2011 n. 12 e ss.mm. e ii.

Livello di progettazione Esecutivo

Parere n° 12/2022

Librizzi - 7 NOV. 2022

Il Responsabile del Procedimento
Geom. T. Tulliano



- Studio Tecnico arch. Giorgio Molica -

Via Case Nuove Russo n. 166 - 98066 Patti - Tel. 3388641893
e-mail: GBM2003@libero.it.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Elenco delle fasi di lavorazione

Lavori di Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali ...

Da: 08/04/2022 a: 09/04/2022; Numero di giorni: 2
Da: 04/10/2022 a: 05/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche ...

Da: 09/04/2022 a: 10/04/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali ...

Da: 10/04/2022 a: 07/05/2022; Numero di giorni: 28
Durata della fase di lavorazione: 28 giorni.

Lavori di Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle ...

Da: 07/05/2022 a: 08/05/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza ...

Da: 08/05/2022 a: 18/05/2022; Numero di giorni: 11
Durata della fase di lavorazione: 11 giorni.

Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per esterni con elementi ...

Da: 18/05/2022 a: 19/05/2022; Numero di giorni: 2
Da: 02/12/2022 a: 09/12/2022; Numero di giorni: 8
Da: 09/02/2023 a: 13/02/2023; Numero di giorni: 5
Da: 11/04/2023 a: 12/04/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 17 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano ...

Da: 19/05/2022 a: 29/05/2022; Numero di giorni: 11
Durata della fase di lavorazione: 11 giorni.

Lavori di Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto ...

Da: 29/05/2022 a: 07/06/2022; Numero di giorni: 10
Da: 30/12/2022 a: 01/01/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 13 giorni.

Lavori di Formazione del letto di posa, rinfiando e ricoprimento delle ...

Da: 07/06/2022 a: 08/06/2022; Numero di giorni: 2
Da: 29/12/2022 a: 30/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi ...

Da: 08/06/2022 a: 13/06/2022; Numero di giorni: 6
Da: 17/11/2022 a: 29/11/2022; Numero di giorni: 13
Da: 17/12/2022 a: 19/12/2022; Numero di giorni: 3

Da: 20/12/2022 a: 22/12/2022; Numero di giorni: 3
Da: 27/12/2022 a: 28/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 27 giorni.

Lavori di Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema ...

Da: 13/06/2022 a: 15/06/2022; Numero di giorni: 3
Da: 09/12/2022 a: 17/12/2022; Numero di giorni: 9
Durata della fase di lavorazione: 12 giorni.

Lavori di Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno

...

Da: 15/06/2022 a: 25/06/2022; Numero di giorni: 11
Da: 03/07/2022 a: 15/07/2022; Numero di giorni: 13
Durata della fase di lavorazione: 24 giorni.

Lavori di Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura ...

Da: 25/06/2022 a: 03/07/2022; Numero di giorni: 9
Durata della fase di lavorazione: 9 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra del Tipo Calcarenite dei Nebrodi, ...

Da: 15/07/2022 a: 18/08/2022; Numero di giorni: 35
Da: 18/08/2022 a: 29/08/2022; Numero di giorni: 12
Da: 29/08/2022 a: 30/08/2022; Numero di giorni: 2
Da: 30/08/2022 a: 31/08/2022; Numero di giorni: 2
Da: 31/08/2022 a: 01/09/2022; Numero di giorni: 2
Da: 01/09/2022 a: 02/09/2022; Numero di giorni: 2
Da: 03/09/2022 a: 04/09/2022; Numero di giorni: 2
Da: 04/09/2022 a: 09/09/2022; Numero di giorni: 6
Durata della fase di lavorazione: 63 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di una rosa dei venti di forma circolare in marmo ...

Da: 02/09/2022 a: 03/09/2022; Numero di giorni: 2
Da: 12/09/2022 a: 13/09/2022; Numero di giorni: 2
Da: 13/04/2023 a: 14/04/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 6 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di alzata in ceramica maiolicata artigianale ...

Da: 09/09/2022 a: 12/09/2022; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Dismissione, fornitura e posa in opera di lastra in polycarbonato compatto con rivestimento ...

Da: 13/09/2022 a: 14/09/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di Dissuasore Paletto In Ghisa Modello ...

Da: 14/09/2022 a: 15/09/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di catena metallica per paletto dissuasore ...

Da: 15/09/2022 a: 16/09/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di membrana termoceramica, con effetti endotermici ...

Da: 16/09/2022 a: 22/09/2022; Numero di giorni: 7
Durata della fase di lavorazione: 7 giorni.

Lavori di Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, ...

Da: 22/09/2022 a: 24/09/2022; Numero di giorni: 3
Da: 24/09/2022 a: 01/10/2022; Numero di giorni: 8
Da: 31/01/2023 a: 03/02/2023; Numero di giorni: 4
Da: 03/02/2023 a: 06/02/2023; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 19 giorni.

Lavori di Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato

...

Da: 01/10/2022 a: 04/10/2022; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, ...

Da: 05/10/2022 a: 06/10/2022; Numero di giorni: 2
Da: 15/11/2022 a: 16/11/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato ...

Da: 06/10/2022 a: 07/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Posa in opera, in sommità a steli di pali di mensola per sostegno apparecchio ...

Da: 07/10/2022 a: 08/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale ...

Da: 08/10/2022 a: 09/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di lampada S.A.P. (SON) con potenza 250W - Flusso luminoso ...

Da: 09/10/2022 a: 10/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di cavo FG16(o)R16 sez. 3x6mm² ...

Da: 10/10/2022 a: 11/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio ...

Da: 11/10/2022 a: 12/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di armadio vuoto in vetroresina idoneo ...

Da: 12/10/2022 a: 13/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Accessori per armadi stradali di cui alla voce 18.7.3, comprensivo della

...

Da: 13/10/2022 a: 14/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno ...

Da: 14/10/2022 a: 15/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio ...

Da: 15/10/2022 a: 16/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di per tubazioni DN 250 mm altezza totale H <= 2000 mm ...

Da: 16/10/2022 a: 17/10/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PEt o PE con funzione ...

Da: 17/10/2022 a: 25/10/2022; Numero di giorni: 9
Durata della fase di lavorazione: 9 giorni.

Lavori di Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ...

Da: 25/10/2022 a: 29/10/2022; Numero di giorni: 5
Durata della fase di lavorazione: 5 giorni.

Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato ...

Da: 29/10/2022 a: 01/11/2022; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni ...

Da: 01/11/2022 a: 10/11/2022; Numero di giorni: 10
Durata della fase di lavorazione: 10 giorni.

Lavori di Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, ...

Da: 10/11/2022 a: 13/11/2022; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma ...

Da: 13/11/2022 a: 15/11/2022; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 3 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa ...

Da: 16/11/2022 a: 17/11/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi ...

Da: 29/11/2022 a: 30/11/2022; Numero di giorni: 2
Da: 29/01/2023 a: 31/01/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 5 giorni.

Lavori di Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo ...

Da: 30/11/2022 a: 01/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di panchina grigio nero o terra d'umbria levigata sui 4 lati e sulla ...

Da: 01/12/2022 a: 02/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Smontaggio di impianto fotovoltaico della potenza di 19.2 kw costituito ...

...
Da: 19/12/2022 a: 20/12/2022; Numero di giorni: 2
Da: 24/01/2023 a: 25/01/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa ...

Da: 22/12/2022 a: 26/12/2022; Numero di giorni: 5
Durata della fase di lavorazione: 5 giorni.

Lavori di Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, ...

Da: 26/12/2022 a: 27/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi ...

Da: 28/12/2022 a: 29/12/2022; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, ...

Da: 01/01/2023 a: 02/01/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Rimontaggio di piccola e media orditura di tetto, compresi ...

Da: 02/01/2023 a: 05/01/2023; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste ...

Da: 05/01/2023 a: 09/01/2023; Numero di giorni: 5
Durata della fase di lavorazione: 5 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile prefabbricata per coperture ...

Da: 09/01/2023 a: 11/01/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 3 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di isolamento termo – acustico orizzontale ...

Da: 11/01/2023 a: 16/01/2023; Numero di giorni: 6

Da: 06/02/2023 a: 07/02/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 8 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume ...

Da: 16/01/2023 a: 20/01/2023; Numero di giorni: 5
Durata della fase di lavorazione: 5 giorni.

Lavori di Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, ...

Da: 20/01/2023 a: 21/01/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate ...

Da: 21/01/2023 a: 24/01/2023; Numero di giorni: 4
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore

...

Da: 25/01/2023 a: 27/01/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 3 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore ...

Da: 27/01/2023 a: 28/01/2023; Numero di giorni: 2
Da: 28/01/2023 a: 29/01/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.

Lavori di Realizzazione di impermeabilizzazione continua mediante applicazione a freddo ...

Da: 07/02/2023 a: 09/02/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 3 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1^a scelta ...

Da: 13/02/2023 a: 15/02/2023; Numero di giorni: 3
Durata della fase di lavorazione: 3 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta ...

Da: 15/02/2023 a: 21/02/2023; Numero di giorni: 7
Da: 21/02/2023 a: 03/03/2023; Numero di giorni: 11
Durata della fase di lavorazione: 18 giorni.

Lavori di Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce ...

Da: 03/03/2023 a: 01/04/2023; Numero di giorni: 30
Durata della fase di lavorazione: 30 giorni.

Lavori di Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri ...

Da: 01/04/2023 a: 02/04/2023; Numero di giorni: 2
Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura, trasporto e messa in opera di sistema a cappotto ...

Da: 02/04/2023 a: 11/04/2023; Numero di giorni: 10

Durata della fase di lavorazione: 10 giorni.

Lavori di Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati di potassio, di elevata ...

Da: 12/04/2023 a: 13/04/2023; Numero di giorni: 2

Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati ...

Da: 14/04/2023 a: 15/04/2023; Numero di giorni: 2

Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Sistema integrato per installazione in impianti alimentati da caldaia ...

Da: 15/04/2023 a: 16/04/2023; Numero di giorni: 2

Durata della fase di lavorazione: 2 giorni.

Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di ventilconvettore (fan-coil) a pavimento ...

Da: 16/04/2023 a: 17/04/2023; Numero di giorni: 2

Da: 17/04/2023 a: 18/04/2023; Numero di giorni: 2

Durata della fase di lavorazione: 4 giorni.


Lavori di Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione di rame crudo green ...

Da: 18/04/2023 a: 20/04/2023; Numero di giorni: 3

Durata della fase di lavorazione: 3 giorn

TOTALE: 360 gg.

Lavori di Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle s...
 Lavori di Scavo a sezione obbligata eseguito a mano...
 Lavori di Perforazione di pavimenti e rivestimenti in...
 Lavori di Stabilizzazione in sito di terreno naturale...
 Lavori di Fornitura e collocazione di rete d'acciaio...
 Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di pav...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di spazzatura di ma...
 Lavori di Trasporto di materiale, provenienti da scavi...
 Lavori di Formazione del letto di posa, rifianco e r...
 Lavori di Appropriamento di porteggio in elementi port...
 Lavori di Manovratura parascassi a tubi e quindi o prela...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di pavimentazione...
 Lavori di Fornitura e collocazione di una rosa del ve...
 Lavori di Fornitura e collocazione di alzata in ceram...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di Dissuasore pal...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di membrana term...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di battiscopa per...
 Lavori di Conglomerato cementizio per strutture non a...
 Lavori di Caratterizzato per rivestimento di manufatti rel...
 Lavori di Conglomerato cementizio per formazione di b...
 Lavori di Fornitura e posa in opera in blocco di fono...
 Lavori di Posa in opera in sovrapposizione a steli di pali d...
 Lavori di Fornitura e posa in opera su palo o mensola...
 Lavori di Pila S.A. (SON) con potenza 250W - Fl...
 Lavori di Pila S.A. (SON) con potenza 250W - Fl...
 Lavori di Fornitura e posa in opera entro scavo di ca...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di armadio vuoto...
 Lavori di Accessori per armadi strapi di cui alla V...
 Lavori di Fornitura e collocazione di cassette di der...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di caduta strad...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di geotessile te...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di cancellate, ringhiere e sim...
 Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di tub...
 Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di tub...
 Lavori di Demolizione parziale o totale, per lavori s...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di tubazioni in p...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di telaio e griglia...
 Lavori di Casserome per getti di conglomerati sempli...
 Lavori di Inonaco civile per esterni dello spessore...
 Lavori di Rinchiodo grigio nero o terra d'ombra levig...
 Lavori di Montaggio di impianto fotovoltaico della p...
 Lavori di Scomposizione di piccola orditura e/o tavol...
 Lavori di Scomposizione di lastre di marmo per pavimen...
 Lavori di Rimozione di missi interni od esterni di...
 Lavori di Havi in legno lamellare, di qualsiasi lung...
 Lavori di Limonaggio di piccola e media orditura di...
 Lavori di Lavoie di abete di spessore 20-25 mm, torni...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di membrana imper...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di isolamento ter...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di impermeabilizz...
 Lavori di Arcarecci, listelli e correnti di abete di...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di manico di coper...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di controsoffitto...
 Lavori di Realizzazione di impermeabilizzazione conti...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di battiscopa per...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di inonaco trasp...
 Lavori di Integrità per interni con pittura trasp...
 Lavori di Fornitura e collocazione di porta interna C...
 Lavori di Fornitura, trasporto e messa in opera di si...
 Lavori di Integrità per esterni con pittura a bas...
 Lavori di Fornitura e posa in opera di serramenti est...
 Lavori di Sistema integrato per installazione in impi...
 Lavori di Fornitura, trasporto e posa in opera di ven...
 Lavori di Fornitura trasporto e posa in opera di tuba...

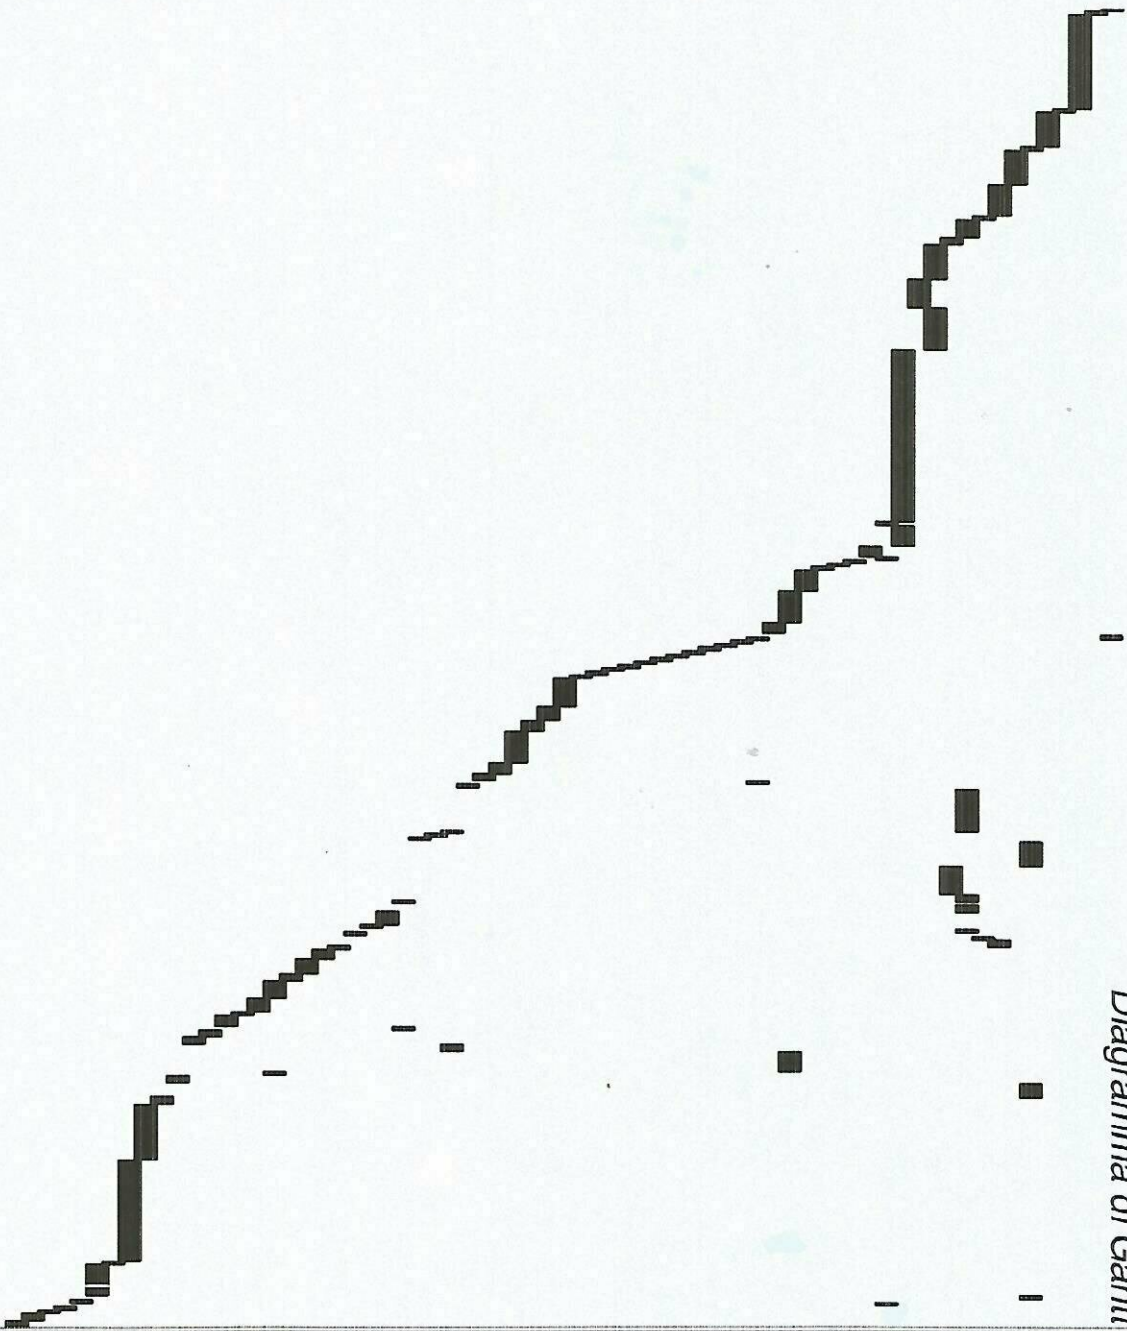

08/04/2022

08/04/2023
