BENINATO SALVATORE
INGEGNERE

REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI

PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del teatro Tito Marrone nel Comune di Erice.

1.05.GEN Cronoprogramma -

Rev.	DESCRIZIONE	DATA	PROGETTISTA	RUP
0	Prima emissione	APRILE 2021	Ing. S. Beninato	Ing. S. Caruso
A				
B				
C				

Via S. Anna 36 - 94014 Nicosia EN
TEL +39 392 1846178
P. Iva 01262770868
salvo89bn@live.it
salvatore.beninato@ordine.ingegnerienna.it

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**TOTALE LAVORAZIONI**	**210 g**	**01/07/2021**	**26/01/2022**
2	**OPERE EDILI**	**90 g**	**01/07/2021**	**28/09/2021**
3	**INVOLUCRO ESTERNO**	**35 g**	**01/07/2021**	**04/08/2021**
4	Demolizione della parti in CLS ammalorate, rimozione pluviali, rivestimenti, serramenti, intonaci, rivestimento della copertura, ecc.	15 g	01/07/2021	15/07/2021
5	Ripristino, risanamento e sostituzione degli elementi esterni	20 g	16/07/2021	04/08/2021
6	**INTERNO EDIFICIO**	**45 g**	**05/08/2021**	**18/09/2021**
7	Opere di ripristino edilizio - Corpo Palcoscenico - Camerini	15 g	05/08/2021	19/08/2021
8	Opere di ripristino edilizio - Corpo Palcoscenico - Locale seminterrato	10 g	20/08/2021	29/08/2021
9	Opere di ripristino edilizio - Corpo sala centrale	20 g	30/08/2021	18/09/2021
10	**SISTEMAZIONE ESTERNA**	**10 g**	**19/09/2021**	**28/09/2021**
11	Ripristino pavimentazione esterna	5 g	19/09/2021	23/09/2021
12	Sistemazione aree a verde	5 g	24/09/2021	28/09/2021
13	**IMPIANTI TECNOLOGICI**	**120 g**	**29/09/2021**	**26/01/2022**
14	**CONDIZIONAMENTO**	**20 g**	**29/09/2021**	**18/10/2021**
15	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SALA TEATRO	5 g	29/09/2021	03/10/2021
16	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERINI	5 g	04/10/2021	08/10/2021
17	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UTA	5 g	09/10/2021	13/10/2021
18	CONTROLLER IMPIANTO DI CDZ	5 g	14/10/2021	18/10/2021
19	**ELETTRICO**	**40 g**	**19/10/2021**	**27/11/2021**
20	QUADRI ELETTRICI	5 g	19/10/2021	23/10/2021
21	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA	10 g	24/10/2021	02/11/2021
22	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE INTERNO	10 g	03/11/2021	12/11/2021
23	IMPIANTO DI FORZA MOTRICE	5 g	13/11/2021	17/11/2021
24	DORSALI - CANALI - TUBAZIONI E CAVI ELETTRICI	10 g	18/11/2021	27/11/2021
25	**ANTINCENDIO**	**10 g**	**28/11/2021**	**07/12/2021**
26	SISTEMI DI ESTINZIONE INCENDIO	5 g	28/11/2021	02/12/2021
27	SISTEMI DI RIVELAZIONE FUMI	5 g	03/12/2021	07/12/2021
28	**ALLARME ANTINTRUSIONE**	**10 g**	**08/12/2021**	**17/12/2021**
29	IMPIANTO ANTINTRUSIONE	10 g	08/12/2021	17/12/2021
30	**CONVEGNISTICA**	20 g	18/12/2021	06/01/2022
31	**ALLESTIMENTI**	20 g	07/01/2022	26/01/2022

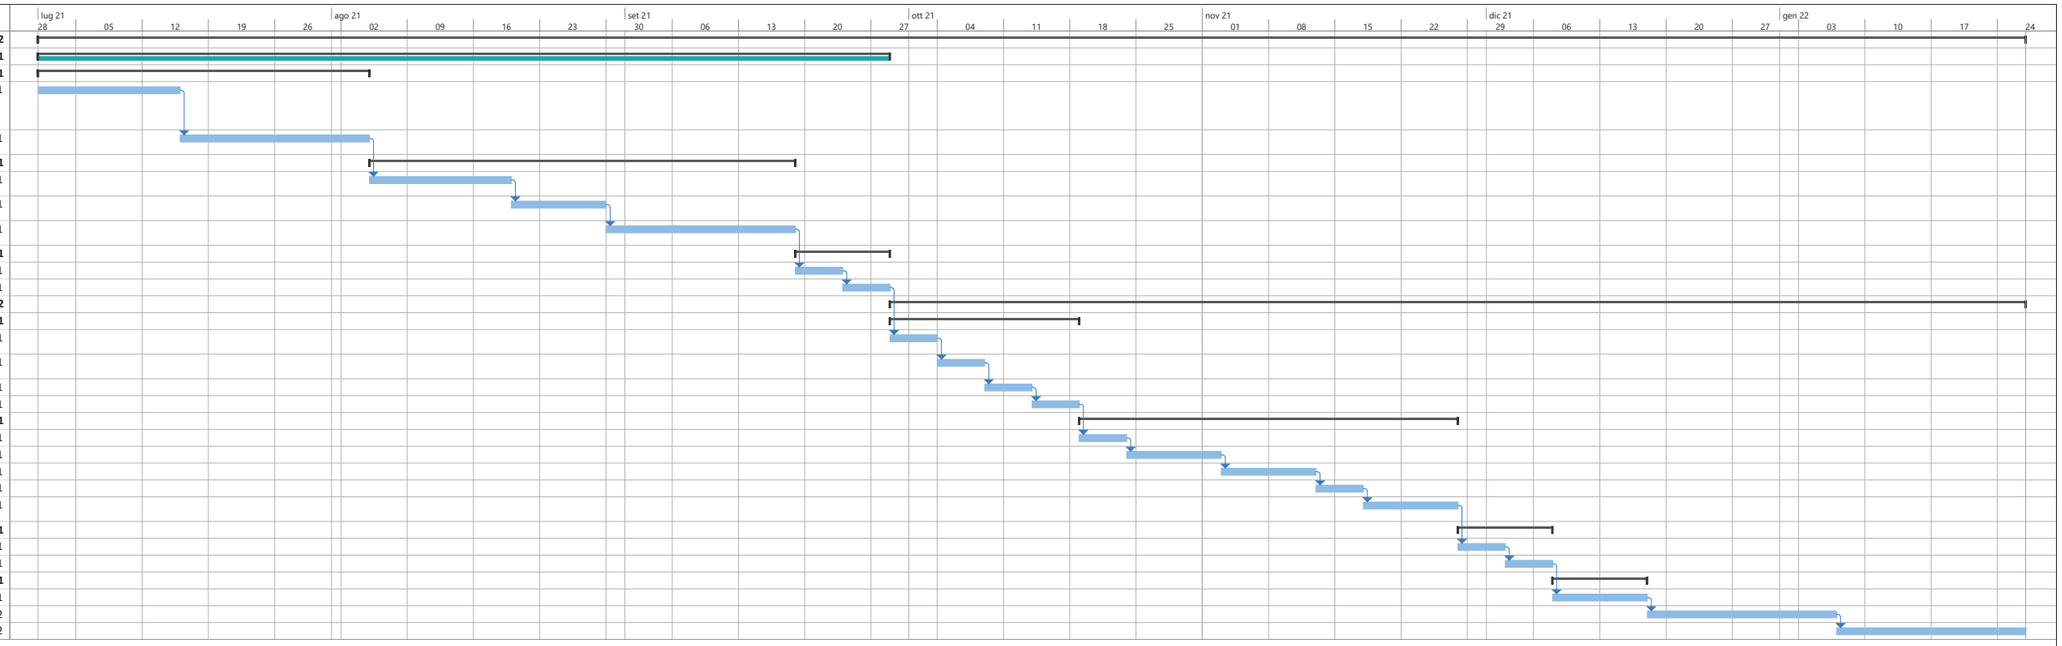

Progetto: Proget1
Data: 06/04/2021

Attività · Cardine · Riepilogo progetto · Cardine inattiva · Attività manuale · Riporto riepilogo manuale · Solo inizio · Attività esterne · Scadenza · Avanzamento manuale
Divisione · Riepilogo · Attività inattiva · Riepilogo inattiva · Solo-durata · Riepilogo manuale · Solo-fine · Cardine esterno · Avanzamento
