



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU


**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO**


IV DIREZIONE  
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE



**REALIZZAZIONE DI TENSOSTRUTTURA PER IMPIANTO SPORTIVO DI  
ESERCIZIO POLIVALENTE IN VIA DEGLI ULIVI A TREMESTIERI ETNEO**

**CUP H69B10000290005**

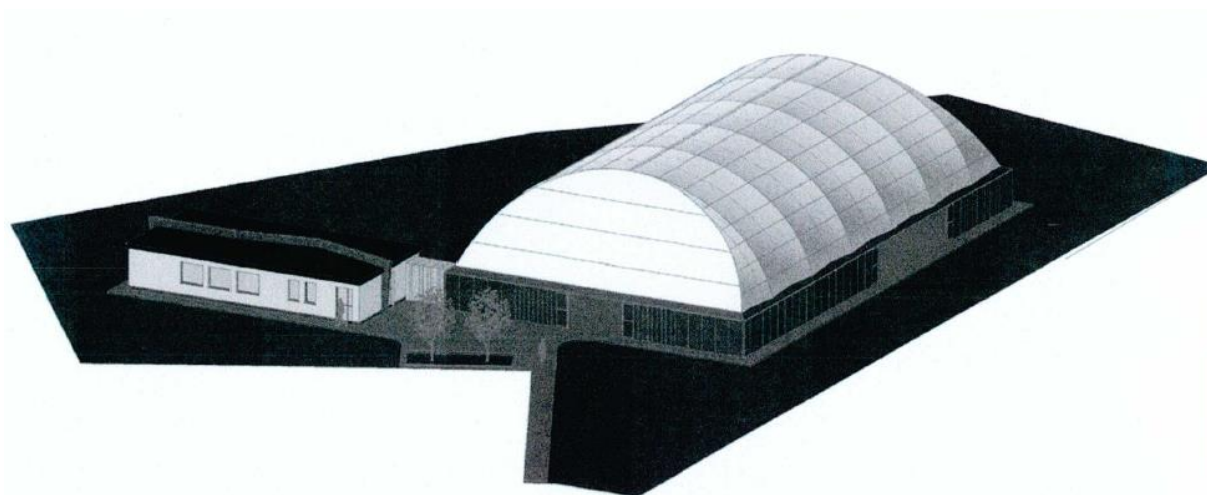

ELABORATO	<b>PROGETTO DEFINITIVO</b> <i>(art. 23 e segg. D.Lgs. 50/2016)</i>		
ALL.G_ AGG.	<b>Cronoprogramma</b>		
	<b>REV_01_2022 Agg. ai sensi art 26 d.lgs. 50/22</b>		
Il Progettista UTC	Data Novembre _2022	VALIDATO-VERIFICATO	APPROVATO
			

**ARTICOLAZIONE DELLE PRESTAZIONI, PROCEDURE E TEMPI**

Il progetto è stato inserito negli interventi finanziati dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale") ottenendo un contributo pari a 500.000,00 euro, come da graduatoria allegata al decreto 30/12/2021, al quale si aggiunge un ulteriore contributo preassegnato di 50.000,00 euro, pari al 10% del finanziamento iniziale, ai sensi del DPCM 28 luglio 2022, successivamente rimodulato ai sensi della circolare 37 del 09/11/2022 per un importo complessivo di € 606.294,02. Ciò a condizione che venga rispettata una tempistica molto stringente definita dall'atto di obbligo sottoscritto con il Ministero e della possibilità di vedere riconosciuto il contributo di preassegnazione come da istanza di rimodulazione:

- avvio delle procedure di gara entro il 31 dicembre 2022;
- la stipula del contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
- il pagamento almeno del 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- l'ultimazione dei lavori entro il 31 marzo 2026.

Il percorso metodologico individuato per raggiungere gli obiettivi prefissati è quello di bandire una gara a procedura aperta per l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo dei servizi di progettazione del Progetto Esecutivo e dell'esecuzione dei lavori.

Il termine ultimo per il completamento delle fasi progettuali, e quindi la consegna del progetto esecutivo (completo di tutti gli elaborati per il successivo affidamento dei lavori), è prevista non oltre il 30 giugno 2023.

L'inserimento dell'intervento tra quelli finanziati con contributi PNRR e le recenti modifiche al Codice dei Contratti impongono l'obbligo di rispettare, oltre a tempistiche di realizzazione ben precise, condizioni e prescrizioni, sia in fase di selezione degli operatori, sia progettuale che di realizzazione tra cui:

- i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani;
- l'obbligo di inserimento dell'emblema "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU" all'interno della documentazione progettuale;
- le condizioni dettate dal DNSH (Do no significant harm") ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente, incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- - la normativa riconducibile ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) in particolare dai " Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" di cui al DM 23 giugno 2022 n.256;
- la previsione del premio di accelerazione che, nel caso specifico, si stabilisce nello 0,6/000 (art 48 DL 77/2021);
- la disciplina volta ad assicurare le pari opportunità e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici (art 47 DL 77/2021);
- la disciplina del subappalto.

In funzione del cronoprogramma dettato dal finanziamento PNRR e per consentire lo svolgimento di tutte le attività tecnico amministrative ad esso correlate sono indicati di seguito le prestazioni che l'aggiudicatario dovrà svolgere e i relativi tempi massimi di esecuzione:

- aggiudicazione appalto integrato e avvio della progettazione esecutiva, entro il 30 marzo 2023;
- consegna progetto esecutivo completo in ogni sua parte entro il 30 aprile 2023;
- validazione del progetto esecutivo ed approvazione entro il 30 maggio 2023.

Le date sopra riportate potranno subire variazioni in relazione a eventuali slittamento dei tempi di esecuzione della gara. Le tempistiche che l'aggiudicatario dovrà comunque rispettare sono:

- per la redazione del progetto esecutivo 30 giorni dall'aggiudicazione;
- Esecuzione dei lavori 365 giorni.
